

RELATÓRIO DE
DESEQUILÍBRIO
FINANCEIRO DA
WO ENGENHARIA
CAUSADO PELA
VALE



APRESENTAÇÃO DA WO ENGENHARIA

- Empresa de engenharia fundada em junho de 1989.
- Atuava nas áreas de terraplenagem, obras civil e montagens mecânicas e pintura industrial.
- Sediada em São Luis-MA, prestava serviços em vários estados brasileiros - MA, CE, PI, BA, PA, MG e RN, para vários clientes de grande porte como ALUMAR, ALCOA, PETROBRÁS, VALE, FURNAS, CEMIG, ALUNORTE, ALBRÁS, MPX, BUNGE, RHODIA e GRANEL QUÍMICA.
- Era uma empresa que gerava mais de 3000 empregados diretos e 7000 empregos indiretos.

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA WO ENGENHARIA ANTES DOS CONTRATOS DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL DA EFC



✓ A WO ENGENHARIA até setembro/2010 não teve quaisquer registros de protestos ao longo dos seus 22 anos e primava pelo excelente relacionamento com os fornecedores das regiões aonde prestava serviços.



CARTÓRIO DE PROTESTO DE LETRAS
www.cartoriodeprotestosiz.com.br
SÃO LUIS - MARANHÃO - BRASIL
000 012 061 559 FONE: (98) 3221.3396
000 012 061 560
NORIS SERRA MARANHÃO

TABELA PRIVATIVA DO REGISTRO PÚBLICO DE PROTESTO DE LETRAS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

USANDO DA FACILIDADE QUE A LEI ME CONFERE **CERTIFICO** A REQUERIMENTO DE PESSOA INTERESSADA QUE RE-
VENDO OS LIVROS DO CARTÓRIO A MEU CARGO DELES NÃO CONSTA REGISTRO DE PROTESTO CONTRA
W. O. ENGENHARIA LTDA
PORTADOR DE CNPJ N. 23691363000116
ADIDAS DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2005
ATE A PRESENTE DATA, O REFERIDO É VERDADE E AOS CITADOS LIVROS ME REPORTO E DOU FE. PASSADA A PRESENTE CERTIDÃO
NESTA CIDADE DE SÃO LUIS CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO EM MEU CARTÓRIO AOS
QUINZE (DOIS MIL E DEZ) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2010

CERTIDÃO DO(S) ÚLTIMO(S) 05 ANO(S) SÃO LUIS 15 DE SETEMBRO DE 2010


R\$ 25,75
2010-00034/HDA29L10L49G



SITUAÇÃO FINANCEIRA DA WO ENGENHARIA ANTES DOS CONTRATOS DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL DA EFC




Quadro Evolutivo do Faturamento da WO ENGENHARIA (período de 2004 a 2010) Inclusão da Previsão do Contrato da EFC (MILHÕES DE REAIS)

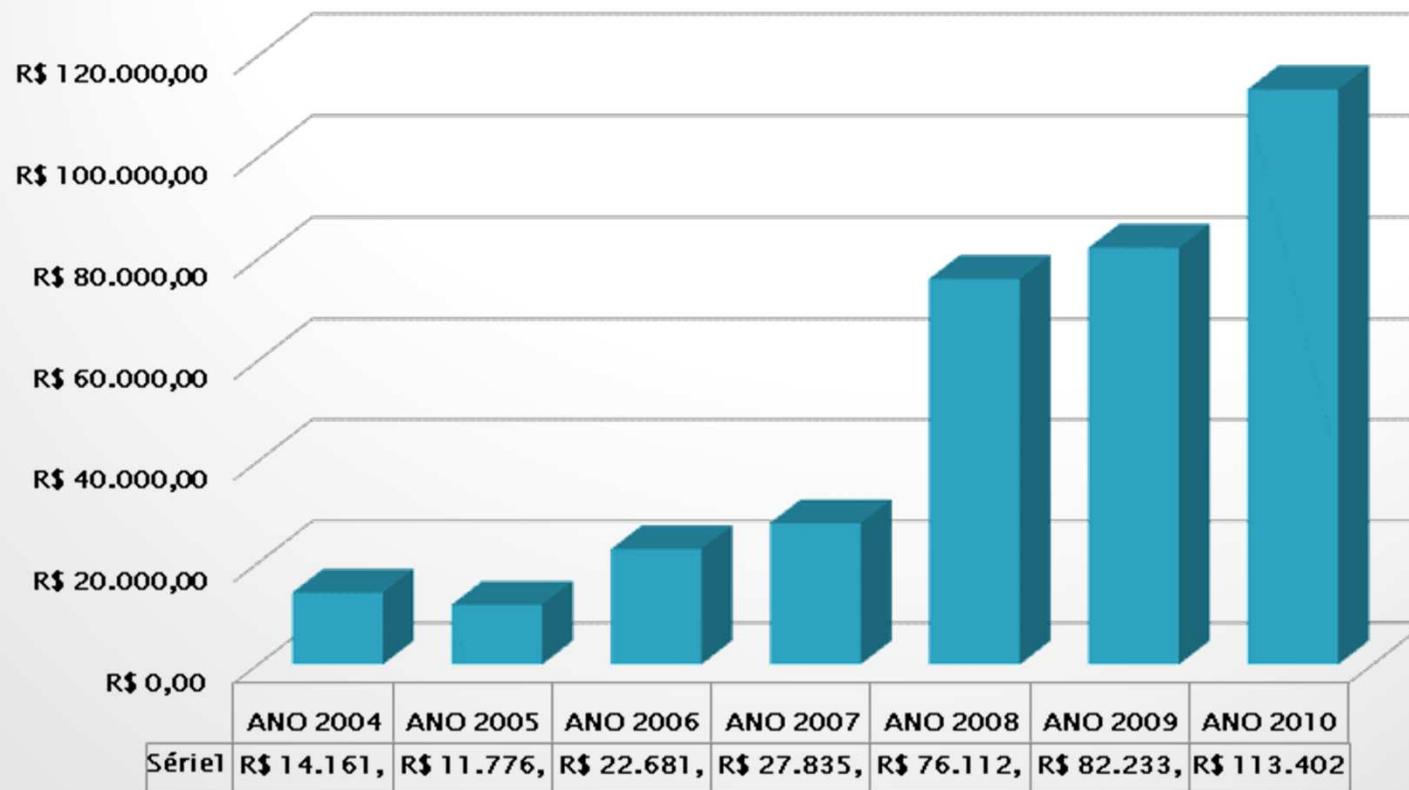

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Quadro Evolutivo do Faturamento da WO ENGENHARIA (período de 2004 a 2011) (MILHÕES DE REAIS)

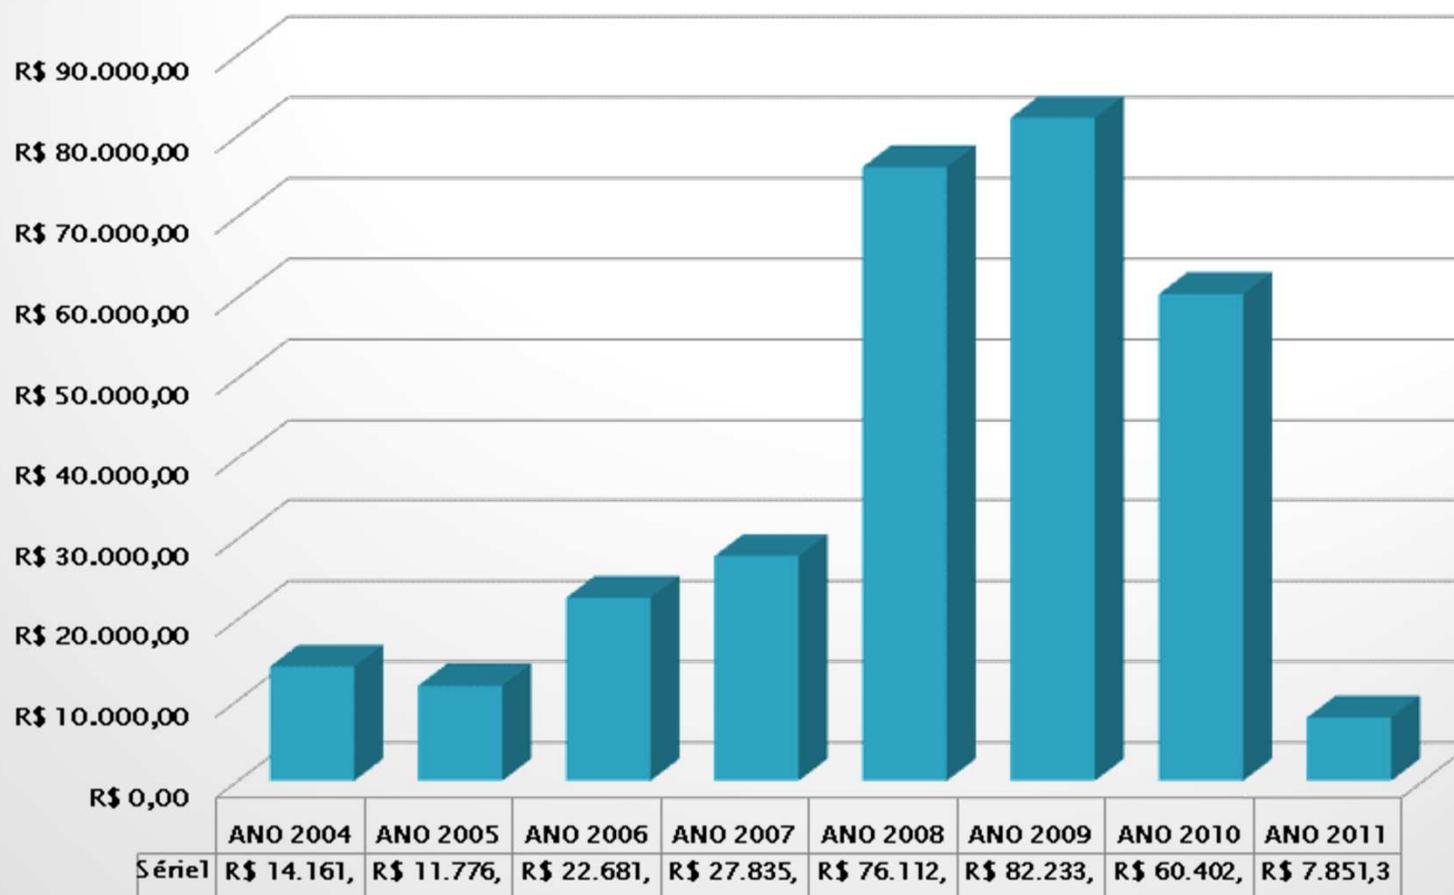

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Qualificação da WO ENGENHARIA dentro da VALE

Através do Índice de Desempenho do Fornecedor (IDF), a VALE avaliou a WO ENGENHARIA, até setembro/2010, como uma empresa com padrão de resultados excelentes, em patamares acima 90%.

ÍNDICE DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR (IDF)

Prezado(a) Fornecedor(a),

A VALE tem investido, cada vez mais, no aprimoramento de sua Gestão de Fornecedores. O programa IDF de Serviços possui um escopo nacional, contém 4 ciclos de avaliação ao longo do ano em que o gestor de contratos avalia o serviço utilizando questionários adequados a cada tipo de contrato.

Maiores detalhes sobre a avaliação devem ser obtidos pela cartilha do fornecedor disponível no portal Quadrem <https://snm.quadrem.net/SNM/Login.aspx>

A cada ciclo, os índices serão apurados e os fornecedores classificados de acordo com a tabela abaixo:

Definição	Pontos
A Apresentou padrão de excelência nos requisitos avaliados.	100 - 90
B Manteve um padrão de boa qualidade nos requisitos avaliados.	89 - 75
C Manteve um padrão aceitável nos requisitos avaliados.	74 - 51
D Apresentou condições insuficientes ou muito aquém das exigidas pela VALE	<= 50

Ressaltamos que as avaliações refletidas pelo IDF não caracterizam qualquer certificação pela VALE, representando o resultado e a percepção do trabalho do fornecedor por suprimentos naquele momento.

Resultado

Segue o resultado da sua empresa no mês de setembro de 2010:

Nota Geral do Contrato: 90,86

Nota Dimensão:

Meio Ambiente : 15,00
Saúde e Segurança : 25,00
Técnico : 44,86
Obrigações Contratuais : 6,00

O resultado consolidado é apurado através de uma média ponderada pelo valor do contrato.

Ressaltamos que é importante que estes resultados sejam discutidos diretamente com o seu gestor de contrato.

Ao final do ano, os fornecedores com os melhores desempenhos serão premiados em Fórum Regional e Nacional.

Atenciosamente,
Diretoria de Suprimentos

ÍNDICE DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR (IDF)

Prezado(a) Fornecedor(a),

A VALE tem investido, cada vez mais, no aprimoramento de sua Gestão de Fornecedores. O programa IDF de Serviços possui um escopo nacional, contém 4 ciclos de avaliação ao longo do ano em que o gestor de contratos avalia o serviço utilizando questionários adequados a cada tipo de contrato.

Maiores detalhes sobre a avaliação devem ser obtidos pela cartilha do fornecedor disponível no portal Quadrem <https://snm.quadrem.net/SNM/Login.aspx>

A cada ciclo, os índices serão apurados e os fornecedores classificados de acordo com a tabela abaixo:

Definição	Pontos
A Apresentou padrão de excelência nos requisitos avaliados.	100 - 90
B Manteve um padrão de boa qualidade nos requisitos avaliados.	89 - 75
C Manteve um padrão aceitável nos requisitos avaliados.	74 - 51
D Apresentou condições insuficientes ou muito aquém das exigidas pela VALE	<= 50

Ressaltamos que as avaliações refletidas pelo IDF não caracterizam qualquer certificação pela VALE, representando o resultado e a percepção do trabalho do fornecedor por suprimentos naquele momento.

Resultado

Segue o resultado da sua empresa no mês de setembro de 2010:

Nota Geral do Contrato: 94,85

Nota Dimensão:

Saúde e Segurança : 13,87
Meio Ambiente : 15,00
Técnico : 55,00
Obrigações Contratuais : 10,98

O resultado consolidado é apurado através de uma média ponderada pelo valor do contrato.

Ressaltamos que é importante que estes resultados sejam discutidos diretamente com o seu gestor de contrato.

Ao final do ano, os fornecedores com os melhores desempenhos serão premiados em Fórum Regional e Nacional.

Atenciosamente,
Diretoria de Suprimentos

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Resumo do Desequilíbrio Financeiro

DESVIOS CAUSADOS PELA VALE EM PROCESSOS DO PROJETO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL DA EFC

ETAPAS	DESVIO (%)
Mobilização (Ambientação + RAC'S)	2,64
Jazidas (TAC)	14,89
Jazidas (Áreas de Empréstimo)	4,56
Outorga	47,32
Informe Gerencial	17,24
Revisões de Projetos e Indefinições de Escopo	36,12
Medições Retidas (Cortes sem Justificativas)	13,51
DESVIO GERAL DOS CONTRATOS DO PROJETO	136,28

O desvio geral dos contratos da integridade estrutural da EFC causou um *desequilíbrio financeiro de na ordem de R\$ 70 milhões.*

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



ABERTURA DA ORDEM DE SERVIÇO

ATA DE REUNIÃO ABERTURA DE OS.		GAEFG	
LOCAL: Sala de Reuniões GAEFG	N.º 0101	DATA 10/05/2010	FOLHA 01 de 01
P R E S E N T E S			
NOME	EMPRESA	RUBRICA	
Paulo Rolim	VALE		
Carlos Jorge	VALE		
Hermerson Matos	Concremat		
Rogério Belfort	WO		
Carlos Moura	VALE		
Marcelo Augusto	VALE		
Márcia Florentino	Concremat		
Juliano Latterza	Concremat		
Wendy Aroucha	WO		
Francisco Alves	WO		
Alessandro Gomes	WO		

A VALE estabeleceu um prazo de 30 (trinta) dias para a mobilização dos contratos da EFC, incluindo admissão de pessoal (seleção, recrutamento e treinamento), contratação de logística (transporte) e montagem de canteiro.

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



BARREIRAS IMPOSTAS PELA VALE PARA MOBILIZAÇÃO: ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Planilha de mobilização - Mensagem (HTML) (Somente leitura)

Arquivo Mensagem

Ignorar Lixo Eletrônico Excluir Responder Responder a Todos Encaminhar Mais

Mover para: ? Para o Gerente Concluído Reunir para o Gerente Criar

Regras OneNote Ações

Marcar como Não Lida Categorizar Acompanhamento

Localizar Relacionadas Selecionar Zoom

Enviada em: **qui 20/05/2010 18:00** Enviada em: qui 20/05/2010 18:00

De: Hellen Daiane Teixeira Camargo <hellen.camargo@concremat.com.br>
Para: alessandrolima@woengenharia.com.br; nivaldo@woengenharia.com.br
Cc: alexandre.dias@concremat.com.br; cristiane.duarte@concremat.com.br; luciano.monte@concremat.com.br; marcio_muniz@hotmail.com; raul.rolim@vale.com; rodrigo.coji@vale.com; silas.pereira@vale.com; wagna.vieira@concremat.com.br

Assunto: Planilha de mobilização

Mensagem PLANILHA_MOBILIZAÇÃO.xls (544 KB)

Cc: raul.rolim@vale.com; rodrigo.coji@vale.com;

Assunto: Planilha de mobilização PLANILHA_MOBILIZAÇÃO.xls (544 KB)

Prezados Nivaldo e Alessandro,

Conforme alinhado na **reunião de hoje**, segue planilha de mobilização

Conforme alinhado na reunião de hoje, segue planilha de mobilização a ser preenchida com base no recrutamento realizado pela WO e em seguida deve ser enviado aos facilitadores de mobilização da

Mais informações sobre: Hellen Daiane Teixeira Camargo.

11:18 17/05/2011

A VALE causou um atraso de 10 dias na entrega da planilha de mobilização (passo a passo).

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



BARREIRAS IMPOSTAS PELA VALE PARA MOBILIZAÇÃO: ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Processo ASO - Mobilização 01 - Mensagem (HTML) (Somente leitura)

Arquivo Mensagem

Ignorar Excluir Responder Responder a Todos Encaminhar Mais Reunião

Mover para: ? Para o Gerente

Email de Equipe Concluído

Responder e Exc... Criar

Mover OneNote

Regras

Marcar como Não Lida

Categorizar Acompanhamento

Localizar

Relacionadas

Traduzir

Selecionar

Zoom

Zoom

Acompanhar.
Se houver problemas com o modo de exibição desta mensagem, clique aqui para exibi-la em um navegador da Web.

Enviada em: **seg 24/05/2010 10:51**

Categoria Vermelha

De: Alexandre Concremat <alexandre.dias@concremat.com.br>
Para: Alessandro WO; Nivaldo WO; Eudes WO; Bergson WO
Cc: luciano.monte@concremat.com.br; hellen.camargo@concremat.com.br; Marcio Açailândia Concremat; Cristiane Duarte; raul.rolim@vale.com; rodrigo.coji@vale.com; silas.pereira@vale.com; Pierre Concremat; José Burgos SI Concremat; Alexandre Concremat
Assunto: Processo ASO - Mobilização 01

Mensagem DIRETRIZ...zip (3 MB) ANEXO 7 - PGS01 GASOG - CARTA PADRÃO - SAUDE.xls (76 KB) PGS01 GASOG - DIRETRIZ DE SAÚDE OCUPACIONAL 2010.doc (511 KB)

INFORMATIVO CONTRATADAS.doc (71 KB)

Nome do arquivo: PGS01 GASOG - DIRETRIZ DE SAÚDE OCUPACIONAL 2010.doc
Tipo do arquivo: arquivo DOC
Tamanho do arquivo: 511 KB

Nome do arquivo: PGS01 GASOG - DIRETRIZ DE SAÚDE OCUPACIONAL 2010.doc (511 KB)
Nome do arquivo: PGS01 GASOG - DIRETRIZ DE SAÚDE OCUPACIONAL 2010.doc
Tipo do arquivo: arquivo DOC
Tamanho do arquivo: 511 KB

Att

Alexandre Dias
Técnico de Segurança
CT 1009969/2008/Marabá/PA.
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A.
(94)8136 5253 / (94)3322 1092.
alexandre.dias@concremat.com.br

Mais informações sobre: alexandre.dias@concremat.com.br.

*...Conforme documentos anexos deverão a clínica seguir os procedimentos médicos e emitir o ASO.
PGS01 GASOG - DIRETRIZ DE SAÚDE OCUPACIONAL 2010 ...*

Att
Alexandre Dias
Técnico de Segurança...
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A

A VALE causou um atraso de 24 dias na entrega da Diretriz de Saúde Ocupacional, documento indispensável para a elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



BARREIRAS IMPOSTAS PELA VALE PARA MOBILIZAÇÃO: APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO ARBITRARIAMENTE

		TERMO DE INTERDIÇÃO / NOTIFICAÇÃO		RG 08 DECG Página 1 de 1 Data: 25/07/2003 Código Treinamento: 5QU0526 Resp. Técnico: Fernando Lignani
Data: 24/05/10	Hora: 16:25	Local:		
De: CONCREMAT ENGENHARIA LTDA.		Gerência: GAIIOG		
Para: WO ENGENHARIA LTDA – OC.: 1476313-C – WO		Gerência: GAIIOG		
Area / Equipamento / Atividade: ELABORAÇÃO E ENTREGA DO PCMSO DO CONTRATO OC.: 1476313-C - WO				
Descrição da condição de risco: <p>De acordo com a reunião para apresentação da documentação necessária para abertura de Ordem de Serviço de S&S (que segue anexa) realizada dia 10 de maio de 2010, foi acordado que a empresa WO ENGENHARIA LTDA. apresentaria o PCMSO até o dia 18/05/2010 no setor de Gestão de Contratadas da VALE em São Luís/MA para aprovação, porém até o presente momento não foi entregue.</p> <p>OBS.: Ressaltando que a elaboração e entrega do PCMSO acarretará conseqüentemente em um ASO fora das diretrizes RAC e a não aprovação do mesmo na medicina VALE, o que irá impactar no planejamento de mobilização. Os ASO's somente serão liberados mediante a entrega e aprovação do PCMSO.</p>				
Recomendações: Entregar a documentação necessária para abertura de OS para aprovação na VALE. Prazo: IMEDIATO (25/05/2010)				
Assinatura do Emitente: Hellen Camargo – Eng. De Segurança do Trabalho - CONCREMAT				

A VALE aplicou notificação pelo atraso na entrega do PCMSO. Ressalta-se que a VALE havia entregue a documentação indispensável para a sua elaboração somente a 5h e 34min antes.

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



BARREIRAS IMPOSTAS PELA VALE PARA MOBILIZAÇÃO

ENC: PLANILHAS PARA MOBILIZAÇÃO PACOTE C - Lote 02 - Mensagem (texto sem formatação)

Arquivo Mensagem

Ignorar Lixo Eletrônico Excluir Responder Responder a Todos Encaminhar Mais

Mover para? Para o Gerente Email de Equipe Responder e Ex... Etapas Rápidas

Concluído Reuniao

Regras OneNote Mover Ações

Marcar como Não Lida Categorizar Acompanhamento

Traduzir Localizar Relacionadas Selecionar Edição Zoom

Foram removidas as quebras de linha extras desta mensagem.

De: Alessandro Lima <alessandrolima@woengenharia.com.br>
Para: 'Rogerio / WoEngenharia'
Cc:
Assunto: ENC: PLANILHAS PARA MOBILIZAÇÃO PACOTE C - Lote 02

Enviada em: **terça-feira, 15 de junho de 2010 11:22** Enviada em: ter 17/05/2011 12:32

----- Mensagem original -----
De: Alexandre Dias dos Santos Souza [mailto:alexandre.dias@concremat.com.br]

Enviada em: terça-feira, 15 de junho de 2010 11:22
Para: Rômulo Bastos - W.O Engenharia Ltda.
Cc: 'Alessandro Lima'; 'Sylvio Brito'; 'Bergson Bruno'
hellen.camargo@concremat.com.br; luciano.monte@concremat.com.br; carlos.barata@concremat.com.br
Assunto: Re: PLANILHAS PARA MOBILIZAÇÃO PACOTE C - Lote 02

Necessário apresentar os ASO's para que possamos preparar os malotes que serão encaminhados para São Luís.

Trazer juntamente com a copia da CTPS Assinada, conforme Bergson realiza ajustar com ele e a Raquel sobre o processo.

Att

.....
Alexandre Dias
Técnico de Segurança
CT 1009969/2008/Marabá/PA.
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A.
(94)8136 5253 / (94)3322 1092.
alexandre.dias@concremat.com.br
.....

Necessário apresentar os ASO's para que possamos preparar os malotes que serão encaminhados para São Luís. Trazer juntamente com a copia da CTPS Assinada,

Mais informações sobre: Alessandro Lima.

12:37 17/05/2011

A VALE exigiu que a WO ENGENHARIA assinasse as carteiras de trabalho de todos os seus empregados antes mesmo que os exames fossem validados pela Medicina VALE.

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



BARREIRAS IMPOSTAS PELA VALE PARA MOBILIZAÇÃO: ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS LOCAIS PARA MONTAGEM DOS CANTEIROS

Ata de Reunião			
Unidade de Negócio: GAIOG		Data de realização: 11/06/2010	
Responsável: CARLOS BARATA			
Nome dos Participantes	Visto	Nome dos Participantes	Visto
Wagna Vieira - Concremat		Alessandro Lima - WO Engenharia	
Carlos Barata - Concremat		Rafael Noieto - WO Engenharia	
Carlos Bacurau - Concremat		Rogério - WO Engenharia	

A VALE causou um atraso de **38 dias** na definição dos locais para montagem dos canteiros de obras.

Desenvolvimento
considerações Gerais
Fica programado para o dia 16 e 17/06/10 as datas para realização de visita aos locais de obras pra definição do local para montagem dos canteiros de obras, com a presença da Vale, Gerenciadora e Wo Engenharia.
A Gerenciadora informa que a Contratada deverá dar agilidade na montagem dos canteiros para atendimento das obras. Resp.: A Contratada estima que deverá iniciar as montagens de canteiros a partir do dia 21/06/10, após a liberação dos crachás pela Vale.

Fica programado para o dia **16 e 17/06/10** as datas para realização de visita aos locais de obras pra definição do local para montagem dos canteiros de obras com a presença da Vale, Gerenciadora e Wo Engenharia.

A Gerenciadora informa que a Contratada deverá dar agilidade na montagem dos canteiros para atendimento das obras. Resp.: A Contratada estima que deverá iniciar as montagens de canteiros a partir do dia 21/06/10, após a liberação dos crachás pela Vale.

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



BARREIRAS IMPOSTAS PELA VALE PARA MOBILIZAÇÃO: DESCASO COM O PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE EMPRESAS DE ÔNIBUS

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
<http://www.foxitsoftware.com> For evaluation only.

Enviada: 18/08/2010 08:52:36

Mensagem de texto

De:

Para: 0419491520763

Enviada: 18/08/2010 08:52:36

aguardando retorno da Heloisa (Concremat)
desde o dia 06.08.10.
Estamos com efetivo parado.

Preciso da sua ajuda na liberação da sub-contratação da segunda empresa de ônibus. Estamos aguardando retorno da Heloisa (Concremat) desde o dia 06.08.10. Estamos com efetivo parado. Ontem comuniquei o fato ao Jiuliano.

A VALE adotou uma postura de verdadeiro descaso no processo de liberação de empresa de ônibus para transporte de pessoal para as obras.

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



BARREIRAS IMPOSTAS PELA VALE PARA MOBILIZAÇÃO: DESCASO COM O PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE EMPRESAS DE ÔNIBUS

Gerenciadora fez pouco caso da solicitação da WO ENGENHARIA. Gerente usou como justificativa uma viagem e informou ainda que o processo estava TRAVADO no Rio de Janeiro. Esta atitude desrespeitosa atrasou o início das obras em mais 15 dias.

ENC: DOCUMENTAÇÃO L P TRANSPORTES - Mensagem (HTML)

Arquivo Mensagem

De: Luciano Monte Raso [mailto:luciano.monte@concremat.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 18 de agosto de 2010 16:25
Para: 'Alessandro Lima'
Cc: rogerio@woengenharia.com.br; 'Juliano Latterza'
Assunto: RES: DOCUMENTAÇÃO L P TRANSPORTES

Alessandro,

Estava viajando e somente agora consegui ver seu e-mail. Quando for assim pode me ligar. Em relação a liberação dos documentos estava travado o processo no Rio e a Heloisa me informou sobre tudo e tão logo comentei com Rodrigo e Raul e eles tomaram as providencias. Fato é que hoje quando cheguei já recebi a informação que já estava liberado para formalizar a subcontratação. Quanto a vistoria se ainda estiver pendente peço que me avise pois tomarei as providencias para agilizar o processo.

Caso tenha alguma pendência, volto a repetir, me ligue!

Sds,

Luciano Monte Raso

De: Alessandro Lima [mailto:alessandrolima@woengenharia.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 13 de agosto de 2010 11:55
Para: 'Luciano Monte Raso'
Assunto: ENC: DOCUMENTAÇÃO L P TRANSPORTES

Luciano,

Preciso do seu costumeiro apoio para acelerar o processo da empresa abaixo, pois trata-se do transporte que atendera as necessidades dos pacotes C e D.

Estamos no aguardo da Validação do RG da mesma.

No aguardo,


Alessandro G. de Lima
Preposto de Contrato
WO Engenharia Ltda
(98) 8138-4538

Mais informações sobre: Alessandro Lima.

14:18
18/05/2011

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



BARREIRAS IMPOSTAS PELA VALE PARA MOBILIZAÇÃO: FALTA DE ESTRUTURA PARA TREINAMENTOS

ENC: Treinamento de comunicação de Rádio ROF - Mensagem (HTML)

Arquivo Mensagem

Ignorar X Lixo Eletrônico Excluir Responder Responder a Todos Encaminhar Mais Reunião

Mover para: ? Para o Gerente Concluído Criar

Regras OneNote Mover Ações

Marcar como Não Lida Categorizar Acompanhamento

Localizar Relacionadas Traduzir Selecionar Edição Zoom

De: Alessandro Lima <alessandrolima@woengenharia.com.br>
Para: rogerio@woengenharia.com.br
Cc:
Assunto: ENC: Treinamento de comunicação de Rádio ROF

Enviada em: sáb 09/04/2011 13:52

Enviada em: segunda-feira, 23 de agosto de 2010 14:11

De: Alexandre Dias Concremat MBA [mailto:alexandre.dias@concremat.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 23 de agosto de 2010 14:11
Para: Edivalson Jr ENG SEG WO; Talita cassia almeida de souza; francisco.acacio@caemco.com.br; c0018960@vale.com; ronilson.pinhoiro@concremat.com.br
Cc: luciano.monte@concremat.com.br; Rodrigo GAIÓG MBA; José Carvalho DUCOL Preposto; Alessandro WO; Junior Ladeira CAEMCO; Joilson CAEMCO
Assunto: Treinamento de comunicação de Rádio ROF

Assunto: Treinamento de comunicação de Rádio ROF

Prezados

Solicito os nomes de pessoas que serão necessário operar Rádio ao longo da Ferrovia.

Informo que a turma e de no maximo 15 pessoas, para as empresas:

WO Pacote C - 4 vagas
WO Pacote D - 3 vagas
CAEMCO - 1 vaga
CONCREMAT - 2 vagas
DUCOL - 3 vagas
SACRAMENTO - 2 vagas.

**Informo que a turma e de no maximo 15 pessoas, para as empresas:
WO Pacote C - 4 vagas**

Favor me enviar as prioridades de atendimento, pois a equipe VALE no momento está com atividades internas.

Estarei negociando as atividades para semana que vem.

a equipe VALE no momento está com atividades internas

Att

Alexandre Dias
Técnico de Segurança
CT 1009969/2008/Marabá/PA.
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A.
(94)8136 5253 / (94)3322 1092.
alexandre.dias@concremat.com.br

Mais informações sobre: 'Alessandro Lima'.

17:11
24/05/2011

A VALE não se preparou para atender a demanda de treinamentos. Os primeiros treinamentos ocorreram somente 105 dias após a assinatura da Ordem de Serviço.

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Canteiro de Obras – Premiação de melhor canteiro das obras do trecho EFC

A WO ENGENHARIA foi parabenizada como melhor infra-estrutura de canteiro das obras de integridade da Estrada de Ferro Carajás. Ressaltamos que todos os canteiros montados seguiram um só padrão, mudando apenas o local de implantação disponibilizado pela exclusivamente pela VALE.



RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Barreiras Impostas pela VALE: Outorga D'água (Liberação para Captação D'água)

DATAS IMPORTANTES DO PROCESSO

05/01/2010	INÍCIO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA
07/05/2010	ASSINATURA DO CONTRATO
10/05/2010	ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS

O Anexo 2 - Análise Ambiental do Serviço do DIAM (Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) **determina que a contratada deva solicitar a licença para GAMAG**



DIAM – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Anexo 2 - Análise Ambiental do Serviço	Nº: RG-0029-DIAM (Anexo 2)	Pág.: 1 a 5
	Classificação: uso interno	Rev.: 01-16/04/2009
Responsável Técnico: Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvidimentos Sustentável - DIAM	Código de Treinamento: N/A	
Público-alvo: Todas as unidades da Vale	Palavras-chave: contratação, análise ambiental	

ITEM I - ANÁLISE AMBIENTAL DO SERVIÇO

Objetivo: Estabelecer orientações e requisitos ambientais para o processo de contratação, com base na legislação e nas normas ambientais da Vale, que devem ser atendidas por suas contratadas para mitigar os impactos ambientais associados à execução das atividades.

Ao final do preenchimento deste RG atentar para as orientações gerais do item 6.

1- Dados do Contrato

Objeto do Contrato:

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REVEGETAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL NOS KM S 729, 734, 736, 750, 751 e 752 NA EFC.

CAMPOS PARA PREENCHIMENTO DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE (quando aplicável):

a) Requisitos Específicos (Requisitos Legais e/ou Normativos):

CONAMA 237/97

b) Orientações para o atendimento aos requisitos legais e/ou normativos:

Solicitar a licença para GAMAG, afim da mesma montar processo para solicitar formalmente a SEMA

Solicitar a licença para GAMAG, afim da mesma montar processo para solicitar formalmente a SEMA

A VALE retardou a entrega das Outorgas D'água para as obras da integridade estrutural da EFC mesmo de posse das mesmas desde fevereiro/2010. Esta ação causou um atraso de 66 dias.

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Barreiras Impostas pela VALE: Outorga D'água (Liberação para Captação D'água)

❑ A VALE, em 16/06/2010, determina que a WO aguarde autorização para iniciar a captação de água

❑ A VALE, em 18/06/2010, autoriza a WO a fazer captação de água em alguns pontos. Informando que estes pontos não possuem outorga.

Ata de Reunião **16/06/2010**

Unidade de Negócio: **GAIOG**

Responsável: **SILAS ROBERTO** Data de realização: **16/06/2010**

Nome dos Participantes	Visto	Nome dos Participantes	Visto
Silas Roberto - VALE	15/1	Alexandre Lima - WO Engenharia	15/1

Os pontos identificados para captação de água para atendimento para o pacote D: 750+800/Ponte Sororó/Lagoa natural. A contratada deve aguardar uma autorização para o início do uso dos pontos de captação.

Ata de Reunião Semanal Contratada **18 junho, 2010**

Unidade de Negócio: **GAIOG**

Responsável: **Francisco Vicente** Data de realização: **18 junho, 2010**

Nome dos Participantes	Visto	Nome dos Participantes	Visto
Francisco Vicente - Vale	15/1	Patricia Rorres - WO	15/1

Os pontos de captação mapeados para atender as obras onde os mesmos não possuem outorga, medidas de controle deverão ser tomadas: manter distância e limpeza (roço) próximo a área e não deixar o pipa transbordar, além de preencher a planilha de captação diariamente e semanalmente entregar a Gerenciadora.

A VALE retardou a entrega das Outorgas D'água para as obras da integridade estrutural da EFC mesmo de posse das mesmas desde fevereiro/2010. Esta ação causou um atraso de **66 dias**.

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Barreiras Impostas pela VALE: Outorga D'água (Liberação para Captação D'água)

❑ Ressalta se que a VALE tinha a outorga desde fev/2010.

Porque a VALE só entregou a outorga para a WO em julho/2010?

❑ Após várias reuniões, A VALE em 13/10/2010, libera a captação de água na Lagoa de Ferro Gusa.

Porque a VALE detentora de um ponto de captação d'água suficiente para atendimento às obras, faz a sua liberação somente em outubro?

DOC. 23

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMAPA
Diretoria de Recursos Hídricos - DIREH

Outorga

Nº.: 201/2010 VALIDADE ATÉ: 03/02/2013

PROCESSO Nº.: 2009/0800013435 DATA DO PROTOCOLO: 29/05/2009

A Secretária de Estado de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Estadual nº 6.381, de 25 de julho de 2001, e em conformidade com a Resolução nº 003, de 03 de setembro de 2008, concede a presente Outorga do direito de uso dos recursos hídricos ao empreendimento abaixo discriminado.

NOME / RAZÃO SOCIAL/ DENOMINAÇÃO: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE PORTE: B - II

ENDEREÇO: PONTO DE CRUZAMENTO DE MARABÁ, SP, KM 738 E F. CARAJÁS, BAIRRO INTERIOR - Marabá - PA
MUNICÍPIO: Marabá DATA: SAC09 - E. 939999 - N. 716511 CEP: 68.501-536

A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE ABAIXO DESCRITA:
Captação de água superficial em 8 (oito) corpos hídricos, conforme descritos a seguir: 1- Rio Jacundá, vazão 170 m³/dia; 2- Rio Mãe Maria, Vazão: 241 m³/dia; 3- Rio Flexeira, Vazão: 250 m³/dia; 4- Rio Sororó, Vazão: 268 m³/dia; 5- Igarapé das Onças, Vazão: 176 m³/dia; 6- Rio Castanheira, Vazão: 650 m³/dia; 7- Igarapé Surpresa, Vazão: 685 m³/dia; 8- Rio Parauapebas, Vazão: 100 m³/dia

LOCAL E DATA: Belém - PA, 04 de fevereiro de 2010

ANÍBAL PESSOA PINOPO
Secretário de Estado de Meio Ambiente

DOC. 24

VALE

Ata de Reunião

Unidade de Negócio: GAIOG

Responsável: Whatna Carvalho Data de realização: 13/10/2010

Nome dos Participantes Visto Nome dos Participantes Visto

Wandélcia Oliveira - Concretat: nk

Concretat solicita que seja verificado o equipamento (escavadeira hidráulica), pois a mesma apresenta vazamento de óleo e orientamos que o início das captações na Lagoa da Ferro Gusa,

	PLANILHA		DESVIO (%)
	QUANTIDADE DE ATERRO (M³)	IMPOSSIBILIDADE POR FALTA D'ÁGUA	
	CONTRATUAL		
PACOTE C	93.498,45	36.618,33	39,16
PACOTE D	356.605,25	298.827,15	83,80

A VALE retardou a entrega das Outorgas D'água para as obras da integridade estrutural da EFC mesmo de posse das mesmas desde fevereiro/2010. Esta ação causou um atraso de 66 dias.

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Barreiras Impostas pela VALE: Outorga D'água (Liberação para Captação D'água)

❑ Em 21/06/2010, a WO reitera a cobrança à VALE, das outorgas d'água.

❑ A WO de agindo de forma sustentável afirma que a captação d'água sem as outorgas causaria **graves danos** à comunidade.

❑ A VALE , somente em 15/07/2010, autoriza a WO a fazer captação de água, em alguns pontos, com as devidas outorgas.

❑ A vazão de captação liberada era bem menor que a necessária para execução dos serviços.

DOC. 09

GAIOG
21/06/2010

Ata de Reunião

Unidade de Negócio: GAIOG
Responsável: CARLOS BARATA Data de realização: 21/06/2010

Nome dos Participantes Visto Nome dos Participantes Visto
Gláudio Correa - Concremat

A WO alerta para pontos de outorgas de água para atendimento às obras dos Km's C e D

A Gerenciadora informa repassando esta avaliação até o dia 23.06.10.

DOC. 22.1

GAIOG
15/07/2010

Ata de Reunião

Unidade de Negócio: GAIOG
Responsável: WHATNA CARVALHO Data de realização: 15/07/2010

Nome dos Participantes Visto Nome dos Participantes Visto

Concremat entrega cópia das outorgas de água para captação superficial dos pontos de obras situados em Marabá e São Pedro da Água Branca.

A VALE retardou a entrega das Outorgas D'água para as obras da integridade estrutural da EFC mesmo de posse das mesmas desde fevereiro/2010. Esta ação causou um atraso de 66 dias.


RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Barreiras Impostas pela VALE: Fornecimento de Material de Aterro (Jazida)–Responsabilidade VALE (TAC)

- O processo de licenciamento para exploração de jazida ocorreu somente em 13/08/2010 (DOC 86).
- A WO ENGENHARIA enviou sua proposta comercial em 25/08/2010 (DOC 26) após fechar todos os questionamentos técnicos e ambientais. Verificando todo o processo de recuperação de área degradada, exigência legal. *Lei N.º 6.938 de 31 de agosto de 1981, (DOC-28) e Decreto N.º 97.632 de 10 de abril de 1989. (DOC-29).*

DOC. 86

	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/PA Travessa Lomas Valentinas, 2717 - Marco, Belém - PA, CEP: 66.095-770 Fone: (91) 3184-3318/3360 - Fax: (91) 3276-8564 - www.sema.pa.gov.br	<small>FORMULÁRIO Nº 001/2007</small>
REQUERIMENTO PADRÃO		
1 - OBJETIVO DO PEDIDO		
9 - DECLARAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que:		
a) Venho requerer à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/PA o ^(s) Respetivo ^(s) documento ^(s) relacionados no item 1 desse requerimento;		
b) Concordo integralmente com o teor do Estudo/Projeto Técnico proposto;		
c) O desenvolvimento das atividades relacionadas no ^(s) Estudo ^(s) Ambiental ^(s) realizar-se-ão de acordo com os dados descritos nos mesmos;		
d) O requerente nesta oportunidade assume a responsabilidade, para efeitos jurídicos, sobre a veracidade das informações prestadas, sob as penas da Lei.		
<u>Belém, PA, 13 de Agosto de 2010</u>		
 Assinatura do Responsável Técnico	 Assinatura do Representante Legal Apresentar procuração quando for o caso. Reconhecer firma.	

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Barreiras Impostas pela VALE: Fornecimento de Material de Aterro (Jazida)-Responsabilidade VALE (TAC)

TAC'S PACOTES B/C/D/F - Pacote D - Mensagem (HTML) (Somente leitura)

Arquivo Mensagem

Ignorar Excluir Responder Responder a Todos Encaminhar Mais Reuniao

Mover para: ? Para o Gerente Regras OneNote Mover Responder e Exc... Concluido Criar

Marcar como Não Lida Categorizar Acompanhamento Traduzir Localizar

Relacionadas Selecionar Edição Zoom

De: karenn.magalhaes@vale.com Enviada em: seg 22/11/2010 17:54

Para: osmarfilho@woengenharia.com.br; Rogerio / WO Engenharia'

Cc: 'Osmar / WoEngenharia'; 'Waldir Pires'

Assunto: TAC'S PACOTES B/C/D/F - REV.03 - Pacote D

Assunto: TAC'S PACOTES B/C/D/F - REV.03 - Pacote D **Enviada em: seg 22/11/2010 17:54**

Senhores, **Joao Alberto Andrade/Sls/Vale**

Solicitamos revisão da proposta conforme abaixo:

Joao Alberto Andrade/Sls/Vale Para: Karenn Magalhães/Sls/Vale@VALE

22/11/2010 13:33 **Pacote C** Cc: Andre Andrade/Sls/Vale, Adrian Lopes/Sls/Vale@VALE

Karenn, Assunto: Re: TAC'S PACOTES B/C/D/F - REV.03 - Pacote [cLink](#)

Item 1.8.1 - Fornecimento de material de jazida

Pacote C:

Item 1.8.1 - Fornecimento de material de jazida (Não incluso escavação, carga e transporte. Sem a recuperação de área degradada. Ensaios para caracterização da jazida - fornecimento VALE).

Não podemos atestar o valor informado da negociação por se tratar de uma análise específica do suprimentos
Sobre o empolamento, sempre consideramos 1,25, na reunião foi informado pelo Rogério que em seus ensaios foi encontrado 1,30, não temos evidencias destes ensaios.

A Engenharia esta de acordo com os outros itens novos deste pacote, considerando que foi feito análise dos preços ofertados pelo suprimentos.

João Alberto de Andrade

Vale - Diretoria de Logística Norte
Gerência de Engenharia de Implantação EFC - SLS
Av. dos Portugueses, s/n Praia do Boqueirão 65085 590 São Luis MA Brasil
T. 55 (98) 3218-5375 F. 55 (98) 3218-4357 C. 55 (98) 9112-4449

Atenciosamente,

Karenn Queiroz Magalhães
VALE
Centro de Serviços Compartilhados Brasil / Shared Services Center Brazil
Suprimentos / Procurement
Tel: 55-98-3218-4331 / Carriér: 866

Mais informações sobre: karenn.magalhaes@vale.com.

**Sobre o empolamento,
sempre consideramos 1,25,
A Engenharia esta de acordo com os outros itens novos deste pacote**

**Esta ação da VALE causou um
atraso de 127 dias**

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Barreiras Impostas pela VALE: Fornecimento de Material de Aterro (Jazida)-Responsabilidade VALE (TAC)

	GUIA DE ENGENHARIA	
TÍTULO	Nº VALE	PÁGINA
GUIA – CM's DE SERVIÇOS PARA OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.	GU - E - 433	87/292
		REV.
		7

1. Composição do preço unitário:

Os serviços de carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais excedentes de uso geral serão compostos pelo volume, em metros cúbicos (m³), aplicados para materiais resultantes de escavações ou provenientes de estoques da seguinte maneira:

- a. para materiais resultantes de escavações, o critério para obtenção do volume será o mesmo considerado na medição da escavação de que originou;
- b. para materiais estocados destinados a aterros ou reaterros, o critério para obtenção do volume será o mesmo considerado na medição do aterro ou reaterro a que se destinaram;
- c. para materiais estocados destinados a bota-foras que estejam fora das condições dos subitens "a" e "b", o volume de medição poderá ser obtido ou no estoque, ou no equipamento transportador, ou no bota-fora, a critério da FISCALIZAÇÃO, por meio da sua divisão pelo coeficiente de 1,3 relativo ao empolamento.


coeficiente de 1,3 relativo ao empolamento

Esta ação da VALE causou um atraso de 127 dias

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Barreiras Impostas pela VALE: Fornecimento de Material de Aterro (Jazida)-Responsabilidade VALE (TAC)



Esta ação da VALE causou um atraso de 127 dias. Fica claro e evidente que a **ALTA DIREÇÃO** da mandatária VALE usa e abusa do dito popular: **FAÇA O QUE EU DIGO MAS NÃO FAÇA O QUE EU FAÇO.**

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Serviços Adicionais do Contrato - Extra Escopo (TAC)

A WO dependia da regularização e / liberação pelo IBAMA para oferta dos preços de fornecimento da jazida.

Osmar Filho

De: Rogério / WO Engenharia [rogerio@woengenharia.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 12 de agosto de 2010 16:11
Para: karenn.magalhaes@vale.com
Cc: osmarfilho@woengenharia.com.br; penha@woengenharia.com.br
Assunto: RES: Proposta de para Itens Novos - Contratos nº 1476303; 1476313; 1476328 e 1476335.EXCUÇÃO DE OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REVEGETAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL (PACOTES B, C, D e F)

Prezada Sra. Karenn Magalhães,

Até a presente data ainda estamos aguardando a liberação/documentação legal das jazidas para que possamos oficializar nossa proposta comercial para o referido item.

Sds,
Rogério Belfort

De: karenn.magalhaes@vale.com [mailto:karenn.magalhaes@vale.com]

Enviada em: segunda-feira, 9 de agosto de 2010 11:28

Para: rogerio@woengenharia.com.br

Cc: osmarfilho@woengenharia.com.br; penha@woengenharia.com.br

Assunto: Re: Proposta de para Itens Novos - Contratos nº 1476303; 1476313; 1476328 e 1476335.EXCUÇÃO DE OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REVEGETAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL (PACOTES B, C, D e F)

Rogério,

Solicitamos um posicionamento da WO.

6 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO			
Nome ou Razão Social: VALDIR DAL MORA			
Nº de CPF: 23993716015	Nº de Registro no Órgão de classe:	Nº de Credenciamento / RECTAM-PA:	
Endereço: RUA 32 B15 LOTE 02			
Número: 02		Complemento: 02	
Bairro: RUA MARABÁ		Número:	
Município/UF: MARABÁ	CEP: 68.508.140	Fax:	
Telefone Residencial: 94-33223134		Telefone Comercial:	(94) 3266819
E-mail:		WEB SITE:	

7 - IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL			
Nome ou Razão Social: VALDIR DAL MORA			
Nº de CPF: 23993716015	Complemento:		
Endereço: RUA 32 B15 LOTE 02			
Número: 02	Bairro: RUA MARABÁ	Município/UF:	
CEP: 68508140	Telefone Residencial: 33223134	Fax:	Telefone Comercial:
E-mail:		(94) 3266819	

8 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE(S) A SEREM LICENCIADA(S)			
EXTRAÇÃO DE CASCALHO LATÉRITICO EMPRE- GADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL.			

Declaro para os devidos fins que:

- Venho requerer à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/PA o(s) Respetivo(s) documento(s) relacionados no item I desse requerimento;
- Concordo integralmente com o teor do Estudo/Projeto Técnico proposto;
- O desenvolvimento das atividades relacionadas no(s) Estudo(s) Ambiental (s) realizar-se-ão de acordo com os dados descritos nos mesmos;
- O requerente nesta oportunidade assume a responsabilidade, para efeitos jurídicos, sobre a veracidade das informações prestadas, sob as penas da Lei.

MARABÁ PA, 13 de AGOSTO de 2010

Assinatura do Representante Legal
Aplicar o procedimento quando for o caso.
Reconhecer firma.

Jazida não regularizada até a data abaixo.

MARABÁ PA, 13 de AGOSTO de 2010

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Barreiras Impostas pela VALE: Jazida de Material de Empréstimo (Aterro) – Fornecimento VALE

O fato de recusarmos a submeter-nos a práticas abusivas era interpretado como “subterfúgios burocráticos” para o não andamento das nossas obras.

De: carlos.mello.junior@vale.com [mailto:carlos.mello.junior@vale.com]

Enviada em: sexta-feira, 26 de novembro de 2010 19:00

Para: osmar@woengenharia.com.br

Cc: rogerio.amaral@vale.com; micheline.goncalves@vale.com

Assunto: Enc: Obras Vale Ferrovia

Caro Osmar, estou extremamente desapontado com a postura da WO, que ao invés de buscar concluir suas obras muito atrasadas, fica buscando

subterfúgios burocráticos para fugir da responsabilidade de concluir o que começou.

Peço seu apoio para mudar esse pensamento dentro da equipe que desconstrói qualquer relacionamento entre nossas empresas.

Att,

.....
Carlos R. C. Mello Júnior

Gerente de Projetos e Implantação de Obras

Esta ação da VALE causou
um atraso de 127 dias

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Pendências de Pagamentos da VALE – Retenção de Medições

Obras de Integridade da EFC – Pacotes

No período de Agosto a Novembro/2010, a VALE efetuou cortes indevidos nas medições da WO ENGENHARIA sem a apresentação comprobatória de análises técnicas que respaldassem os cortes efetuados.

Desde o dia 01/10/2010, a WO ENGENHARIA reitera a sua cobrança ao Gestor de Contratos VALE (DOC 37) das pendências das documentações comprobatórias dos cortes de medições.

DOC. 37

"Alessandro Lima"
<alessandrolima@woengenharia.com.br>
01/10/2010 14:20

Para <luciano.monte@concremat.com.br>, "Cezar Almeida" <augusto.almeida@concremat.com.br>
cc: "Rodrigo GAIOS MBA" <rodrigo.gaios@vale.com>, "Rogério Preposto WO" <rogerio@woengenharia.com.br>
Assunto: Solicitação de Planilhas de Medições (Pacotes C e D), Posto de Abastecimento e Oficina.

"Alessandro Lima"
<alessandrolima@woengenharia.com.br>

Para <luciano.monte@concremat.com.br>

Prezado Luciano,

Favor nos encaminhar as planilhas de medições (pacote C, pacote D, posto de abastecimento e oficina) fechadas pela Concremat/Vale no ELO, referente ao período de 21/08 a 20/09/2010, bem como seus anexos:

1. Levantamentos topográficos das áreas de escavações e aterros (CADERNETAS E SEÇÕES);
2. Cópia das avaliações de mobilização que geraram os percentuais para pagamento;
3. Cópia das avaliações de manutenção de canteiros que geraram os percentuais para pagamento.

NOTA: Favor nos encaminhar os certificados de calibração dos aparelhos topográficos utilizados nos levantamentos realizados pela equipe da Concremat.

No aguardo,

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Pendências de Pagamentos da VALE – Retenção de Medições

Em 24/10/2010, nos primeiros momentos de divergências nas medições, a WO fez uma comunicação formal ao Gerente de Contratos – Gerenciadora VALE, se posicionando contrária a atitude da fiscalização por ser um ato que fere as regras contratuais.



DOC. 26

WO Engenharia – 023/10

Marabá/PA, 24 de outubro de 2010.

À CONCREMAT ENGENHARIA LTDA.
A/C Luciano M. R. Santos
Engenheiro Civil

Referência: Contrato N. 1476313 e N.1476328

Assunto: Critérios adotados para medição

Prezado Senhor,

posicionamento da WO Engenharia Ltda

Formalizamos através desta o **posicionamento da WO Engenharia Ltda** referente a alguns itens de medição adotados pela Gerenciadora/Vale, no qual não estamos de acordo, conforme exposto abaixo:

no qual não estamos de acordo

Protocolo de Entrega

Nome: AGOSTO CESAR ARAUJO DA

Recebido em: 27/10/10 as 14:48 Hs

Assinatura: [Assinatura]

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Pendências de Pagamentos da VALE – Retenção de Medições

Obras de Integridade da EFC – Pacotes

DOC. 21

Importante registrar que a WO buscou todos os meios de comunicação para solucionar a questão e não obteve respostas.

- ❑ Ressalta-se que esta situação fora discutida exaustivamente em todas as gerências envolvidas no processo (Engenharia / Suprimentos / Institucional) durante o período de outubro a dezembro/2010, inclusive diretoria (DILN). Por vezes, usavam do abuso de poder e ameaças para intimidar a WO e ainda nos acusavam de fazer “uso de subterfúgios burocráticos” para justificativas dos problemas no andamento do cronograma das obras. (DOC-21).

“From: ‘Luciano Monte Raso Santos’

<luciano.monte@concremat.com.br>

To: alessandrolima@woengenharia.com.br,

rafael.noleto@woengenharia.com.br

Cc: rodrigo.coji@vale.com, francisco.vicente@vale.com,

paolo.coelho@vale.com, augusto.almeida@concremat.com.br,

heloisa.cardoso@concremat.com.br,

luciano.monteraso@concremat.com.br

Sent: Thu, 9 Dec 2010 10:10:24 -0300

Subject: Assinatura Boletim de Medição

Alessandro,

Estamos com as medições dos meses de setembro, outubro e novembro sem assinaturas por parte da WO referentes

..... Solicito seu posicionamento quanto a

regularização destas assinaturas de forma urgente...

... Estarei aguardando até o final do dia de hoje a sua definição, pois após isso, caso permaneça a situação da forma que está, estarei comunicando a Vale que a WO esta se recusando a assinar os referidos BM's.

Lembro que ambos são itens **contratuais e obrigatórios**, forçando a gerenciadora a usar o contrato caso seja necessário.

Sds,

Luciano Monte Raso

Concremat Engenharia e Tecnologia S/A”

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



DESEMBOLSO DA VALE NO CONTRATO COM A WO

	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGO PELA VALE	PERCENTUAL PAGO PELA VALE	AVANÇO REGISTRADO	MEDIÇÃO PREVISTA	DIFERENÇA DE MEDIÇÃO
PACOTE B - OC 1476303	R\$ 17.686.090,33	R\$ 3.483.057,00	19,69%	32,57%	R\$ 5.760.359,62	R\$ 2.277.302,62
PACOTE C - OC 1476313	R\$ 22.677.631,11	R\$ 3.829.113,82	16,88%	35,10%	R\$ 7.959.848,52	R\$ 4.130.734,70
PACOTE D - OC 1476328	R\$ 27.686.090,33	R\$ 5.434.274,26	19,63%	34,40%	R\$ 9.524.015,07	R\$ 4.089.740,81
PACOTE F - OC 1476335	R\$ 7.669.491,74	R\$ 1.815.742,29	23,67%	40,93%	R\$ 3.139.122,97	R\$ 1.323.380,68
	R\$ 75.719.303,51	R\$ 14.562.187,37	19,23%	34,84%	R\$ 26.383.346,18	R\$ 11.821.158,81

CONCREMAT ENGENHARIA

RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA

OBRA: Integridade Estrutural da EFC - PACOTE "C" - WO

SEM: S 48
DE: 29/11/2010
ATE: 05/12/2010

PREV	REAL	DESVIO	FAROL AVANÇO	INÍCIO PREVISTO	INÍCIO REAL	TERMINO PREVISTO	TERMINO REAL	ATRASO (DIAS)	FAROL PRAZO
94,0%	35,1%	-63%	⊗	14/06/2010	17/07/2010	18/03/2011	19/04/2011	32	⊗

AVANÇO FÍSICO SEMANAL

ENTREGAVES

ENTREGAVES	Acumulado	PREV	REAL	PREV	REAL
Mobilização	100,0%	50,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportação	90,0%	52,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Estruturais	58,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outras	84,0%	21,7%	7,4%	0,0%	0,0%
Investigação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Desmobilização	0,0%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%

RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DURANTE A SEMANA:

RECURSOS QUE NÃO DEPENDEM DE TAC REFORÇAM AS SUAS ATIVIDADES NORMAIS SEMANA 48

Proposta de novas ações:

SEM 47

SEM 48

CONCREMAT ENGENHARIA

RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA

OBRA: Integridade Estrutural da EFC - PACOTE "D" - WO

SEM: S 48
DE: 29/11/2010
ATE: 05/12/2010

PREV	REAL	DESVIO	FAROL AVANÇO	INÍCIO PREVISTO	INÍCIO REAL	TERMINO PREVISTO	TERMINO REAL	ATRASO (DIAS)	FAROL PRAZO
93,4%	34,4%	-63%	⊗	14/06/2010	18/07/2010	21/03/2011	21/03/2011	0	⊗

AVANÇO FÍSICO SEMANAL

ENTREGAVES

ENTREGAVES	Acumulado	PREV	REAL	PREV	REAL
Mobilização	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transportação	93,2%	51,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Estruturais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outras	82,9%	99,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Investigação	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Desmobilização	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DURANTE A SEMANA:


RECURSOS QUE NÃO DEPENDEM DE TAC REFORÇAM AS SUAS ATIVIDADES NORMAIS SEMANA 48

Proposta de novas ações:

SEM 47

SEM 48

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Como a WO ENGENHARIA não se fazia mais presente nos canteiros de obras, a VALE elaborou a sua própria medição. Curiosamente em decorrência do MAU HÁBITO de realização de cortes nas medições na WO, a VALE não se atentou e realizou um corte na ordem de 34,35%.


Pela análise efetuada Vale/ gerenciamento, chegamos aos seguintes valores:

Pacote C: R\$ 824.802,79
Pacote D: R\$ 1.809.591,52

Sds,

Rodrigo Coji Kimati


RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Ressalto também que o entedimento da WO sobre "pendências nas medições" é equivocado, pois existe sim uma divergência entre a expectativa de receita da WO e o que de fato foi liberado.

Estamos falando de uma situação grave, que está ganhando grandes proporções de divulgação dentro da Vale, e precisamos mostrar profissionalismo diante disso!

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



2) Realizar reunião para sanar dúvidas sobre os conceitos dos critérios de medição.
Resp.: Rogério Belfort / André Andrade Prazo: 23/dez Status: Concluído

Obs.: i) Ficou apenas um ponto pendente, cujo esclarecimento será finalizado hoje
ii) As medições contemplando os conceitos esclarecidos já estão sendo revistas em campo

A VALE no dia 27/12/2010, **129 dias após o início das reclamações fundamentadas da WO ENGENHARIA**, reconheceu os males causados a uma empresa idônea e cumpridora de todas as suas obrigações legais e sociais. Ressalta-se que mesmo com este reconhecimento há um inadimplemento na ordem de **R\$ 12 milhões**.

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



AÇÕES/BUSCAS DA WO PARA EVITAR A INSOLVÊNCIA DA EMPRESA

Diante da situação provocada pelo desequilíbrio financeiro que a VALE impôs com suas ações morosas a WO ENGENHARIA buscou alternativas na tentativa de impedir a insolvência e manter os seus contratos e evitar um problema social nas cidades que estava inserida, mantendo-se como uma empresa que colaborava com o desenvolvimento local.

1. Reunião com Gerencia / Diretoria VALE.

- 1.1 – Reunião com a gerencia GAIOG (02/09/2010)
- 1.2 – Reunião com a gerencia GANEN – DIEF (Carajas) – (22/09/2010)

2. Solicitação de Empréstimos Bancários.

Sem conseguir o auxílio da parceria VALE e já com atrasos de pagamento de fornecedores, eminência de atraso de folha de pagamento e primeira parcela do 13º salários, A WO ENGENHARIA buscou conseguir empréstimos bancários.

Negociou-se empréstimos com bancos porém não suficientes para evitar a insolvência da empresa.

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Pendências de Pagamentos da Vale – Contratos de Locação de Equipamentos em Serra dos Carajás

ANEXO DOC 032



REQUISIÇÃO TÉCNICA

4. ESCOPO DETALHADO DOS SERVIÇOS (CONFORME ITENS DO QQP)

4.1. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

- 4.1.1 A mobilização/desmobilização será paga após ocorrer a mobilização mínima conforme descrito nesta especificação técnica. Essa será paga uma única vez quando a mesma ocorrer entre a sede da empresa e o local da prestação de serviços e vice-versa.
- 4.1.2 A mobilização mínima a ser considerada compreende: 10 caminhões basculantes, 02 escavadeiras hidráulicas, 01 pá carregadeira, 02 tratores de esteira, 01 retroescavadeira, 02 caminhões pipas para atendimento aos serviços gerenciados pela GANEN. A GANEN poderá solicitar a mobilização de mais equipamentos sem que isto represente mobilização adicional.
- 4.1.3 Quando equipamentos de carga estiverem associados a equipamentos de transporte em uma frente de serviço, a proponente deve garantir que em caso de quebra do equipamento de carga, os equipamentos de transporte não ficarão ociosos, caso isto ocorra, toda a “patrulha” envolvida somente terá sua hora considerada quando a situação estiver regularizada.
- 4.1.4 Os equipamentos em manutenção não devem prejudicar o desenvolvimento dos serviços, devendo a proponente ter equipamento em “stand by”, para suprir a necessidade da frente de serviço, por este equipamentos não serão cobrados horas à disposição. O período de manutenção não deve ser superior ao prazo de 48 horas, podendo a proponente ser notificada e multada pelo não cumprimento deste item.

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Pendências de Pagamentos da Vale – Contratos de Locação de Equipamentos em Serra dos Carajás

RESUMO DE VALORES (R\$)

SOMA DE VALORES EMPENHADOS OC 1213180	R\$	8.755.321,68
SOMA DE VALORES EMPENHADOS OC 1213234	R\$	3.274.016,25
SOMA GERAL DE VALORES EMPENHADOS NOS CONTRATOS	R\$	12.029.337,93
SOMA DAS DIFERENÇAS DE VALORES	R\$	17.683.245,69
SOMA DAS CORREÇÕES MONETÁRIAS	R\$	24.938.980,81

AÇÕES/BUSCAS DA WO PARA EVITAR A INSOLVÊNCIA DA EMPRESA

3. Solicitação de Antecipação de Receitas (NF's).

Apesar de todas as insistências, a solicitação da WO não foi atendida em tempo hábil, e cabe ressaltar que a suposta AJUDA ocorrera única e exclusivamente motivada pela interdição da ferrovia por parte dos empregados da WO ENGENHARIA que estavam com seus salários do mês de dezembro e a primeira parcela do 13º salário em atraso.

Esta interdição traria problemas desta vez para à VALE e não mais somente para a WO ENGENHARIA.

A VALE no dia 17/12/2010 fez a autorização para antecipação de recebimentos com taxa de desconto de 1,20% ao mês.

AÇÕES/BUSCAS DA WO PARA EVITAR A INSOLVÊNCIA DA EMPRESA

4. Solicitação de Não Aplicação de Multa.

A exemplo de responsabilidades VALE podemos listar:

- Falta de logística no período de mobilização, de forma a emperrar o processo de mobilização da WO ENGENHARIA que era de 30 dias, para montagem de toda a estrutura necessária a execução do contrato.
- Não liberações e/ou liberações tardias de frentes de serviços de acordo com os prazos contratuais. Exemplos de materiais tais como: brita, trilhos dormentes e acessórios de fixação;
- Escopo mal elaborado sem definições reais dos serviços e redução considerável de quantitativos do escopo real da obra comparado ao contratado;

RELATÓRIO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA WO ENGENHARIA CAUSADO PELA VALE



Danos Materiais e Morais, Provocados pela VALE, à Imagem da WO ENGENHARIA e aos seus Empregados

*De: paolo.coelho@vale.com [mailto:paolo.coelho@vale.com]
Enviada em: quarta-feira, 8 de dezembro de 2010 11:00
Para: alessandrolima@woengenharia.com.br; 'CLÁUDIO SANTOS';
luciano.monte@concremat.com.br; 'Rafael Noletto';
rodrigo.coji@vale.com
Assunto: Re: Colaboradores da obra da oficina eletromecânica e Posto
1 parados*

Alessandro,

*Acabo de entregar 4 kg de pregos 18x27 para a equipe da WO que está
parada por falta de prego, concreto etc.
É um presente meu para a WO.*

Att,

.....

.....

Paolo Coelho



Fotos anexas no e-mail

