

Eco101 - BR-101 ES/BA



eco101

Outubro 2018

1



Investimentos Realizados



Resultados Já Obtidos



Cronograma de Obras



Principais Adversidades

INVESTIMENTOS REALIZADOS

- 475 Km de Recuperação estrutural de pavimento concluídos;
- Mais de 100% de nivelamento entre pista e acostamento concluídos;
- Revitalização da Sinalização Horizontal e Vertical de todo o trecho concedido;
- 15 km de Vias locais; (Fundão, Serra, Viana, P. Canário, Sooretama, Aracruz, J. Neiva)
- Recuperação do sistema de drenagem;
- Instalação de mais de 10 km de barreiras rígidas.
- Instalação de mais de 60 km de defensas metálicas;
- Recuperação de 30 terraplenos e estruturas de contenção.
- Recuperação estrutural de 18 pontes e viadutos;



INVESTIMENTOS REALIZADOS



- **Implantação 15.000 placas de sinalização;**
- **Implementação de 8 passarelas;** (Conceição da Barra, S. Mateus, Ibiraçu, Serra(2), Cariacica e Viana(2));
- **12 Bases Operacionais;**
- **Estrutura operacional para atendimento ao usuário** (frota e equipamentos);
- **Centro de Controle Operacional;**
- **Reformas de 6 postos e delegacias da PRF's;**
- **Recuperação estrutural e modernização de 3 postos de pesagem (balanças) .**



BR-101 ANTES DA CONCESSÃO



BR-101 DEPOIS DA CONCESSÃO



PESQUISA CNT

	2012	2018
ESTADO GERAL	REGULAR	BOM
PAVIMENTO	BOM	BOM
SINALIZAÇÃO	REGULAR	BOM
GEOMETRIA	REGULAR	BOM

PROGRAMA DE OBRAS E MELHORIAS

Descrição	Extensão	2017	2018		2019	
		02º Sem	01º Sem	02º Sem	01º Sem	02º Sem
Duplicações Trecho norte	7 KM					
Segmento 3 - João Neiva	2,5 KM					
		CONCLUÍDO (2,5KM)				
Segmento 4 -Ibiraçu	4,5 KM					
		EM ANDAMENTO				
Duplicações Trecho Sul	80,5KM					
Viana -Guarapari	30 KM					
		EM ANDAMENTO				
Guarapari-Iconha	40 KM					
		EM CONTRATAÇÃO / PREV ENTREGA 2020				
Anchieta	2,5 KM					
		CONCLUÍDO (2,5KM)				
Contorno de Iconha	8 KM					
		EM ANDAMENTO				
Melhorias Trechos Duplicados						
Revitalização Contorno Vitória						
		EM ANDAMENTO				
Viadutos Viana (298 - 298+500 Km)						
		EM ANDAMENTO				
Passarelas*						
		EM APROVAÇÃO DE PROJETO				

* (km 262+50 , 285+800 , 286+140 , 287+307, 288+354, 292+635, 295+237, 295+486)

Duplicação (Anchieta) = 2,5 Km

**Obra entregue em
Dezembro/17**



➤ Duplicação Segmento 3 (João Neiva) – Km 205,4 - Km 207,9 = 2,5 Km

**Obra entregue em
Setembro/18**



OBRAS EM ANDAMENTO

Duplicação Segmento 4 (Ibiraçu) – Km 215,9 - Km 220,4 = 4,5 km

**Previsão de Entrega :
Novembro/2018**



Fotos Outubro 2018

➤ Contorno de Iconha – 8 Km

**Previsão de entrega:
Novembro/2018**



Fotos Outubro 2018

➤ Contorno de Iconha – 8 Km

**Previsão de entrega:
Novembro/2018**



OBRAS EM ANDAMENTO



eco101

**ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
TRECHO VIANA/GUARAPARI**

DATA: 27 DE SETEMBRO 2018



eco101

➤ Viana-Guarapari – 30 Km

**Previsão de entrega:
2019**



Fotos Setembro 2018

➤ Viana-Guarapari – 30 Km

**Previsão de entrega:
2019**



➤ Viadutos em Viana Km 298 e 298+500

Previsão de entrega: 2019





eco101

**IMPLANTAÇÃO
INTERSEÇÕES EM DESNÍVEL
KM 298 e KM 298+500**

Viana - ES




eco101

➤ Revitalização Contorno de Vitória



- **Aceleração da degradação do pavimento devido excesso de peso e falta de fiscalização;**
- **Não pedagiamento da BR-116 MG;**
- **Contorno do Mestre Álvaro; (Perda da indução de tráfego);**
- **Licenciamento Ambiental obtido de forma fragmentada e morosa;**
- **Aumento excessivo do CAP (Principal insumo do pavimento);**
- **Fim do FUNDAP.**

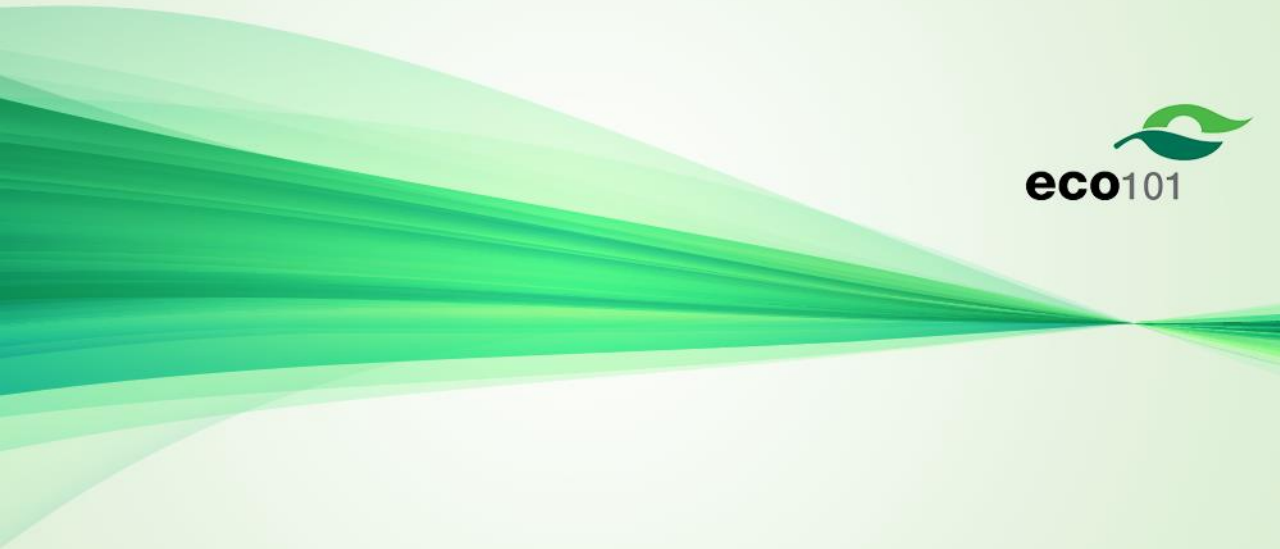

eco101
