

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 19/04/2022


Ministério da Saúde




MINISTÉRIO DA
SAÚDE




ETAPAS PREPARATÓRIAS DO PERSUS

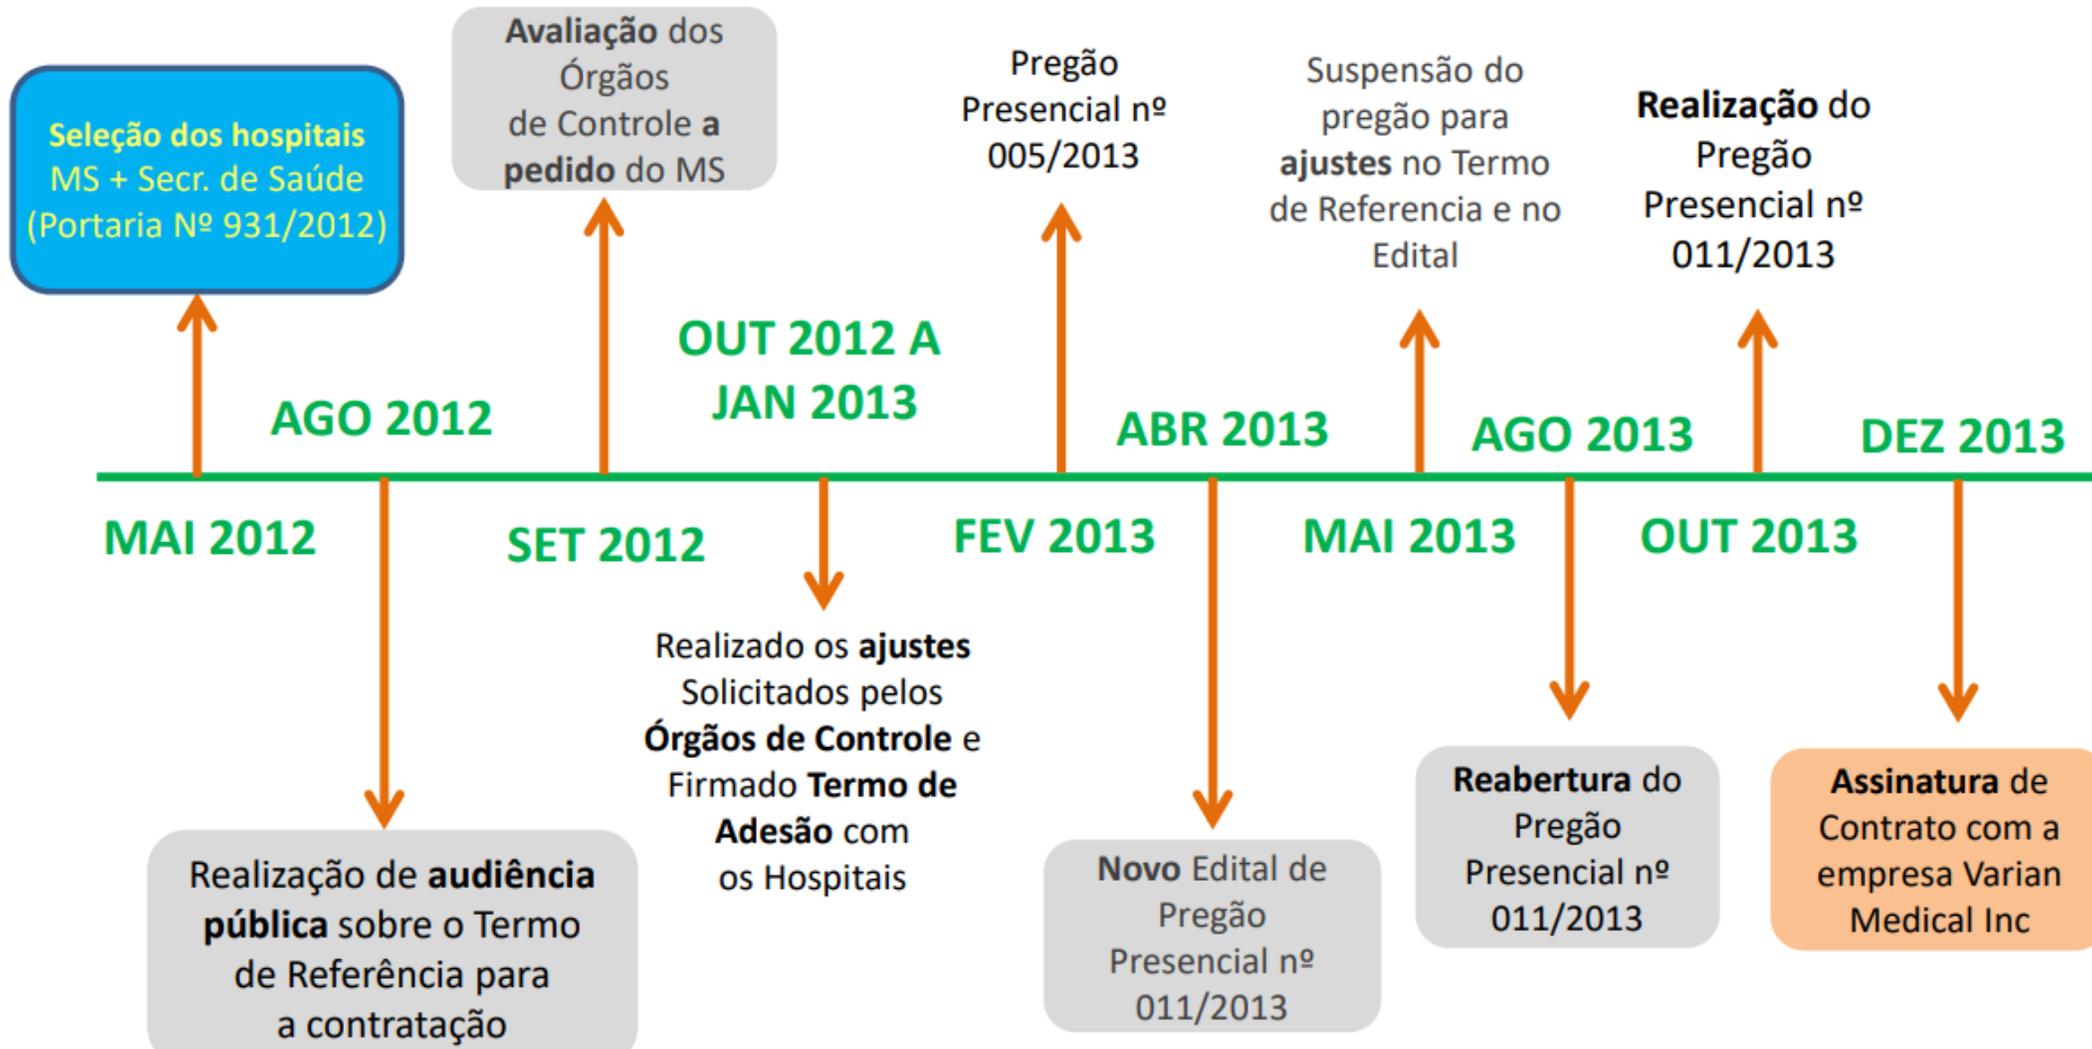

ABRANGÊNCIA DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA



- Ampliação
- Construção
- Casa Mata Vazia
- Equipamento obsoleto

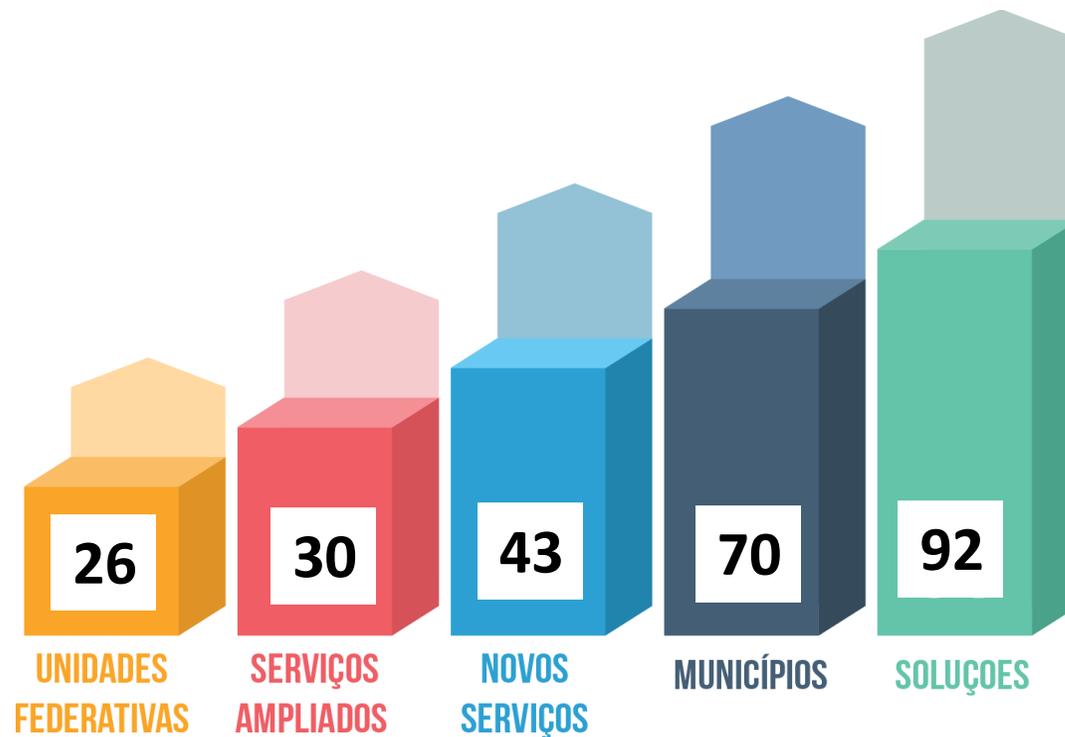

INVESTIMENTO REALIZADO E AINDA PREVISTO

INVESTIMENTO REALIZADO

PROJETOS	3.458.524
FISCALIZAÇÃO	8.925.562
EQUIPAMENTOS	149.271.388
OBRA	192.931.730
TOTAL	354.587.205

PREVISTOS

PROJETOS	1.623.692
FISCALIZAÇÃO	4.142.000
EQUIPAMENTOS	96.900.000
OBRA	220.000.000
TOTAL	322.665.692

LOA 2022 - ORÇAMENTO AÇÃO 8535 - PO – 0007: **R\$ 180.800.000,00**

PRÓXIMAS LICITAÇÕES

Número Processo SEI	ID	Serviço de Saúde	Município	UF	Edital	Sessão	Empresa	Situação	Valor do Contrato
25000.087857/2021-90	A36	Hospital São Paulo/UNIFESP	São Paulo	SP	26/11/2021	03/01/2022	INCORPLAN	Contratado	R\$ 3.241.903,14
25000.150677/2021-51	C46	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas	Teixeira de Freitas	BA	07/12/2021	10/01/2022	SHOCK	DIPLI - P/ HOMOLOGAÇÃO	R\$ 3.659.479,05
25000.037063/2021-85	C52	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis	Anápolis	GO	26/11/2021	27/12/2021	LEOMA	HOMOLOGADO	R\$ 9.671.357,79
25000.179755/2021-08	C91B	Santa Casa de Marília	Marília	SP	04/02/2022	08/03/2022	INCORPLAN	DIPLI - ANÁLISE DOC DA 2ª EMPRESA	R\$ 9.877.378,74
25000.005642/2022-40	C75B	Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua	Pariquera-Açú	SP	18/02/2022	15/03/2022	INCORPLAN	DIPLI - ANÁLISE DOC DA 2ª EMPRESA	R\$ 11.919.628,51
25000.004488/2022-99	A40	Hospital de Clínicas FAMEMA	Marília	SP	18/02/2022	15/03/2022	INCORPLAN	SAA - PARA CONTINUIDADE	R\$ 4.466.474,92
25000.003705/2022-23	C85B	Hospital e Maternidade São José	Colatina	ES	21/02/2022	17/03/2022	COMBRASEN	SCTIE - ANÁLISE DE DOC E PROPOSTA	R\$ 11.831.403,13
25000.004485/2022-55	C86	Hospital Fundação Beneficente Rio Doce	Linhares	ES	18/02/2022	16/03/2022	COMBRASEN	SCTIE - ANÁLISE DE DOC E PROPOSTA	R\$ 10.896.471,64
25000.005646/2022-28	C48	Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza	Fortaleza	CE	25/02/2022	23/03/2022	C.G.	CCLIC	R\$ 10.546.322,44
25000.179688/2021-13	C61	Hospital São José	Teresópolis	RJ	16/03/2022	06/04/2022	C.G.	DIPLI-ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO	R\$ 9.664.611,34
25000.059406/2018-67	C51	Hospital das Clínicas da UF de Goiás	Goiânia	GO	22/03/2022	12/04/2022		DIPLI-ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO	R\$ 5.234.070,38
25000.018893/2022-94	C90	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Itapeva	SP	25/03/2022	18/04/2022		DIPLI/AGUARDANDO SESSÃO	R\$ 12.668.080,43
25000.027691/2022-33	C82B	SPMIP/Hospital Marques Bastos	Parnaíba	PI	25/04/2022	18/04/2022		DIPLI/AGUARDANDO SESSÃO	R\$ 10.543.772,87
25000.028058/2022-62	C60	Hospital Federal do Andaraí	Rio de Janeiro	RJ	28/03/2022	19/04/2022		DIPLI/AGUARDANDO SESSÃO	R\$ 10.336.491,72
25000.030351/2018-11	A27	Hospital Universitário de Santa Maria	Santa Maria	RS				SAES PARA AUTORIZAÇÃO DE GOVERNANÇA	R\$ 2.762.837,53
25000.053181/2022-11	C84B	Hospital Dom Thomás	Petrolina	PE				SCTIE - EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL	R\$ 11.000.000,00
A Licitar	C87B	Hospital Regional Darcy Vargas	Rio Bonito	RJ				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.000.000,00
A Licitar	C89B	HU da Universidade Federal do Piauí	Teresina	PI				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.000.000,00
A Licitar	C88B	Hospital Nossa Senhora das Dores	Itabira	MG				PROJETO EXECUTIVO	R\$ 11.000.000,00
A Licitar	C93B	Santa Casa de Guaratinguetá	Guaratinguetá	SP				PROJETO EXECUTIVO	R\$ 11.000.000,00
A Licitar	C81	Hospital Regional João de Freitas	Arapongas	PR				PROJETO EXECUTIVO	R\$ 11.000.000,00
A Licitar	C94A	Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima	Macapá	AP				PROJETO EXECUTIVO	R\$ 11.000.000,00

PRINCIPAIS ENTRAVES

COVID - 19

- Fornecimento de Plantas desatualizadas por parte dos estabelecimentos;
 - Laudo de sondagem inconclusivo;
 - Falta de engenheiro para acompanhamento por parte da instituição;
 - Dificuldades de acesso às áreas do complexo hospitalar;
 - Segurança e vigilância da obra;
 - Manter a documentação exigida vigente e atualizada;
 - Titularidade dos terrenos;
 - Manter os terrenos livres e desimpedidos;
 - Importação do equipamento;
 - Informações gerais sobre a infraestrutura do hospital;
- Paralisação temporária de obras;
 - Atrasos no cronograma de execução de obra;s
 - Aumento de preços nos insumos da construção civil;
 - Solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro;
 - Aumento dos prazos de análise dos projeto.

PRINCIPAIS AVANÇOS

- Melhoria gradual da qualidade dos projetos licitados;
- Melhoria do fluxo de análise e aprovações;
- Substituição da contratada para apoio à fiscalização das obras;
- Aumento das exigências nos termos de referência;
- Melhor capacidade técnica das empresas executoras das obras;
- Redução dos prazos de pagamentos das medições;
- Qualificação da equipe técnica do Ministério da Saúde;
- Disponibilidade orçamentária para execução das ações;
- Mapeamento do processo de importação dos equipamentos;
- Execução de 100% das medidas de compensação previstas em contrato.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/07/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO		24/10/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		08/03/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		09/12/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.384.564,60

Valor Equipamento: R\$ 2.239.114,41

Valor Projeto: R\$ 17.595,25

Valor Fiscalização: R\$ 190.187,70

Valor da Solução: R\$ 4.831.461,96

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/07/2017
PROJETO EXECUTIVO		09/02/2018
LICITAÇÃO		12/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		06/11/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		15/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		15/03/2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.556.000,00
Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43
Valor Projeto: R\$ 76.984,53
Valor Fiscalização: R\$ 340.122,55
Valor da Solução: R\$ 8.430.443,49

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/11/2017
PROJETO EXECUTIVO		28/02/2018
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO		21/11/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/10/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		17/03/2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.634.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10

Valor Projeto: R\$ 82.749,23

Valor Fiscalização: R\$ 306.939,86

Valor da Solução: R\$ 8.483.403,19

PRÓXIMAS INAUGURAÇÕES



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

ADESÃO AO PLANO		12/04/2019
PROJETO BÁSICO		15/07/2019
PROJETO EXECUTIVO		26/11/2019
LICITAÇÃO		24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO		01/07/2020
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		Fev. 2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		Jun. 2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Mai. 2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 5.714.883,22
 Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15
 Valor Projeto: R\$ 61.470,58
 Valor Fiscalização: R\$ 228.616,42
 Valor da Solução: R\$ 8.966.301,37

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/03/2015
PROJETO EXECUTIVO		13/11/2019
LICITAÇÃO		19/03/2020
ORDEM DE SERVIÇO		21/10/2020
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		05/10/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/04/2022
LICENÇA OPERAÇÃO		Jun. 2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.545.775,74
Valor Equipamento: R\$ 3.345.650,00
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 228.616,42
Valor da Solução: R\$ 11.181,512,74

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/03/2015
PROJETO EXECUTIVO		13/11/2019
LICITAÇÃO		19/03/2020
ORDEM DE SERVIÇO		24/09/2020
OBRA CIVIL		99%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/10/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		Abr. 2022
LICENÇA OPERAÇÃO		Jun. 2022

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.648.490,00

Valor Equipamento: R\$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 228.616,42

Valor da Solução: R\$ 11.284.227,00

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		29/05/2018
PROJETO EXECUTIVO		21/11/2019
LICITAÇÃO		12/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO		29/10/2020
OBRA CIVIL		97%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		24/11/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		Abr. 2022
LICENÇA OPERAÇÃO		Jun. 2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.757.149,99
Valor Equipamento: 3.345.650,00
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 228.616,42
Valor da Solução: R\$ 9.210.886,41

ADESÃO AO PLANO		29/10/2012
PROJETO BÁSICO		07/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		24/06/2019
LICITAÇÃO		11/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO		28/09/2020
OBRA CIVIL		85%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		25/11/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		Mai. 2022
LICENÇA OPERAÇÃO		Jul. 2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.042.276,91
 Valor Equipamento: R\$ 3.345.650,00
 Valor Projeto: R\$ 61.470,58
 Valor Fiscalização: R\$ 228.616,42
 Valor da Solução: R\$ 12.678.013,90

RETOMADA DE OBRAS



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		27/09/2017
LICITAÇÃO		16/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO		17/12/2018
OBRA CIVIL		84%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

Obs. Em processo licitatório.

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.240.000,00
 Valor Equipamento: R\$ 2.491.218,41
 Valor Projeto: R\$ 61.470,58
 Valor Fiscalização: R\$ 277.075,44
 Valor da Solução: R\$ 10.088.348,98

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		25/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		24/01/2018
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO		26/11/2018
OBRA CIVIL		66%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

Obs. Em processo licitatório.

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 3.353.175,97

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 95.021,93


Valor Fiscalização: R\$ 254.637,63

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		10/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		25/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/07/2016
OBRA CIVIL		46%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

Obs. Em processo licitatório.

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

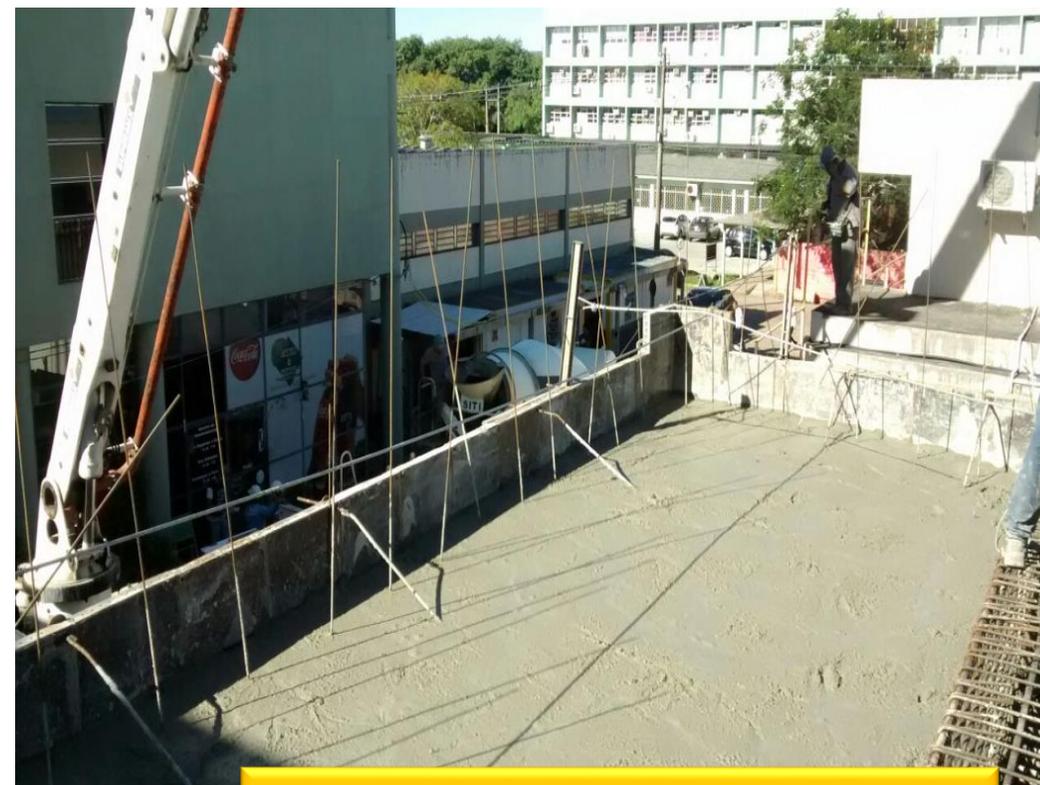

Valor Executado Obra: R\$ 1.307.440,54

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 17.566,24

Valor Fiscalização: R\$ 138.891,93

Valor da Solução: -

OBRAS PARALISADAS – AÇÃO JUDICIAL



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		18/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		21/06/2018
OBRA CIVIL		45%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400
 Atuado em: 13/11/2019
 Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF
 Aguardando realização de perícia judicial para posterior
 emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 3.459.283,16

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 91.026,10

Valor Fiscalização: R\$ 139.828,82

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		01/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO		18/07/2018
OBRA CIVIL		44%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 1.831.284,83

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 87.339,73

Valor Fiscalização: R\$ 173.379,55

Valor da Solução: -

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400
 Atuado em: 13/11/2019
 Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF
 Aguardando realização de perícia judicial para posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		15/01/2018
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		16/07/2018
OBRA CIVIL		43%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 2.081.932,47

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 95.433,76

Valor Fiscalização: R\$ 168.965,45

Valor da Solução: -

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400
 Autuado em: 13/11/2019
 Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF
 Aguardando realização de perícia judicial para posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.

ADESÃO AO PLANO		30/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/10/2016
PROJETO EXECUTIVO		08/01/2018
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		23/08/2018
OBRA CIVIL		35%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 2.291.463,61

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 94.678,25

Valor Fiscalização: R\$ 147.939,49

Valor da Solução: -

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400
 Atuado em: 13/11/2019
 Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF
 Aguardando realização de perícia judicial para posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/11/2016
PROJETO EXECUTIVO		24/08/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		23/07/2018
OBRA CIVIL		32%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 1.760.465,01

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 61.386,10

Valor Fiscalização: R\$ 167.730,59

Valor da Solução: -

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400
 Autuado em: 13/11/2019
 Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF
 Aguardando realização de perícia judicial para posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO		21/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		12/07/2018
OBRA CIVIL		26%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 1.531.358,73


Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 72.385,08

Valor Fiscalização: R\$ 159.158,39

Valor da Solução: -

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400
 Atuado em: 13/11/2019
 Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF
 Aguardando realização de perícia judicial para posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		05/02/2018
LICITAÇÃO		05/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		03/10/2018
OBRA CIVIL		24%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 1.630.425,71


Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 93.104,01

Valor Fiscalização: R\$ 137.431,63

Valor da Solução: -

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400
 Atuado em: 13/11/2019
 Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF
 Aguardando realização de perícia judicial para posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		02/08/2018
OBRA CIVIL		22%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 1.716.352,06

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 90.253,80

Valor Fiscalização: R\$ 132.256,71

Valor da Solução: -

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400
 Atuado em: 13/11/2019
 Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF
 Aguardando realização de perícia judicial para posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/07/2017
PROJETO EXECUTIVO		10/10/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		04/09/2018
OBRA CIVIL		13%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 386.569,10

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 55.304,72

Valor Fiscalização: R\$ 75.451,11

Valor da Solução: -

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400
 Autuado em: 13/11/2019
 Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF
 Aguardando realização de perícia judicial para posterior
 emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.

PROXIMAS INAUGURAÇÕES – SÓ EQUIPAMENTOS



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL


ADESÃO AO PLANO		11/03/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		30/09/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/12/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		Mai. 2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

ADESÃO AO PLANO		06/02/2016
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/01/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		28/11/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Mai.2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32

ADESÃO AO PLANO		04/08/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		02/12/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		19/06/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Mai 2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32

ADESÃO AO PLANO		02/07/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		06/08/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/12/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Jul.2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.997.223,00

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

ADESÃO AO PLANO		04/08/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		28/04/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/11/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Jul.2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

Valor Equipamento: R\$ 3.011.067,39



OBRIGADO!

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 19/04/2022

<https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/per-sus>



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

