

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS – DPE/SIH
NOVEMBRO/2016

O PROJETO

- O PISF visa garantir a segurança hídrica a 12 milhões de habitantes, em 390 municípios, nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de gerar emprego e promover a inclusão social.
- O empreendimento tem extensão de 477 km organizados em dois Eixos de transferência de água - Norte e Leste. A obra engloba a construção de 9 estações de bombeamento, 27 reservatórios, 4 túneis, 13 aquedutos, 9 subestações de 230 kV, e 270 km de linhas de transmissão em alta tensão.
- Ao mesmo tempo em que busca garantir o abastecimento por longo prazo de grandes centros urbanos da região, como Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato, Mossoró, Campina Grande, Caruaru, João Pessoa e de centenas de pequenas e médias cidades do Semiárido, o projeto beneficia áreas do interior do Nordeste com potencial econômico, importantes no âmbito de uma política de desconcentração do desenvolvimento nacional.

PIAUÍ



Eixão das Águas (em operação)




AVANÇO FÍSICO (OUTUBRO/2016)


EXECUÇÃO
FÍSICA DO PISF 90,85%





EIXO NORTE - 91,25%

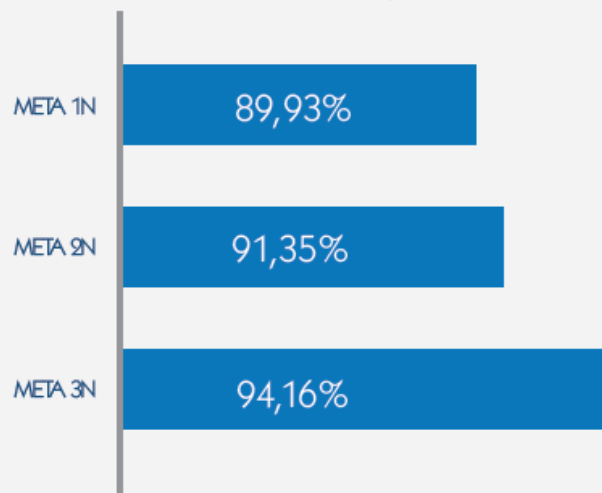

EIXO LESTE - 90,27%

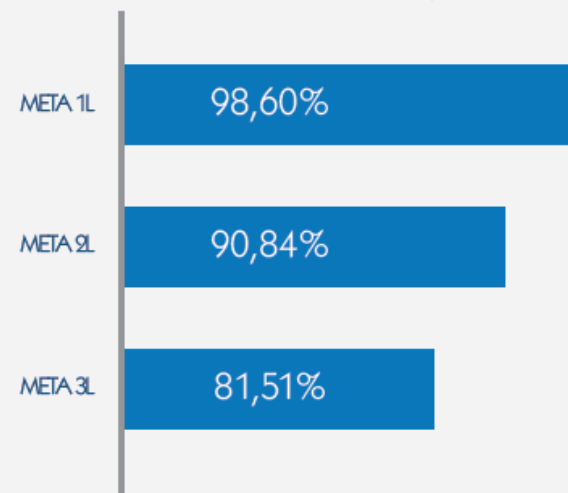

EIXO NORTE

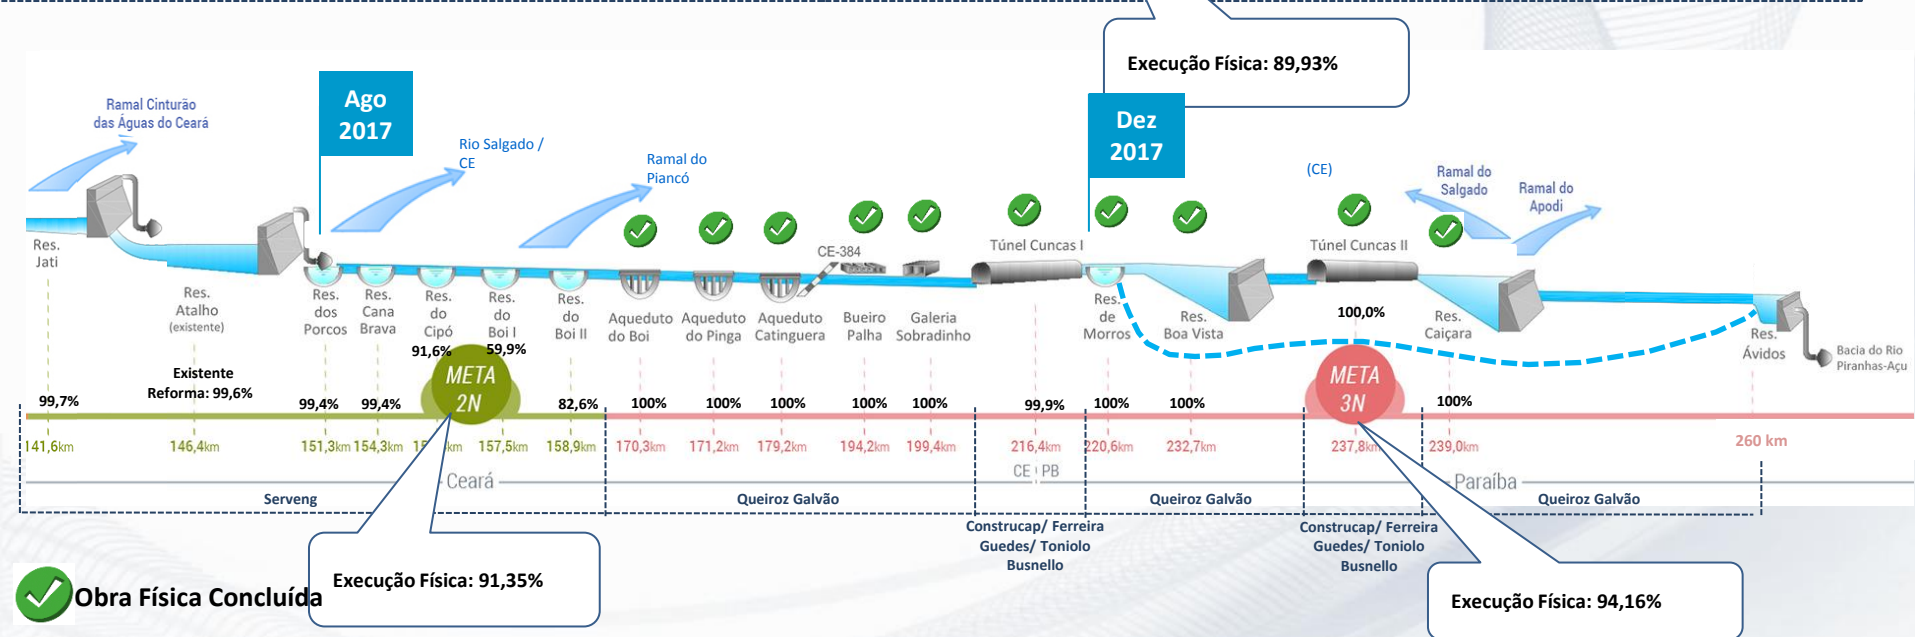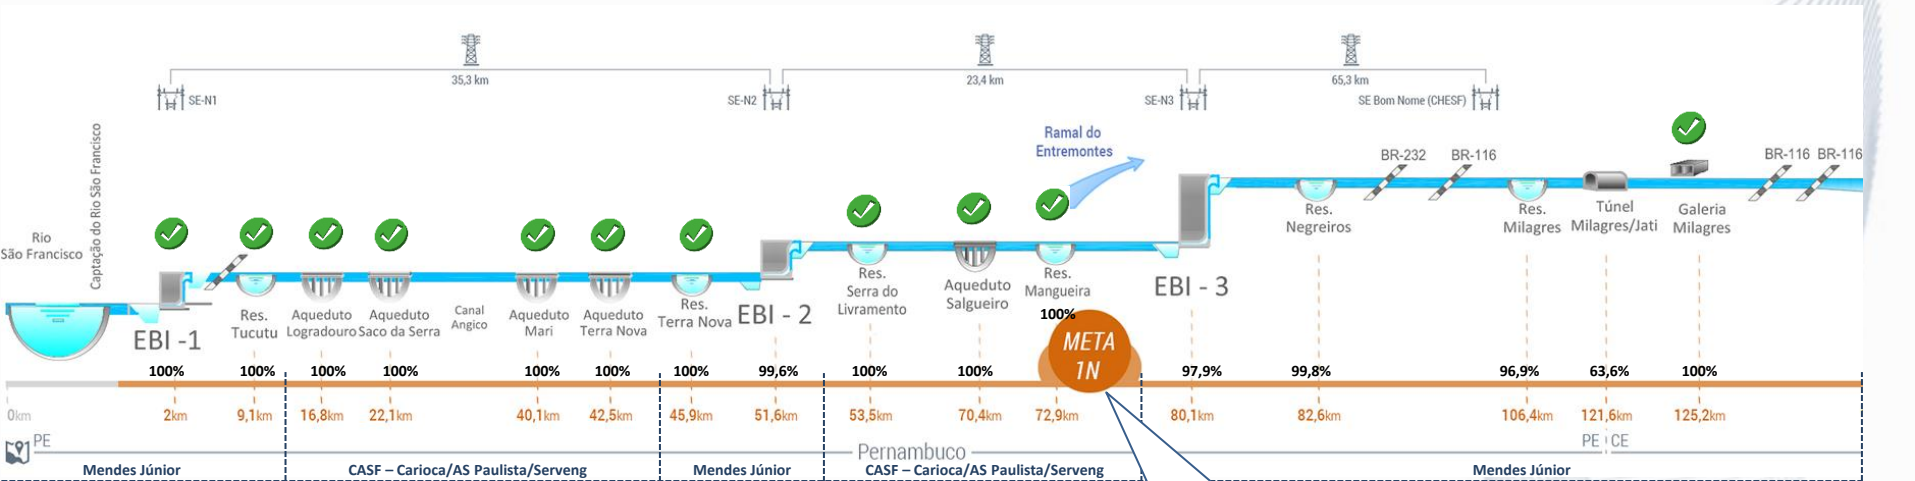

Execução Física: 89,93%

Dez 2017

Ago 2017

Execução Física: 91,35%

Execução Física: 94,16%

Obra Física Concluída

EIXO NORTE – Meta 1N

89,93% de execução

Executada pela Empresa Mendes Junior (contrato em processo de rescisão e contratação de remanescentes).

Contempla as três primeiras estações de bombeamento sendo que a primeira **EBI-1 está concluída**, tendo iniciado em 06.08.2015 o bombeamento, fornecendo água para o Reservatório Tucutu.

04 Reservatório concluídos: Tucutu, Terra Nova, Mangueira e Serra do Livramento.

05 Aquedutos concluídos: Logradouro, Saco da Serra, Mari, Terra Nova, Salgueiro



EIXO NORTE – Meta 1N

- **Contratos da Mendes Junior em fase de Rescisão**
 - Em Junho de 2016 a Construtora Mendes Junior comunicou ao MI falta de condições técnicas e financeiras para continuar os dois contratos da Meta 1N
- **Contratação dos Remanescentes de Obra:**
 - Nov/2016: Consulta pública da minuta do edital e seus anexos
 - Dez/2016: Publicação do edital RDC – (06/12)
 - Jan/2017: Abertura das propostas das empresas interessadas
 - Fev/2017*: Assinatura do contrato com a empresa vencedora
 - * Prazo previsto se não houver recursos administrativos e judicialização do processo
- O MI vem atuando em parceria com o TCU com a intenção de construir a solução mais efetiva para substituição da Mendes Junior
- A nova construtora que assumir as obras da Meta 1N vai priorizar os serviços necessários para a passagem da água e as demais atividades complementares de engenharia/acabamento finais serão realizadas até início de 2018

EIXO NORTE – Meta 2N

91,35% de execução

Executada pela Empresa Serveng, com obras em pleno andamento, que contemplam a execução dos reservatórios Jati, Atalho, Porcos, Cana Brava e Cipó.

Estrutura de Controle
Reservatório Porcos



Reservatório Jati



Tomada D'água
Reservatório Atalho



EIXO NORTE – Meta 3N

94,16% de execução

Executada pela Empresa Queiroz, com obras em pleno andamento, contemplando:

- Reservatórios: Morros, Boa vista e Caiçara
- Aquedutos: Boi, Pinga, Catinguera
- Túneis: Cunca I e II
- Galeria Sobradinho
- Bueiro Palha

Aqueduto Catinguera




Reservatório Caiçara



Túnel Cuncas I

EIXO LESTE

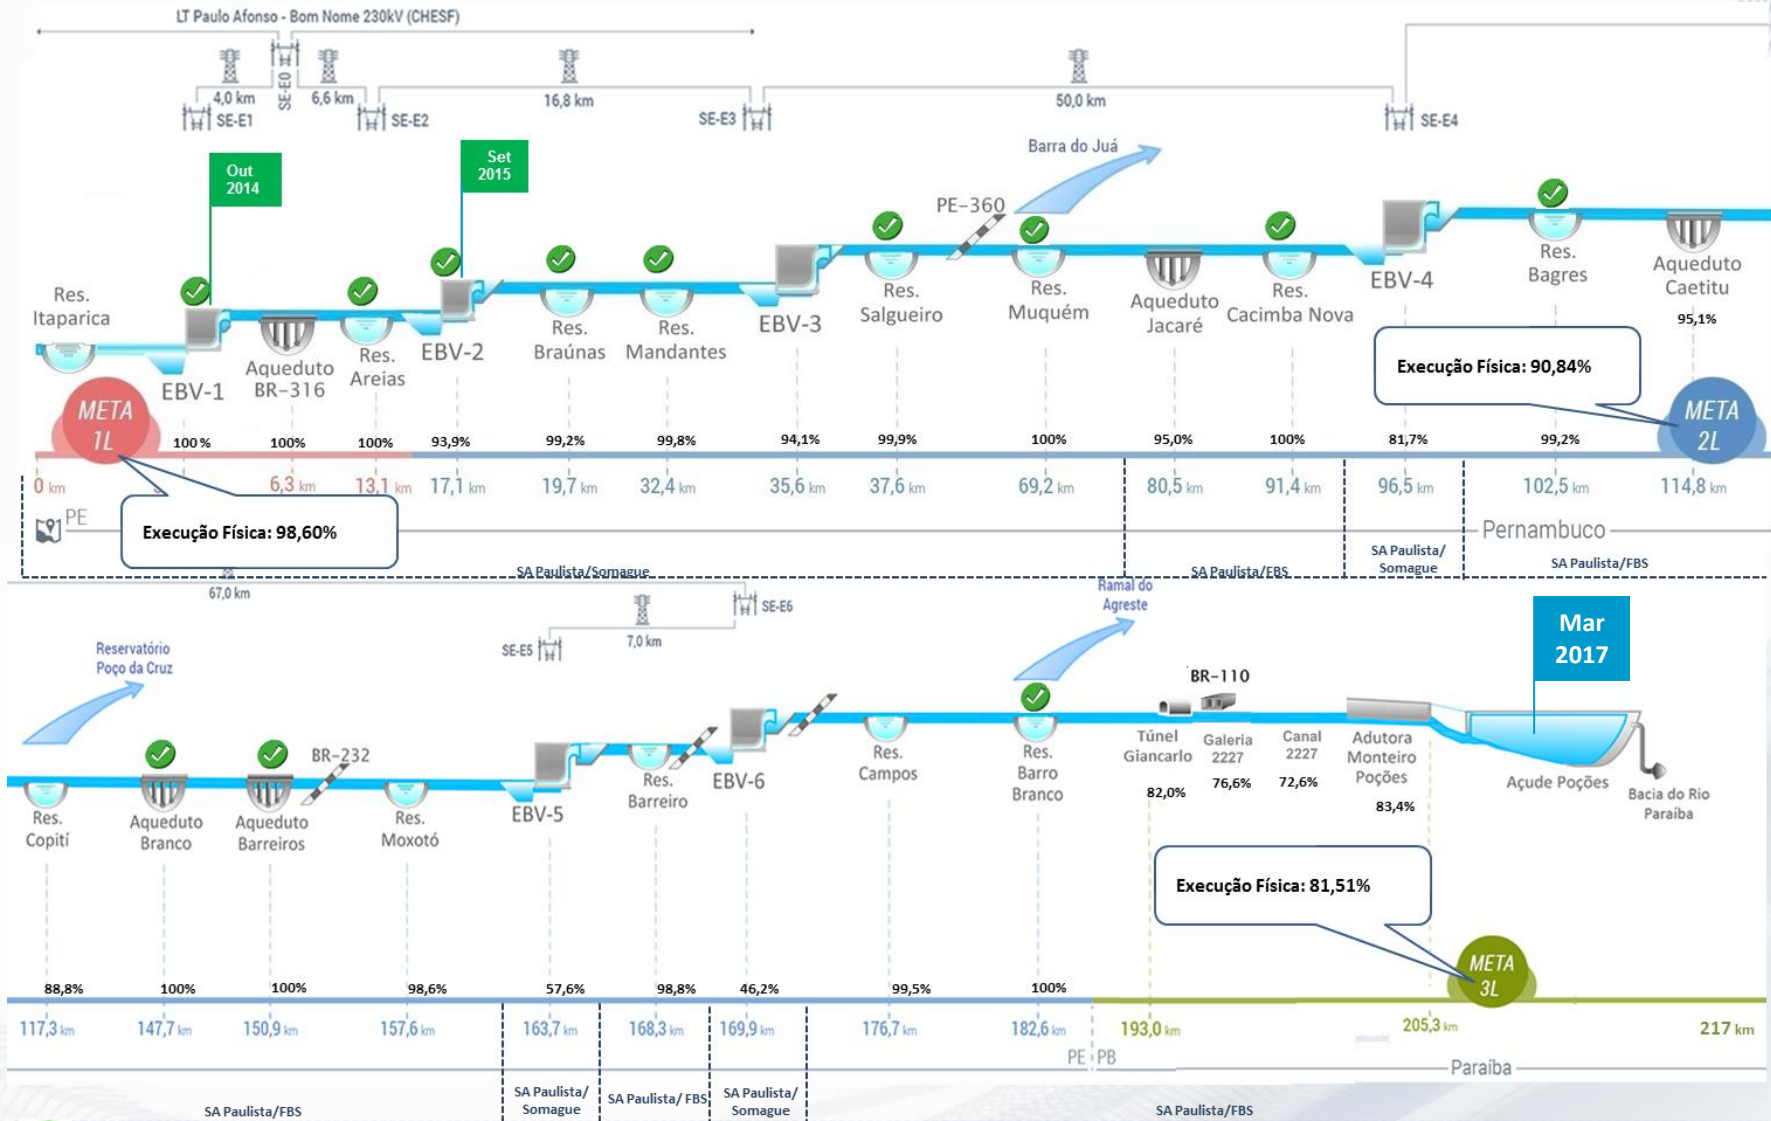

Obra Física Concluída

EIXO LESTE – Meta 1L

98,60% de execução

Executada pela Empresa SA Paulista

Em andamento o comissionamento, com enchimento das estruturas da Meta 1L.

Estação de bombeamento EBV-1 teve início de operação em outubro de 2014, propiciando o enchimento do Reservatório Areias.

EBV-1



Reservatório Areias

Aqueduto BR-316



EIXO LESTE – Meta 2L

90,84% de execução

Executada pela Empresa SA Paulista, com obras em ritmo adequado de execução, contemplando:

- Estações de bombeamento EBV-2, EBV-3, EBV-4, EBV-5 e EBV-6.
- O bombeamento na EBV-2 iniciou em setembro de 2015

Reservatório Salgueiro



Aqueduto Branco



EBV-2

EIXO LESTE – Meta 3L

81,51% de execução

Executada pela Empresa SA Paulista, com obras em ritmo adequado de execução, contemplando:

- Reservatório Barro Branco
- Túnel Giancarlo
- Galeria 2227
- Canal 2227
- Adutora Monteiro



**MUITO
OBRIGADO!**
