

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS

MRS LOGÍSTICA S.A. - MRS


SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

SUFER

Dezembro de 2025

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS


MRS LOGÍSTICA S.A.



A prorrogação antecipada do contrato de concessão da MRS Logística foi qualificada no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e concretizada por meio do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. Com esta prorrogação, a concessionária assume a obrigação de realizar intervenções específicas denominadas Investimentos com Prazo Determinado (IPD).

Durante os primeiros 13 anos do Contrato, a MRS Logística deve concluir 614 investimentos, totalizando cerca de R\$ 5,97 bilhões. Estes investimentos são de caráter obrigatório e devem ser concluídos dentro dos prazos estipulados no Caderno de Obrigações.

CATEGORIAS DE INVESTIMENTOS

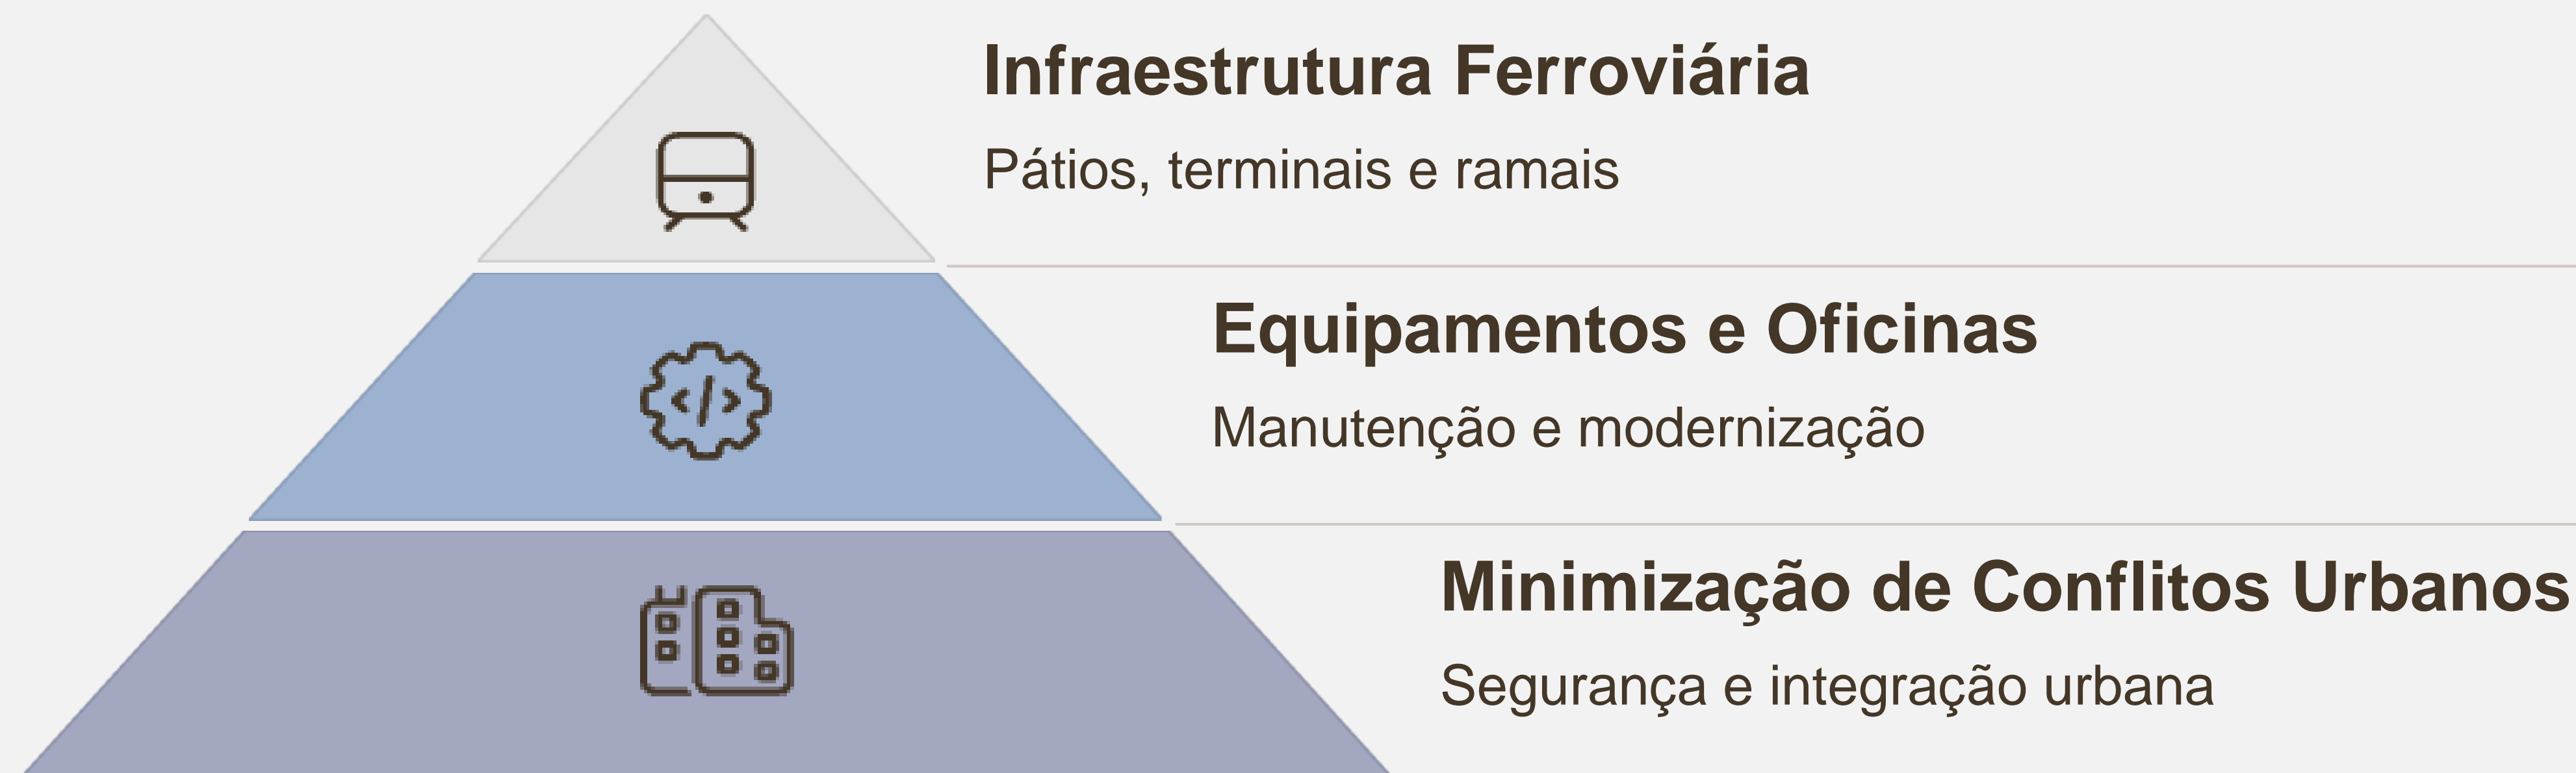

Os Investimentos com Prazo Determinado (IPD) são classificados em 14 grupos distintos, incluindo ampliação, realocação e implantação de pátios de cruzamento, adequação em pátios existentes, implantação de terminais, investimentos em segregações, sistemas ferroviários, modernização de subestações e via permanente, implantação de ramais e complexos de oficinas, aquisição de equipamentos de grande porte e investimentos para minimização de conflitos urbanos.

PANORAMA DOS INVESTIMENTOS EM SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

A MRS Logística S.A. tem um total de 19 investimentos obrigatórios na cidade de São João de Meriti, com um investimento previsto de R\$ 24,64 milhões, sendo todos concentrados na minimização de conflitos urbanos e previstos para serem concluídos em 2025.

TOTAL DE INVESTIMENTOS

- 19 investimentos obrigatórios

INVESTIMENTO PREVISTO

- R\$ 24,64 milhões

Tipo de Investimentos	Total Investimentos	Investimento Previsto	
Viaduto Rodoviário	1	R\$	18.829.729,80
Vedação da Faixa de Domínio	2	R\$	2.640.780,89
Implantar Passagem em Nível com Sinalização	2	R\$	1.092.799,50
Melhorias em Passagem em Nível de Pedestres	14	R\$	2.074.970,32
Total Geral	19	R\$	24.638.280,51

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS EM SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

Investimento	Prazo de Conclusão	Situação	Valor (R\$)
Viaduto Rodoviário no km 024,660	Julho/25	Em execução (73%)	18.829.729,80
Vedação de Faixa de Domínio do tipo Muro entre os km 023,334 e 027,715	Julho/25	Não iniciado	1.257.821,42
Vedação de Faixa de Domínio do tipo Muro entre os km 024,667 e 027,715	Julho/25	Não iniciado	1.382.959,47
Passagem em Nível com Sinalização Ativa no km 026,422	Julho/25	Concluído	546.399,75
Passagem em Nível com Sinalização Ativa no km 027,040	Julho/25	Concluído	546.399,75

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS EM SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

Investimento	Prazo de Conclusão	Situação	Valor (R\$)
Melhorias em Passagem de Nível no km 026,422	Julho/25	Concluído	130.374,44
Melhorias em Passagem de Nível no km 027,040	Julho/25	Concluído	130.374,44
Melhorias em Passagem de Nível no km 023,376	Julho/25	Exclusão	151.185,12
Melhorias em Passagem de Nível no km 024,658	Julho/25	Concluído	151.185,12
Melhorias em Passagem de Nível no km 024,987	Julho/25	Exclusão	151.185,12
Melhorias em Passagem de Nível no km 025,220	Julho/25	Concluído	151.185,12
Melhorias em Passagem de Nível no km 025,463	Julho/25	Concluído	151.185,12

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS EM SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

Investimento	Prazo de Conclusão	Situação	Valor (R\$)
Melhorias em Passagem de Nível no km 025,744	Julho/25	Concluído	151.185,12
Melhorias em Passagem de Nível no km 025,970	Julho/25	Exclusão	151.185,12
Melhorias em Passagem de Nível no km 026,130	Julho/25	Concluído	151.185,12
Melhorias em Passagem de Nível no km 026,540	Julho/25	Concluído	151.185,12
Melhorias em Passagem de Nível no km 026,780	Julho/25	Concluído	151.185,12
Melhorias em Passagem de Nível no km 027,462	Julho/25	Concluído	151.185,12
Melhorias em Passagem de Nível no km 024,160	Julho/25	Não iniciado	151.185,12

MRS LOGÍSTICA S.A. - MRS

INVESTIMENTOS COM NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO

A MRS Logística concluiu 12 investimentos em São João de Meriti/RJ, totalizando R\$ 2,56 milhões, os quais contemplam:

- 2 Passagens em Nível equipadas com Sinalização Ativa
- 10 Passagens em Nível de Pedestres



ANTES: Foto Google Earth de 11/2014 pelo LE da Via Férrea



DEPOIS: Inspeção 103/2025 mesma visada do Google



ANTES: Foto de 10/2014 pelo lado direito da via férrea na Av. Ana Brito da Silva esquina com a Rua Nair



DEPOIS: Inspeção 103/2025 mesma visada do Google

MRS LOGÍSTICA S.A. - MRS

INVESTIMENTOS COM NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO



Antes



Depois



Pavimentação da PN com emprego de placas de Neoprene com nivelamento adequado à segurança de pedestres e veículos.

MRS LOGÍSTICA S.A. - MRS

INVESTIMENTOS COM NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO



LD Foto dez./2024 Google Earth km 27,04 em -22.789072 -43.401602 com elevado momento de circulação



Foto da Inspeção ANTT em 19/08/2025 na mesma visada do Google em 2024 demonstrando recuperação e automação da PN.



Cancela automática Nível 5 de segurança com CWT Constant Warning Time e detecção de velocidade dos trens.

MRS LOGÍSTICA S.A. - MRS

INVESTIMENTOS COM NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO



Foto Google de 03/2023 pelo LE da Via Férrea



Inspeção 103/2025 mesma visada do Google pelo LE



Foto Google Earth de 03/2023 mostrando a PNP antiga pelo LD da ferrovia na Av. Ana Brito da Silva esquina com a Rua Maria Gama



Foto da Inspeção 103/2025 em 15/05/2025 na mesma visada do Google, mostrando não ter sido possível suprimir a PNP anterior.

MRS LOGÍSTICA S.A. - MRS

INVESTIMENTOS COM NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO



Foto de 03/2023 pelo Lado Esquerdo da via férrea na Av. Torres Homem – Google Earth foto de 03/2023



Inspeção 103/2025 mesma visada do Google pelo LE



Foto 05/2019 do Google Earth pelo LD da Via Férrea com a PNP pela Av. Tenente Aviador Nilton Campos Soares com a Av. Dr. Roberto Silveira



Foto da Inspeção 103/2025 em 15/05/2025 na mesma visada do Google

MRS LOGÍSTICA S.A. - MRS

INVESTIMENTOS COM NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO



Antes



Depois

MRS LOGÍSTICA S.A. - MRS

INVESTIMENTO EM EXECUÇÃO

A MRS Logística informa que concluiu 73% do previsto para o **Viaduto Rodoviário** no km 024,660 do Trecho Linha Arará, Rua Bento Siqueira, no valor de R\$ 18,83 milhões.

INVESTIMENTOS NÃO INICIADOS (3)


- Implantação de faixa de domínio entre os km 023,334 e 027,715 do Trecho Arará – previsão de conclusão em jul/28 no valor de R\$ 1.257.821,42
- Implantação de faixa de domínio entre os km 024,667 e 027,715 do Trecho Arará – previsão de conclusão em jul/28 no valor de R\$ 1.382.959,47
- Implantação de melhoria em Passagem em Nível de Pedestres no km 024,160 do Trecho Arará, São Mateus – previsão de conclusão em mai/26 no valor de R\$ 151.185,12

INVESTIMENTOS COM PROPOSTA DE EXCLUSÃO (3)

- Implantação de melhoria em Passagem em Nível de Pedestres no km 023,376 do Trecho Arará, Bairro Tomazinho
- Implantação de melhoria em Passagem em Nível de Pedestres no km 024,987 do Trecho Arará, Rua Dr. Luiz Sobral
- Implantação de melhoria em Passagem em Nível de Pedestres no km 025,970 do Trecho Arará, Rua Imperatriz Leopoldina
- Todos os investimentos possuem valor contratual de R\$ 151.185,12

MRS LOGÍSTICA S.A. - MRS

Impacto dos Investimentos para São João do Meriti/RJ

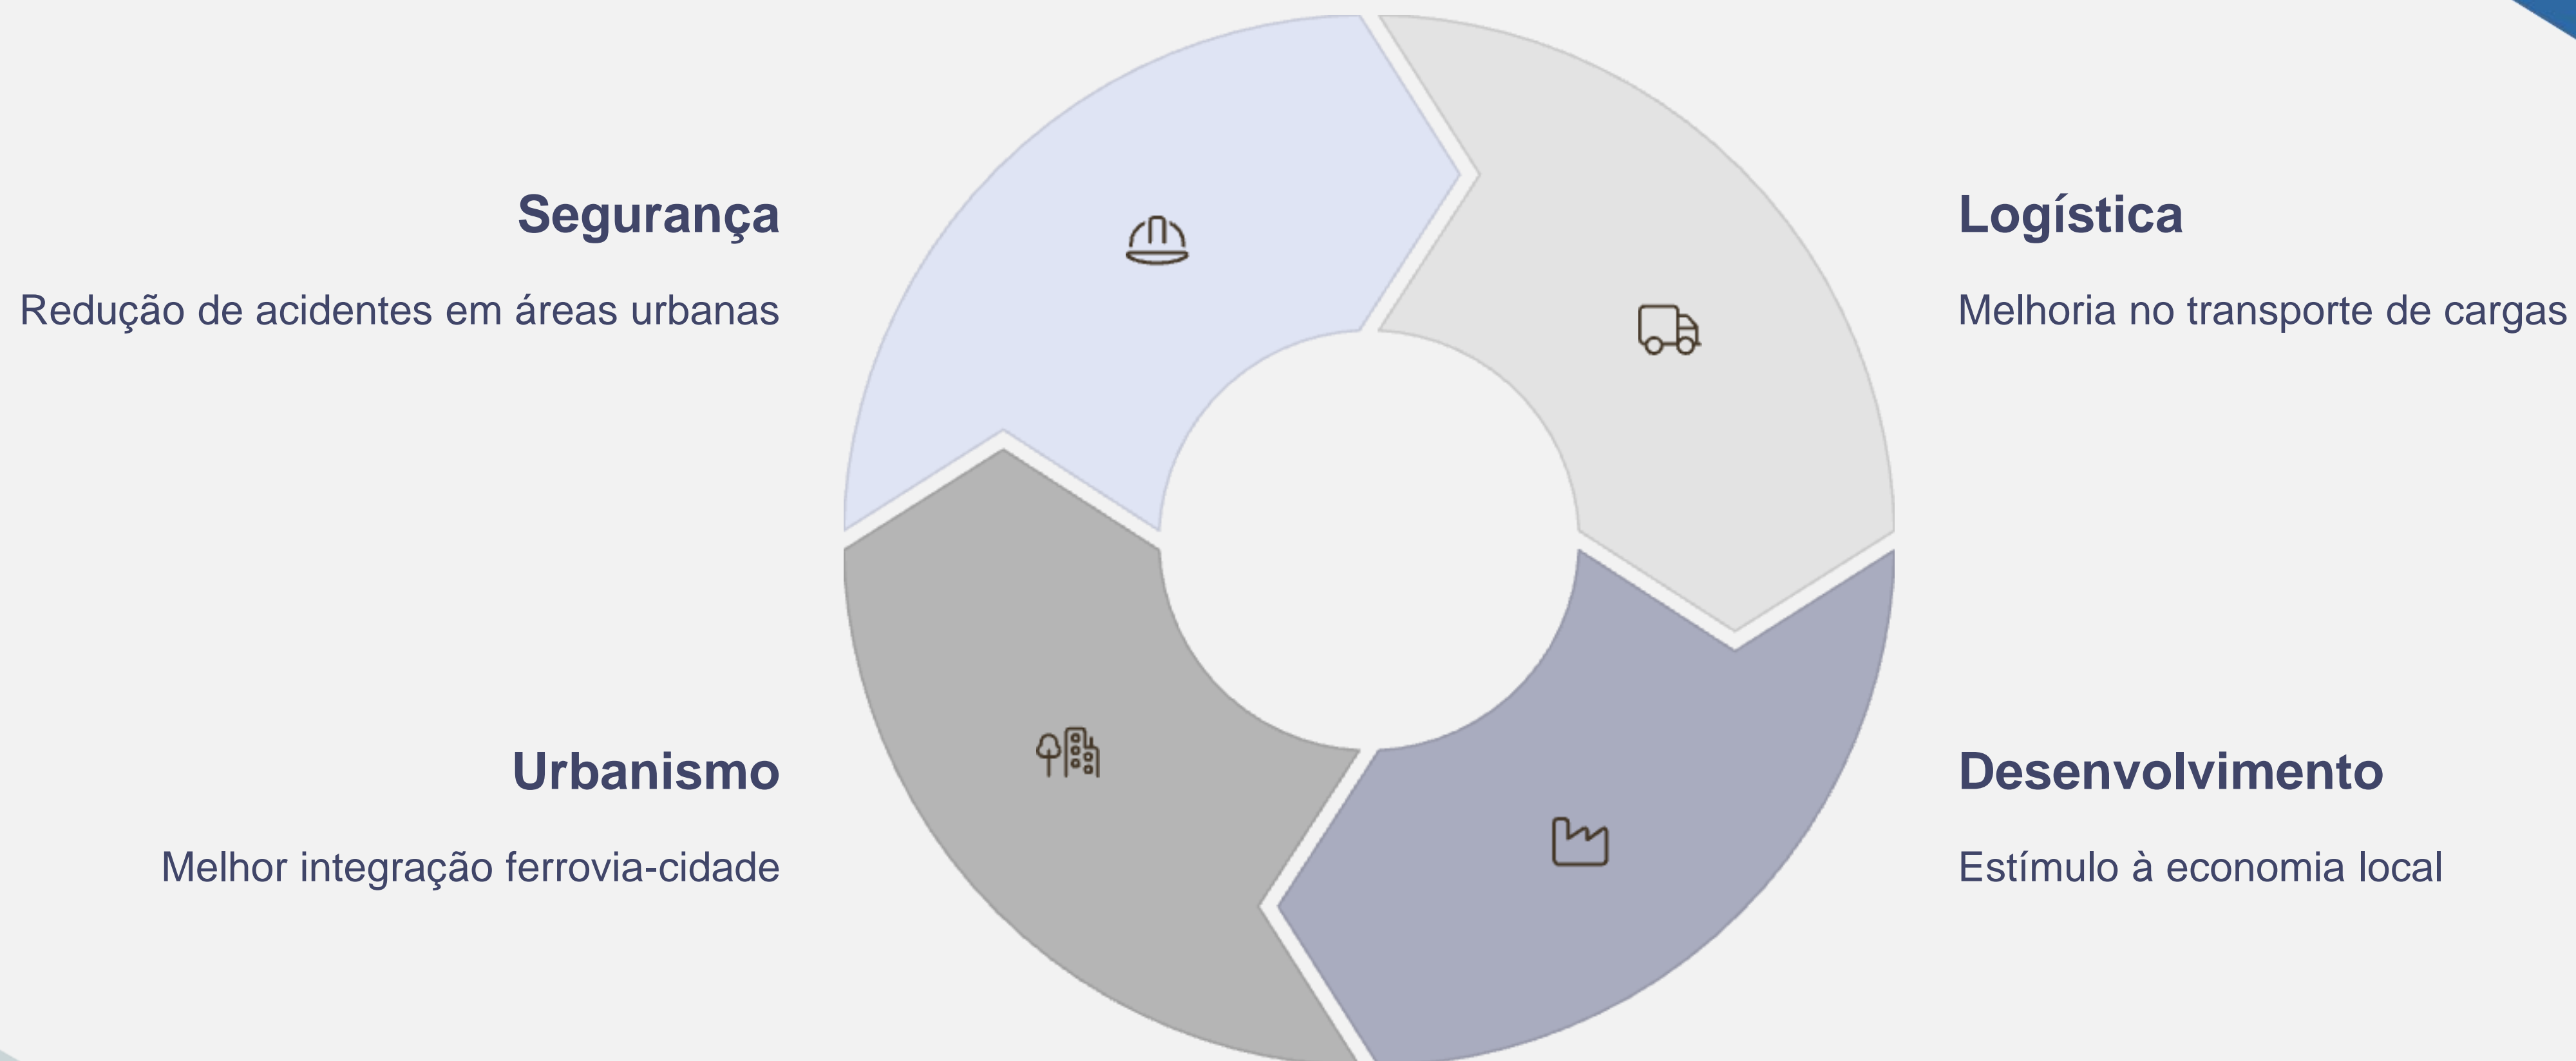

Os investimentos obrigatórios da MRS Logística em São João de Meriti/RJ representam um importante avanço para a infraestrutura ferroviária da cidade. Com foco na minimização de conflitos urbanos, os projetos contribuem para aumentar a segurança nas interfaces entre a ferrovia e as cidades, melhorar a eficiência logística e promover o desenvolvimento econômico regional.

Obrigado!
SUFER
