



# MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL



## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA





## COMPETÊNCIA DE ATUAÇÃO

- 19** PORTOS PÚBLICOS NAS 7 CIAS DO CAS + CODOMAR
- 18** PORTOS DELEGADOS
- 39** PORTOS FLUVIAIS



**R\$ 8,3 bilhões**



## OBRAS CONCLUÍDAS

**R\$ 2,9 bilhões**

- Dragagem: R\$ 1,2 bilhão
- Infraestrutura: R\$ 1,7 bilhão



## OBRAS EM ANDAMENTO

**R\$ 2,2 bilhões**

- Dragagem: R\$ 1,2 bilhão
- Infraestrutura: R\$ 1,0 bilhão



## PAC COPA

**R\$ 698 milhões**

- Terminais de Passageiros
- Alinhamentos de Cais



## OBRAS A INICIAR – 2016-2019

**R\$ 2,5 bilhões**

- Dragagem: R\$ 1,1 bilhão
- Infraestrutura: R\$ 1,4 bilhão

## DRAGAGEM

### Em andamento

- ✓ Vitória - ES (42% dragagem e 95% derrocamento)
- ✓ Rio de Janeiro-RJ
- ✓ Paranaguá-PR
- ✓ Rio Grande – RS

### Contratado

- ✓ Santos -SP

### Convênio

- ✓ Cabedelo-PB

### Em licitação (PND II)

- ✓ Itajaí-SC

### A Licitar – ação preparatória

- ✓ Maceió - AL
- ✓ Fortaleza – CE

## OBRAS

### Em andamento

- ✓ Itajaí-SC (88%)
- ✓ Santos-SP – Macuco/Ponta da Praia
- ✓ Rio Grande - RS (58%)
- ✓ Santos-SP – 12A ao 23 (60%)
- ✓ Vitória - ES – Dolphins do Atalaia (65%)
- ✓ Fortaleza-CE-Terminal Contêineres (80%)
- ✓ Salvador – BA – Quebramar (1,5%)

### Contratada

- ✓ Santos-SP – Outeirinhos (1ª fase concluída – contrato suspenso)
- ✓ Reforço do cais em Recife

### Estudos/Projetos

- ✓ Apoio à análise EVTEA/Projetos
- ✓ TC Porto Velho-RO
- ✓ Sistema de Custos
- ✓ Revitalização do Porto de Belém-PA

# PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS CONSOLIDADO



## VITÓRIA – ES DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO

- Investimento: R\$ 132 mi
- Início: 03/07/2012
- Conclusão: 03/10/2016
- Dragagem: 25% em execução
- Derrocagem: 81% em execução



## RIO DE JANEIRO – RJ DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO

- Investimento: R\$ 236,9 mi
- Início: 17/02/2015
- Conclusão: 17/02/2017
- Obras: iniciadas (12% executados)



## RIO GRANDE – RS DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO

- Investimento: R\$ 387,1 mi
- Início: 10/09/2015
- Conclusão: 30/01/2017
- Projetos: concluídos
- Obras: não iniciadas

# PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS CONSOLIDADO



CONTRATO SUSPENSO

## PARANAGUÁ – PR

*DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO*

- Investimento: R\$ 412,3 mi
- Início: 03/12/2015
- Conclusão: 03/09/2017
- Projetos: concluídos
- Obras: não iniciadas



CONTRATADA

## SANTOS – SP

*DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO*

- Investimento: R\$ 390 mi
- Início: 10/04/2016
- Conclusão: 29/09/2017
- Contrato assinado



CONVÊNIO EM ANDAMENTO

## CABEDELO – PB

*Sinalização Náutica e Balizamento*

- Investimento: R\$ 3 mi
- Início: 30/08/2015
- Conclusão: 30/08/2017
- Convênio: em execução

# PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS CONSOLIDADO – PORTOS DELEGADOS



EM ANDAMENTO

## **PORTO DE ITAJAÍ – ES** *ALINHAMENTO E REFORÇO - BERÇO 4*

- Investimento: R\$ 161 mi
- Início: 20/02/2014
- Conclusão: 30/03/2017
- Obra: 88% executados



EM ANDAMENTO

## **PORTO RIO GANDE – RS** *CONSTRUÇÃO DE 1.125 m DE CAIS*

- Investimento: R\$ 120 mi
- Início: 06/08/2014
- Conclusão: 30/06/2017
- Obra: 58% executados



EM ANDAMENTO

## **PORTO VELHO – RO** *MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO*

- Investimento: R\$ 27 mi
- Início: 01/07/2014
- Conclusão: 31/12/2016
- Convênio: em execução

# PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS CONSOLIDADO – CIA DOCAS



## PORTO DE SANTOS – SP

ALINHAMENTO DO CAIS DE  
OUTEIRINHOS


- Investimento: R\$ 315 mi
- Início: 31/08/2012
- Conclusão: 30/12/2015 1ª fase
- Obra: 100% 1ª fase (779m = R\$ 311 mi) – 2ª fase restrição orçamentária



## PORTO DE SANTOS – SP

REFORÇO DE CAIS – 12 ao 23

- Investimento: R\$ 250 mi
- Início: 01/10/2014
- Conclusão: 01/08/2016
- Obra: 64% executados



## PORTO DE VITÓRIA – ES

DOLFINS DO ATALAIA

- Investimento: R\$ 140 mi
- Início: 14/07/2014
- Conclusão: 20/11/2016
- Obra: 70% executados


# PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS CONSOLIDADO – CIA DOCAS



## PORTO DE FORTALEZA-CE

### PAVIMENTAÇÃO TERMINAL CONTÊINERES

- Investimento: R\$ 32,5 mi
- Início: 02/03/2012
- Conclusão: 30/09/2016
- Obra: 76,4% executados

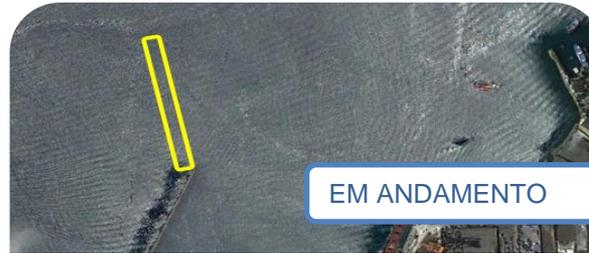

## PORTO DE SALVADOR-BA

### AMPLIAÇÃO DO QUEBRAMAR

- Investimento: R\$ 135 mi
- Início: 03/02/2016
- Conclusão: 03/08/2017
- Obra: 9% executados




## PORTO DE SANTOS – SP

### AV. PERIMETRAL MD

- Investimento: R\$ 110 mi
- Início: 13/02/2016
- Conclusão: 13/08/2018
- Obra: mobilização de canteiro

# PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS A LICITAR

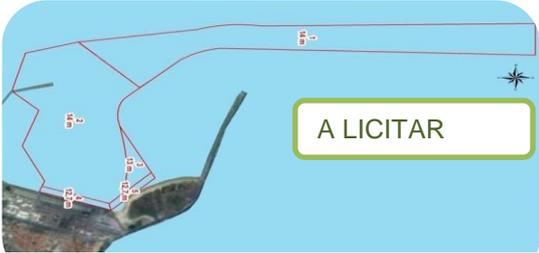

**FORTALEZA – CE**  
*DRAGAGEM*

- Investimento: R\$ 32 mi
- Início: 01/02/2017
- Conclusão: 01/02/2018



**MACEIÓ – AL**  
*DRAGAGEM*

- Investimento: R\$ 113,5 mi
- Início: 02/01/2017
- Conclusão: 01/02/2018



**ITAJAÍ - SC**  
*DRAGAGEM*



- Investimento: R\$ 67,1 mi
- Início: 01/02/2017
- Conclusão: 01/05/2017

# EMPREENDIMENTOS A INICIAR – ATÉ 2019

EMPREENDIMENTOS	R\$ MILHÕES
Dragagem, Sinalização e Balizamento em Portos – Recife e Suape/PE e Itaguaí/RJ	615,0
Dragagens de manutenção nos Portos Públicos	85,0
Implantação da Avenida Perimetral Portuária Porto de Santos - Município de Guarujá - SP	360,0
Expansão do Molhe de Proteção do Porto de Fortaleza - CE	60,0
Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro - RJ	190,0
Ampliação do Terminal de Granéis Líquidos – TGL, no Porto de Aratu - BA	150,0
Construção 1 Píer com 2 berços e ponte de acesso Terminal Alamoá Porto de Santos-SP	198,0
Construção de Edificação para Recepção de Passageiros do Porto de Maceió - AL	20,0
Adequação instalações de acostagem, movimentação e armazenagem Porto de Recife-PE	160,0
Construção do Porto de Marabá - No Município de Marabá - PA	25,0
Implantação do Terminal Marítimo Offshore do Pará - PA	3,0
Reforço, recuperação e realinhamento do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro-RJ	190,0
Recuperação e duplicação das vias de acesso, recuperação de estruturas de acostagem e instalação de defensas no Porto de Vila do Conde - PA	80,0
Construção de rampa rodofluvial em Outeiro - Porto de Belém - PA	8,0



### RESTRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

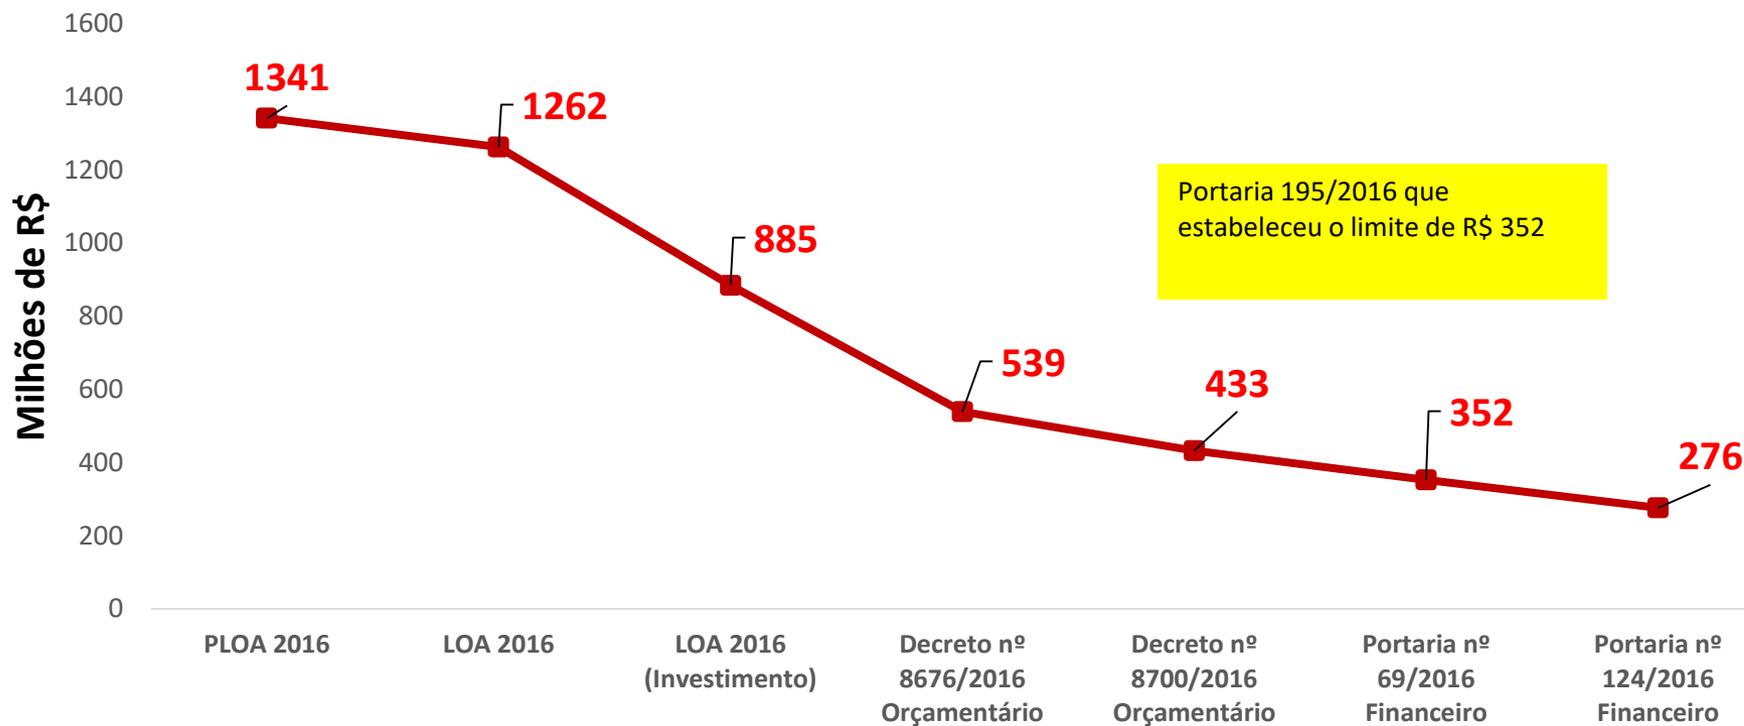

# OBRIGADO!



**SECRETARIA DE PORTOS**  
**Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil**

