


AUDIÊNCIA PÚBLICA

BR-367/MG


Requerimento nº 548/2018: Deputado Zé Silva – SD/MG

Maio/2018



SITUAÇÃO DA RODOVIA BR-367/MG

DNIT

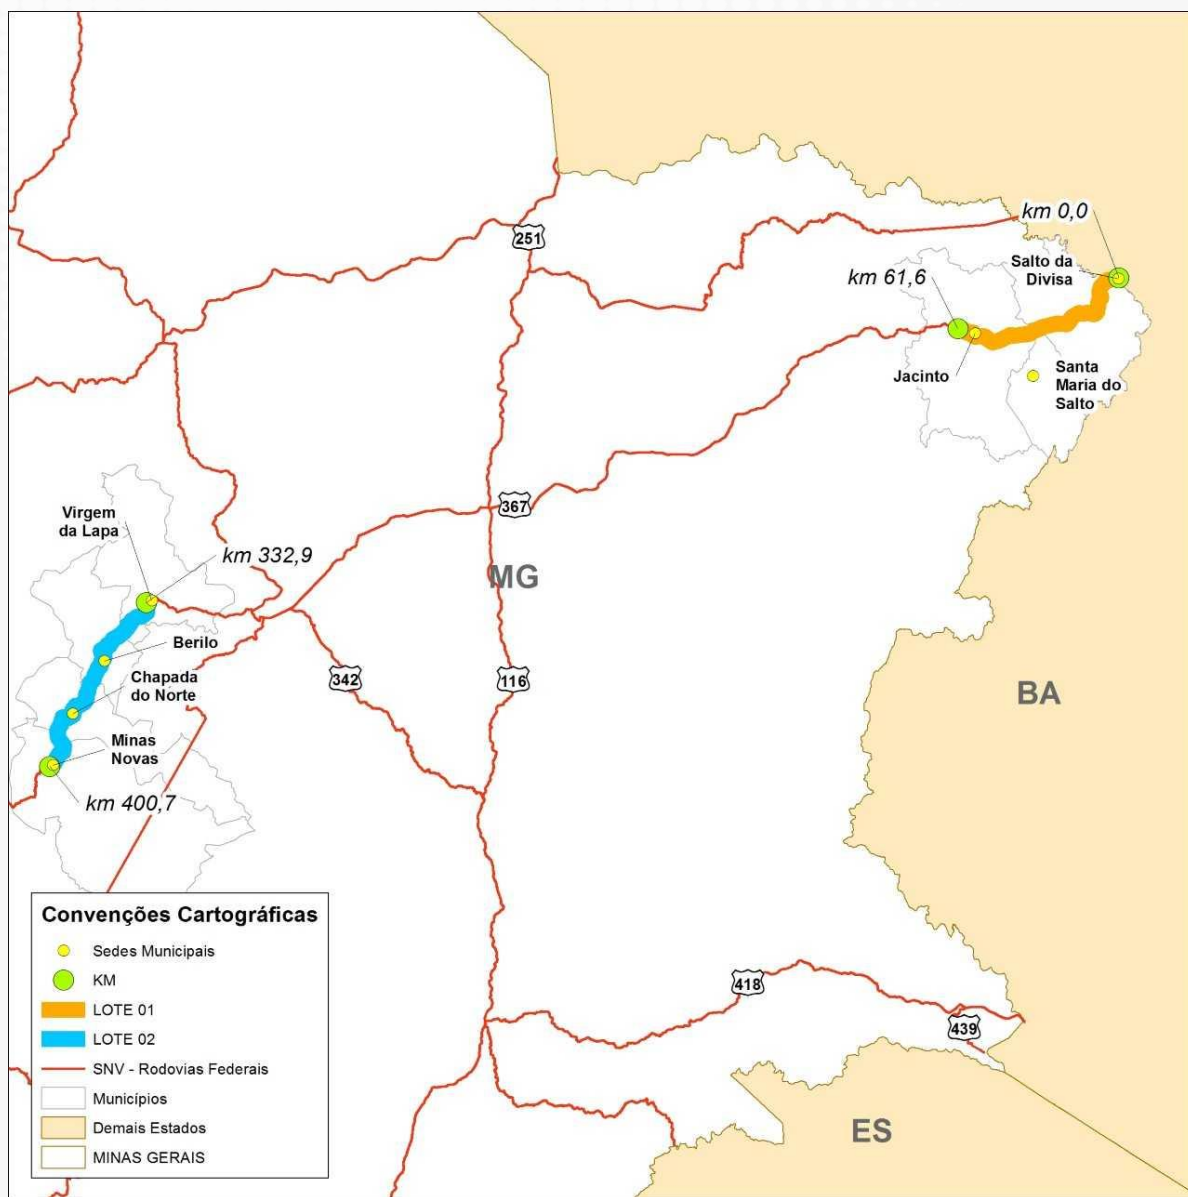

Audiência Pública:

- Discussão acerca da situação da BR-367/MG nos trechos: SALTO DA DIVISA – JACINTO; JACINTO – ALMENARA; VIRGEM DA LAPA - MINAS NOVAS; IJICATU - VIRGEM DA LAPA


CONSTRUÇÃO: Lotes 01 E 02

- A rodovia, no estado de Minas Gerais, encontra-se asfaltada em quase toda a sua extensão, à exceção dos segmentos:
 - km 0,0 e 61,6 (**Lote 1**)
 - km 332,9 e 392,6 (**Lote 2**).


CONSTRUÇÃO

BR-367/MG

Maio/2018




BR-367/MG – Lote 1

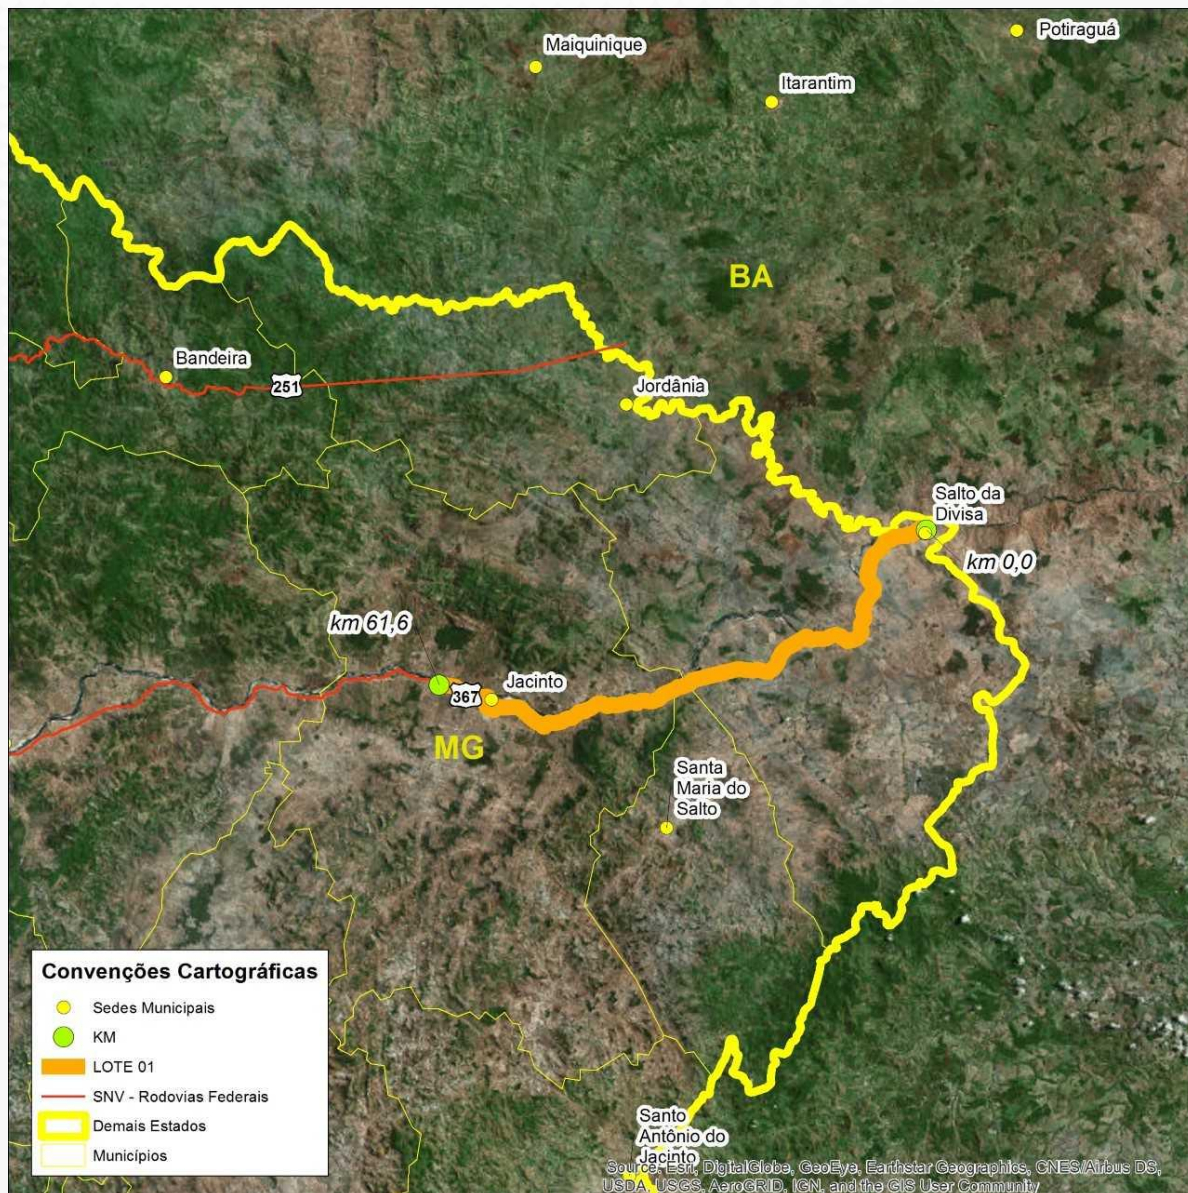

EDITAL 0021/18 – CONSTRUÇÃO LOTE 01 (Salto da Divisa - Jacinto) KM 0,0 ao KM 61,6

- O aviso de abertura da licitação foi **publicado no DOU em 2 de fevereiro** de 2018, informando a data de abertura das propostas para 06 de Março de 2018.
- No dia **05 de março** de 2018 foi publicado o **Aviso de Adiamento**, devido à tempo hábil para respostas de muitas diligências de licitantes ao DNIT, com nova data para 20/04/2018.
- Em **19 de abril** de 2018, um segundo **Aviso de Adiamento** foi publicado no dia, tendo em vista **as alterações ocorridas no Projeto Executivo**, adiando a abertura para o dia 22/05/2018.


BR-367/MG – Lote 1

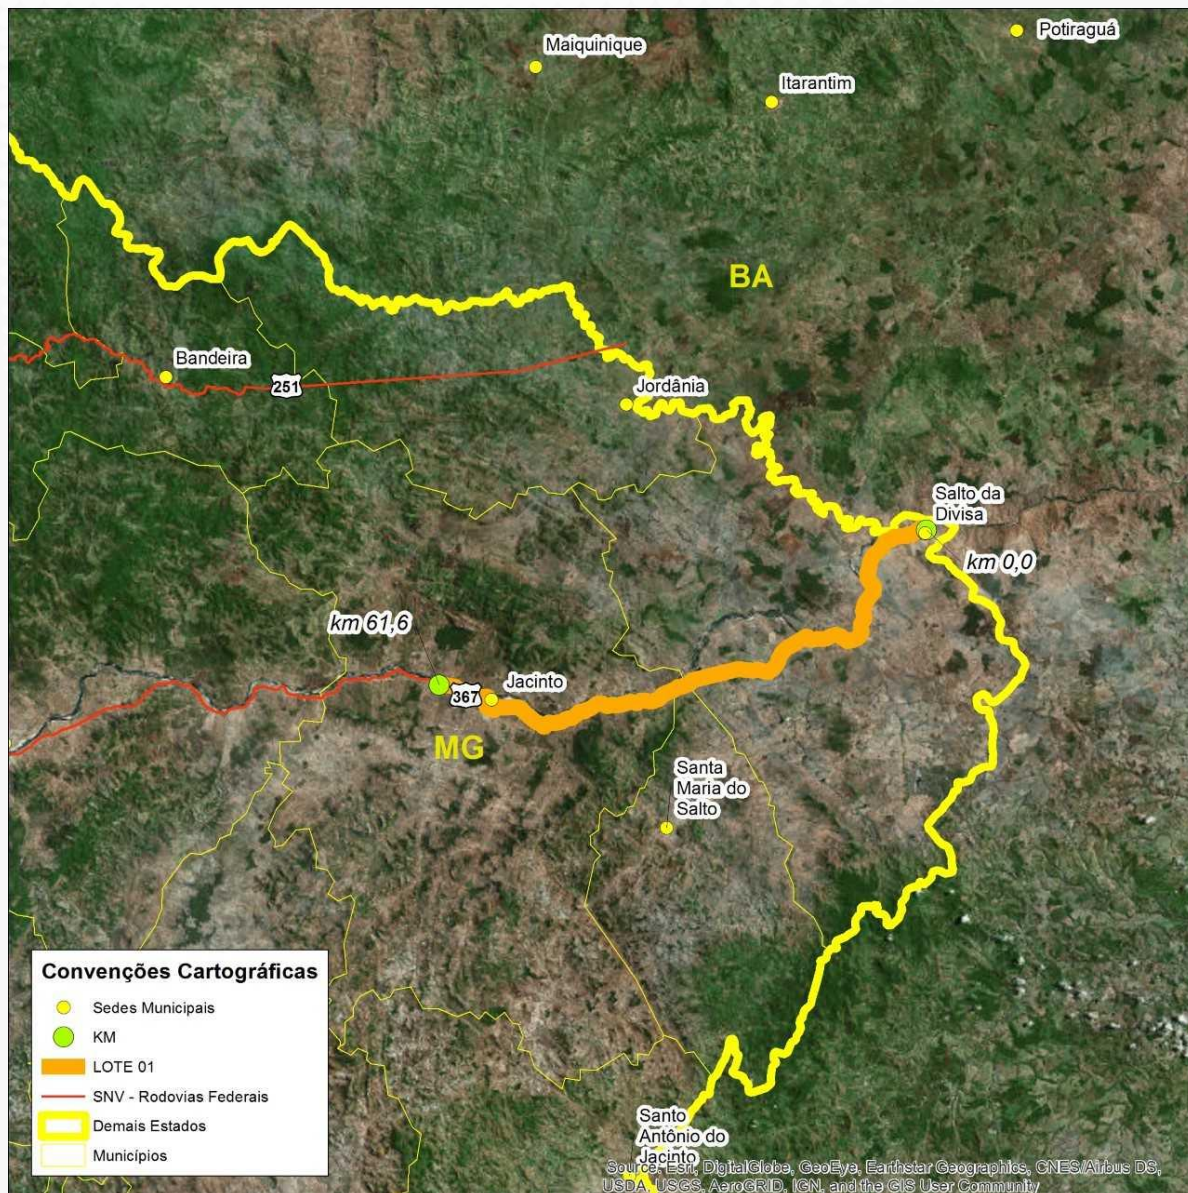

EDITAL 0021/18 – CONSTRUÇÃO LOTE 01 (Salto da Divisa - Jacinto) KM 0,0 ao KM 61,6

- **Objeto:** Contratação de empresa para a execução das obras de implantação e pavimentação na BR-367/MG, trecho Divisa BA/MG (Salto da Divisa) – Entrº BR-259(B) (Gouveia), subtrecho - Entrº BR-251 (Salto da Divisa) – Entrº MG-406 (Almenara), segmento km 0,0 – km 61,6, com extensão de 61,6 km.
- **Modalidade:** RDC Preço Global;
- **Valor Administração:** R\$ 191.313.954,43;
- **O empreendimento possui LP e LI emitidas pela SEMAD, vigentes até 26/07/2023.**
- De acordo com o Termo de Referência, após a assinatura do contrato, a **vigência contratual é de 30 meses** (900 dias consecutivos).
- **Há LOA 2018 disponível ao valor de R\$ 40.096.884,00.**

BR-367/MG – Lote 1 - PROJETO

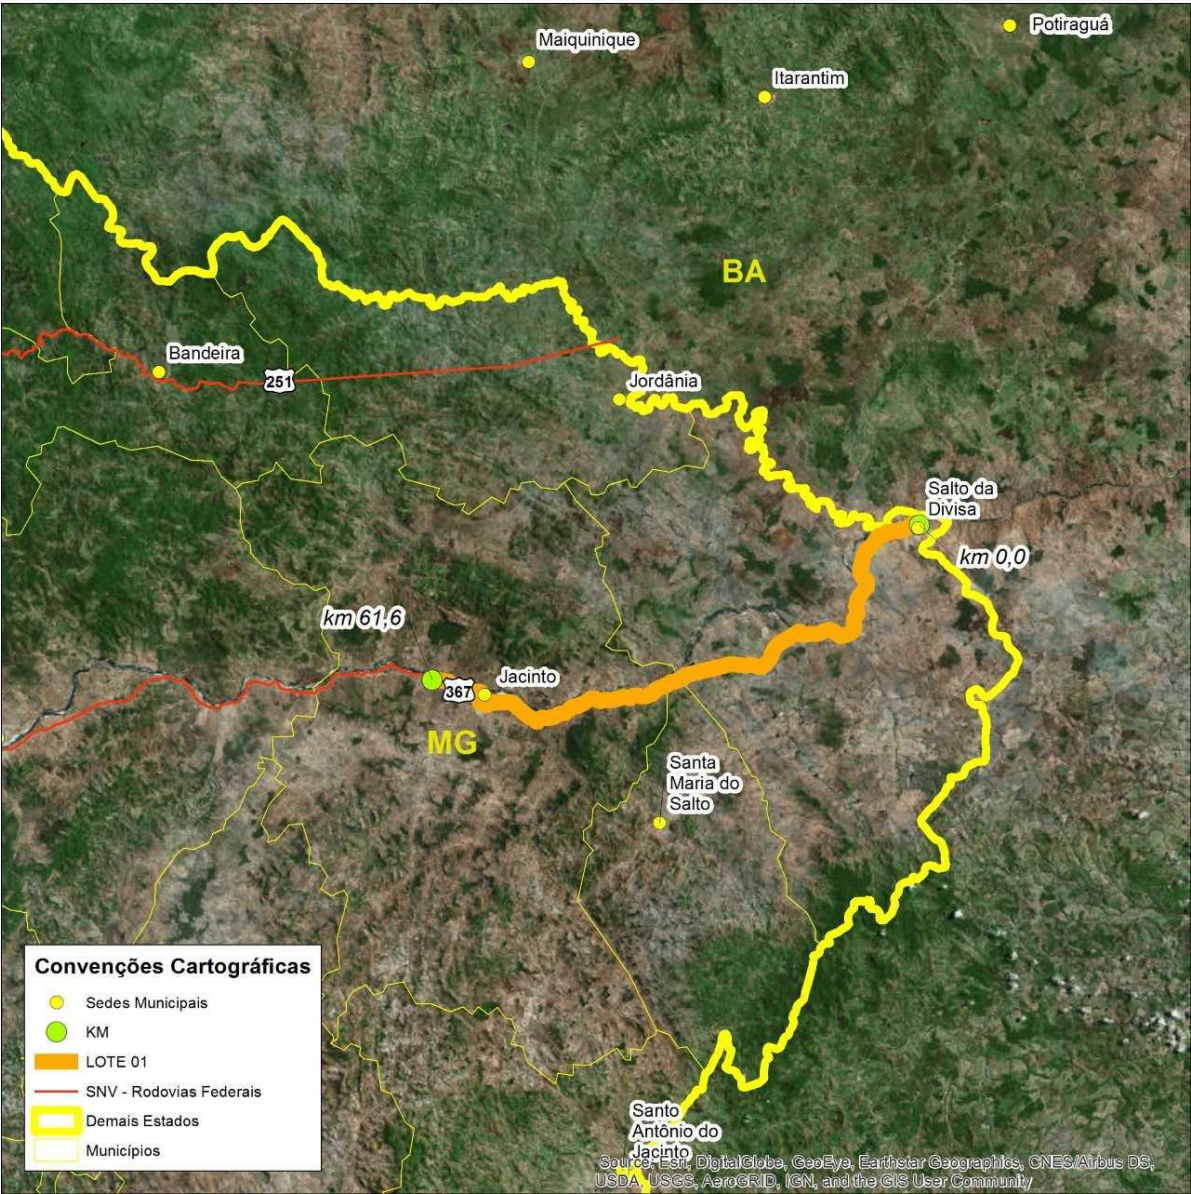


- O segmento objeto do Edital inicia-se na divisa MG/BA, próximo à cidade de Salto da Divisa e termina 10 km após a cidade de Jacinto.
- Seção transversal: duas faixas de rolamento de 3.60 metros, acostamentos de 2,50 metros e 1,0 metro em cada lateral para acomodar os dispositivos de drenagem superficial.

Córrego	Estaca inicial	Estaca final	Extensão (m)
Padre	228+3,31	231+3,31	60
Piabanha	735+18,88	737+18,88	40
Lapa	930+7,06	932+7,06	40
Enxadao (*)	1529+13,14	1535+1,14	108
Areinha	2131+3,93	2133+3,93	40
Enxadinha	2264+1,15	2267+1,15	60
Jacinto	2570+3,92	2573+3,92	60


(*) Existente, a ser alargada

Camada	Material	Espessura	Especiifcação
Revestimento	CBUQ fx "C"	5 cm	DNIT 031/2006-ES
	CBUQ fx "B"	5 cm	DNIT 031/2006-ES
Base	Mistura solo (20%) + brita (80%)	15 cm	DNIT 141/2010-ES
Sub-base	Saibro - Jazida J-02	15 cm	DNIT 139/2010-ES
Subleito	ISC ≥ 8% e exp. < 2,00%	-	DNIT 137/2010-ES

BR-367/MG – Lote 2

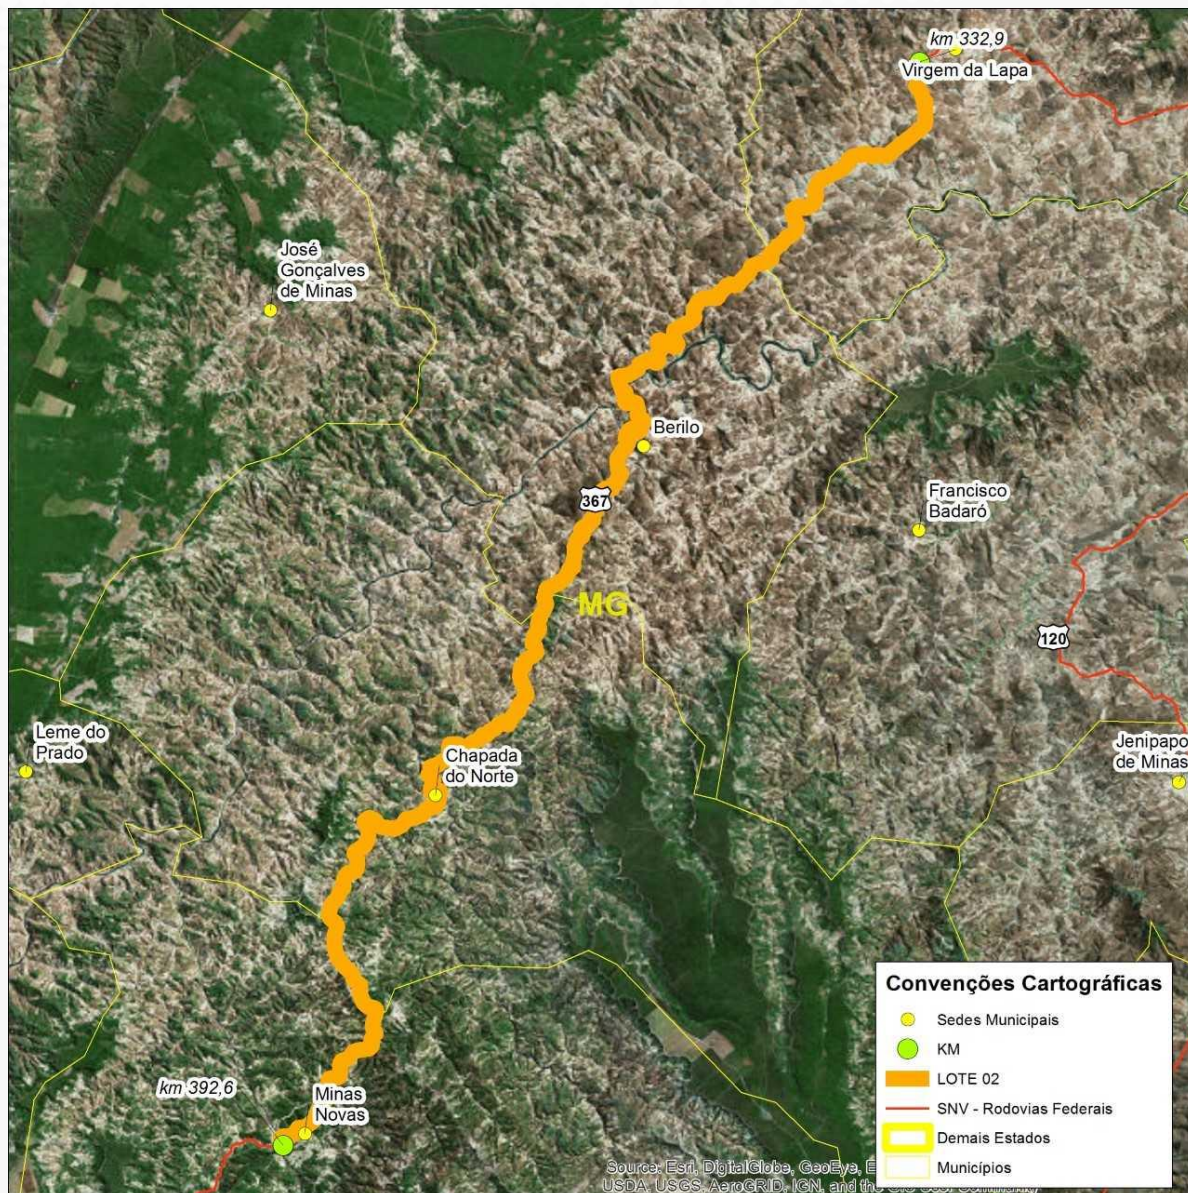

CONSTRUÇÃO LOTE 02 (Virgem da Lapa – Minas Novas) KM 332,0 ao KM 392,6

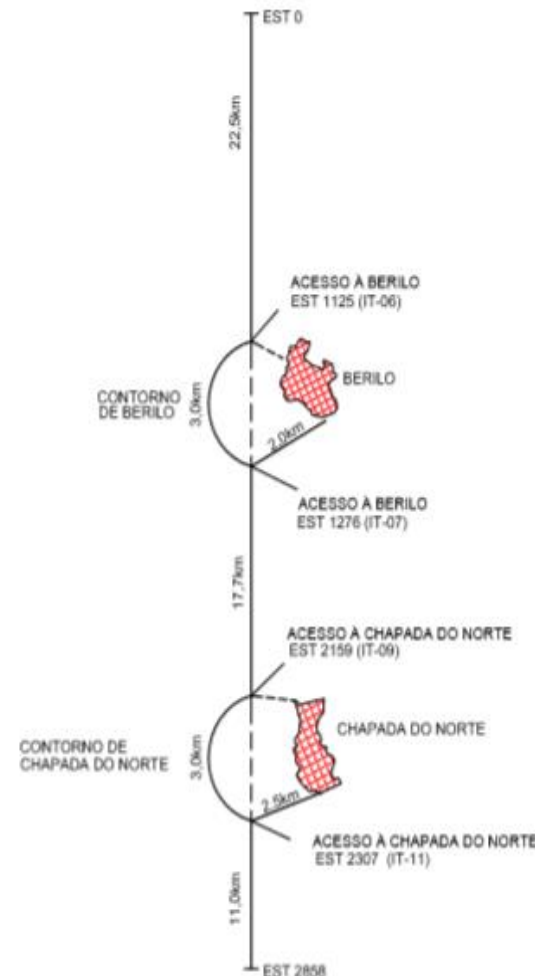

- O orçamento do projeto Básico está sendo atualizado para ser licitado pela modalidade de RDC preço Global. Planeja-se concluir os ajustes necessários em 2018.


OBRAS DE ARTE ESPECIAIS:


- ✓ PONTE SOBRE O RIO ARAUAÍ
- ✓ PONTE SOBRE O CÓRREGO BARBOSA
- ✓ PONTE SOBRE O RIBEIRÃO GANGORRAS
- ✓ PONTE SOBRE O RIO CAPIVARI
- ✓ PONTE SOBRE O CÓRREGO ÁGUA SUJA
- ✓ PONTE SOBRE O CÓRREGO BEM QUERER

MANUTENÇÃO

BR-367/MG

Maio/2018



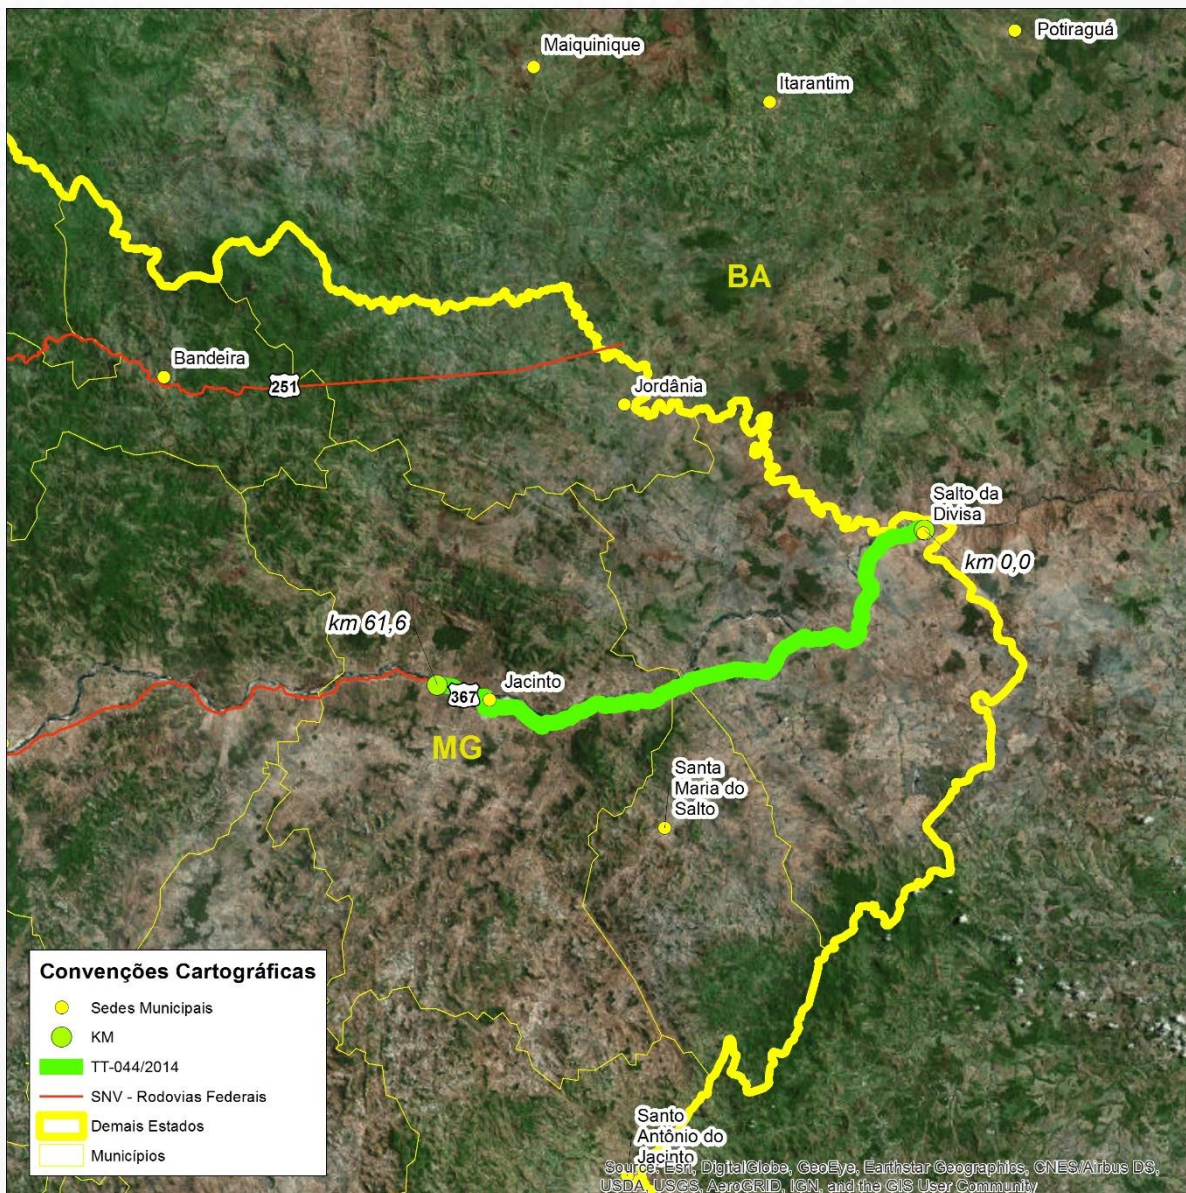


MANUTENÇÃO (Salto da Divisa – Jacinto) KM 0,0 ao KM 61,6

Contrato: 044/2014

Vigência: 26/03/2014 à 02/07/2018

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

- **Objeto do Contrato:** Conservação de trecho não pavimentado na Rodovia BR-367/MG (Trecho entre Salto da Divisa e Jacinto).
- **Orçamentário e Financeiro:**
 - Plan. Investimentos 2018: R\$ 3.396.582,08
 - Valor Contratado: R\$ 15.610.798,95
 - Total Executado: R\$ 12.911.723,48
 - Saldo de Recursos disponível: R\$ 2.375.337,86.

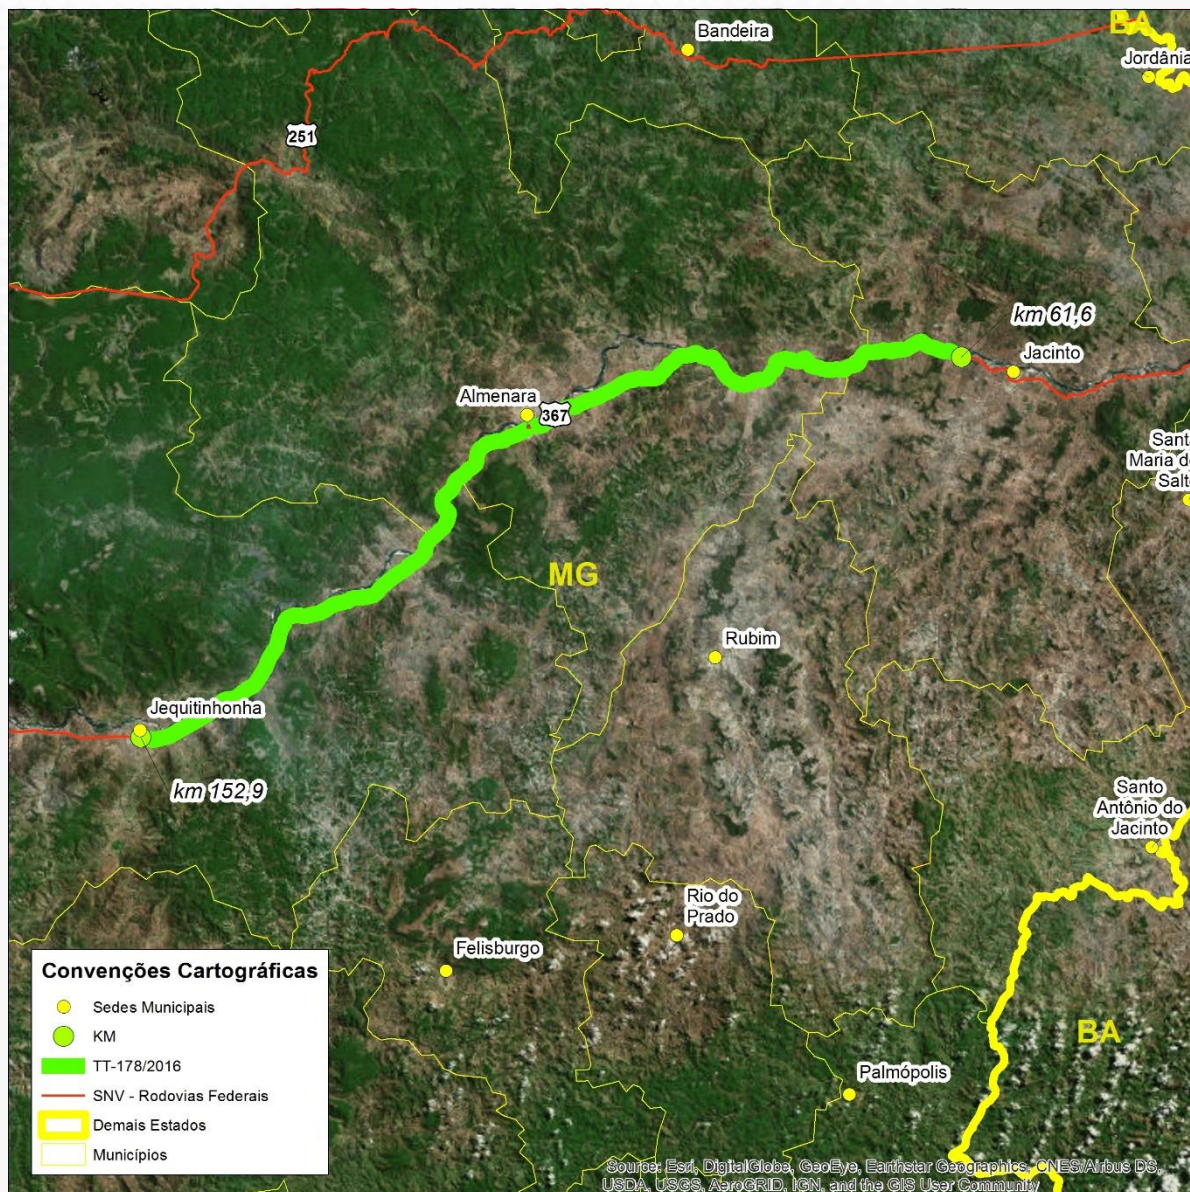


MANUTENÇÃO (Jacinto – Almenara) KM 61,6 ao KM 152,9

Contrato: 178/2016

Vigência: 13/04/2016 à 12/04/2019

LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A

- **Objeto do Contrato:** Conservação na Rodovia BR-367-MG (Trecho entre Jacinto e Almenara).
- **Orçamentário e Financeiro:**
 - Plan. Investimentos 2018: R\$ 2.746.008,45
 - Valor Contratado: R\$ 10.388.860,07
 - Total Executado: R\$ 4.846.008,45
 - Saldo de Recursos disponível: R\$ 2.424.657,55
- Existe um **projeto de Recuperação do pavimento concluído** para o trecho e em ajustes burocráticos na regional de Minas;

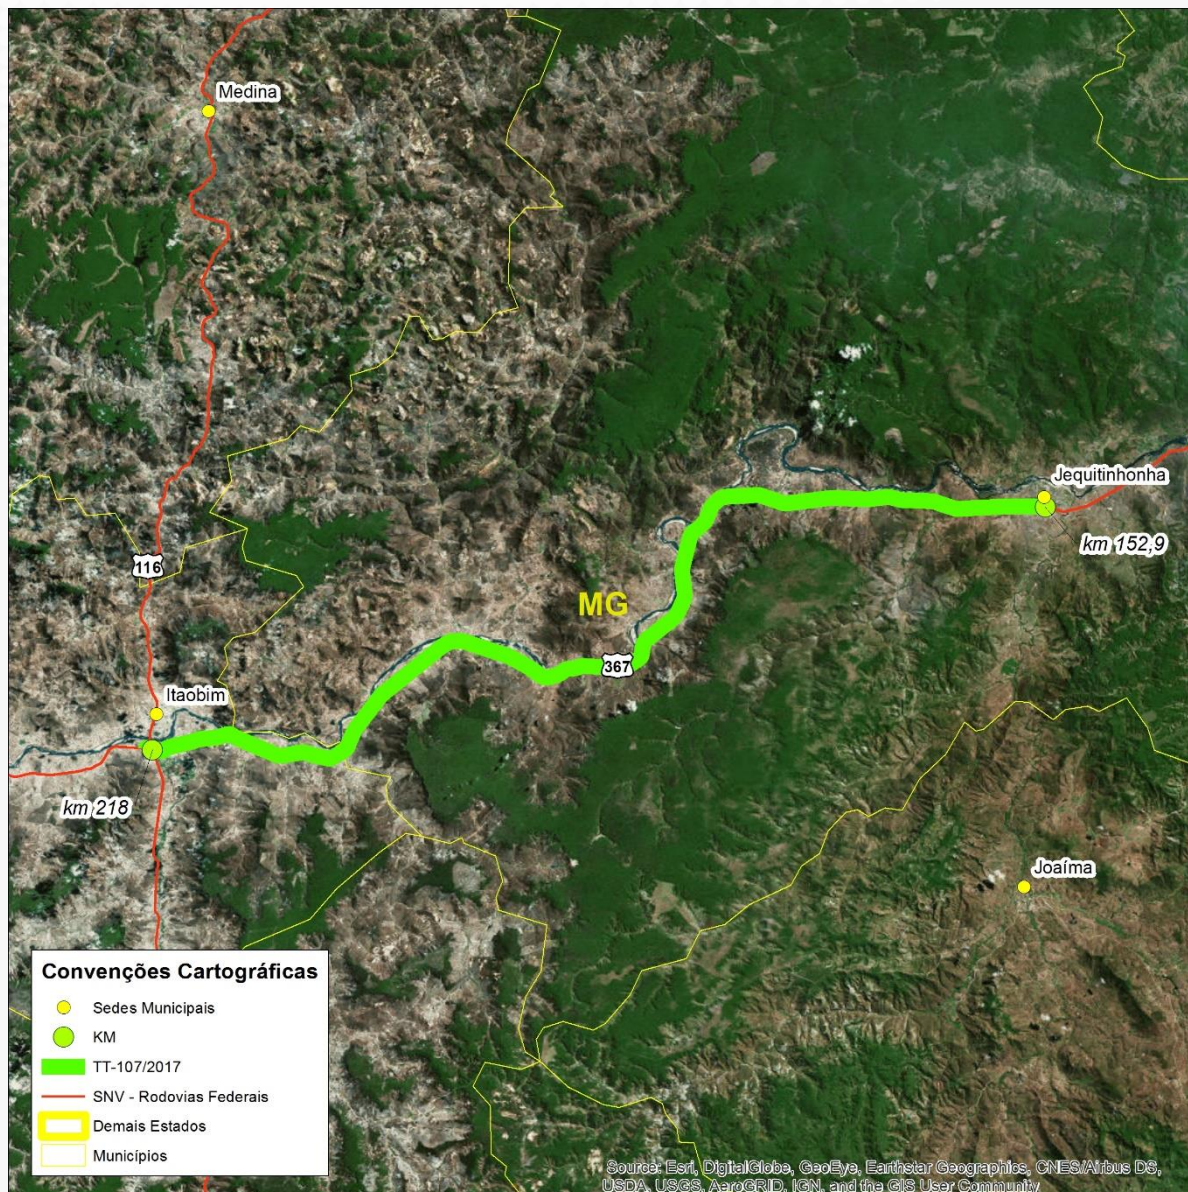


MANUTENÇÃO (Jequitinhonha – Itaobim) KM 152,9 ao KM 217,6

Contrato: 107/2017

Vigência: 01/03/2017 a 28/02/2019

GUAXIMA ENGENHARIA LTDA

- **Objeto do Contrato:** Serviços de manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-367/MG.
- **Orçamentário e Financeiro:**
 - Plan. Investimentos 2018: R\$ 4.988.125,47
 - Valor Contratado: R\$ 5.559.504,36
 - Total Executado: R\$ 5.442.006,06
 - Saldo de Recursos disponível: R\$ 2.429.875,41

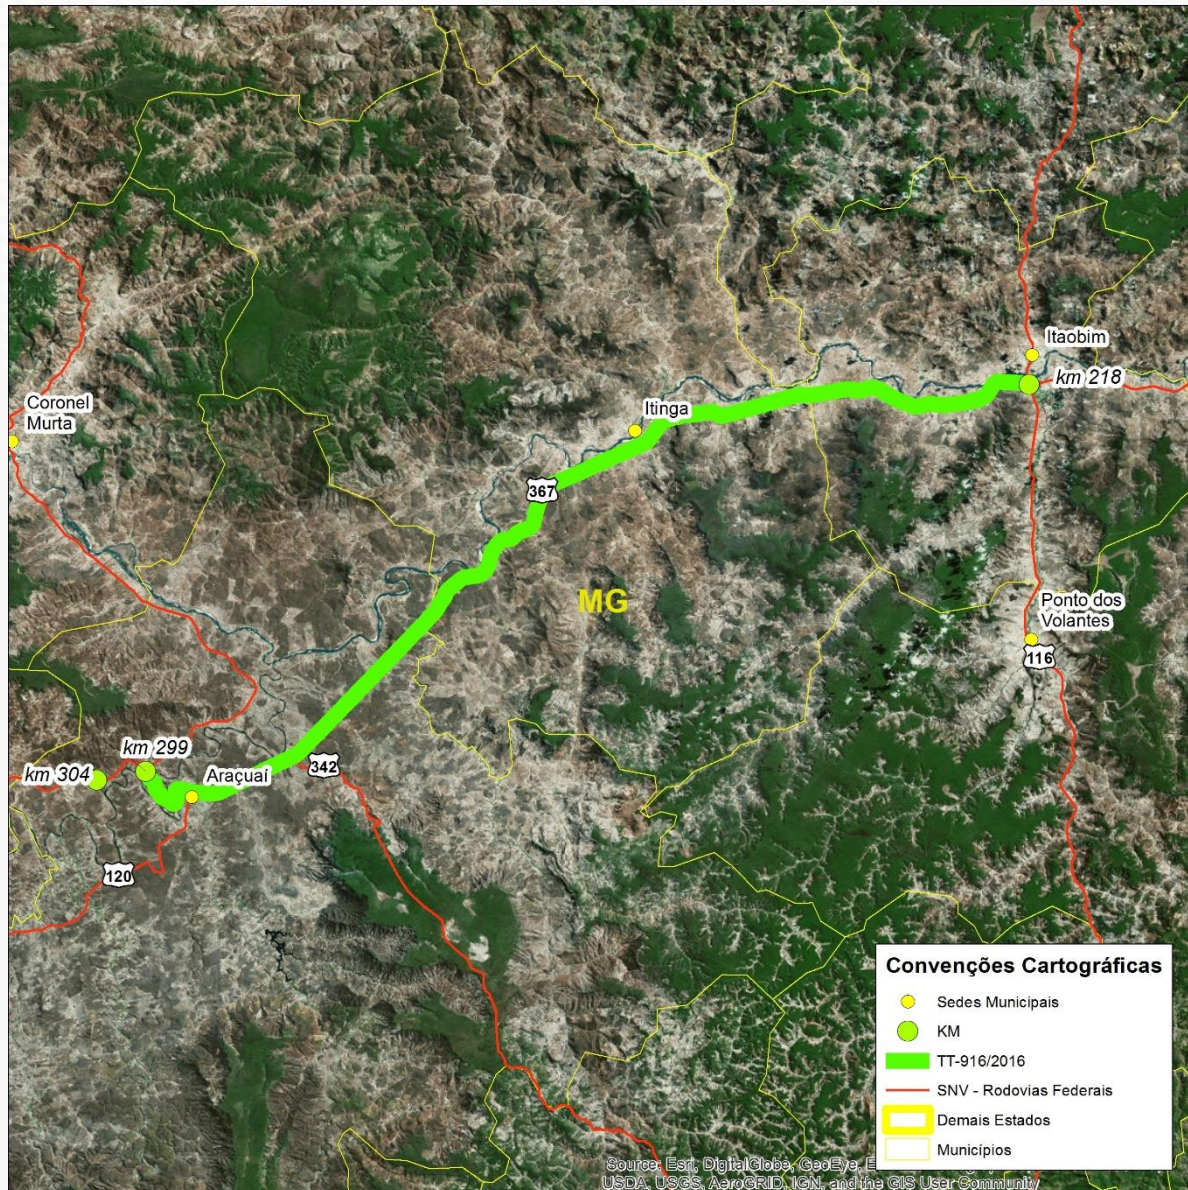


MANUTENÇÃO (Itaobim – Araçuaí) KM 217,6 ao KM 299,40

Contrato: 916/2016

Vigência: 05/01/2017 a 04/01/2019

GUAXIMA ENGENHARIA LTDA

- **Objeto do Contrato:** Serviços de manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-367/MG.
- **Orçamentário e Financeiro:**
 - Plan. Investimentos 2018: R\$ 4.588.881,27
 - Valor Contratado: R\$ 10.933.889,49
 - Total Executado: R\$ 7.565.344,06
 - Saldo de Recursos disponível: R\$ 1.624.434,64

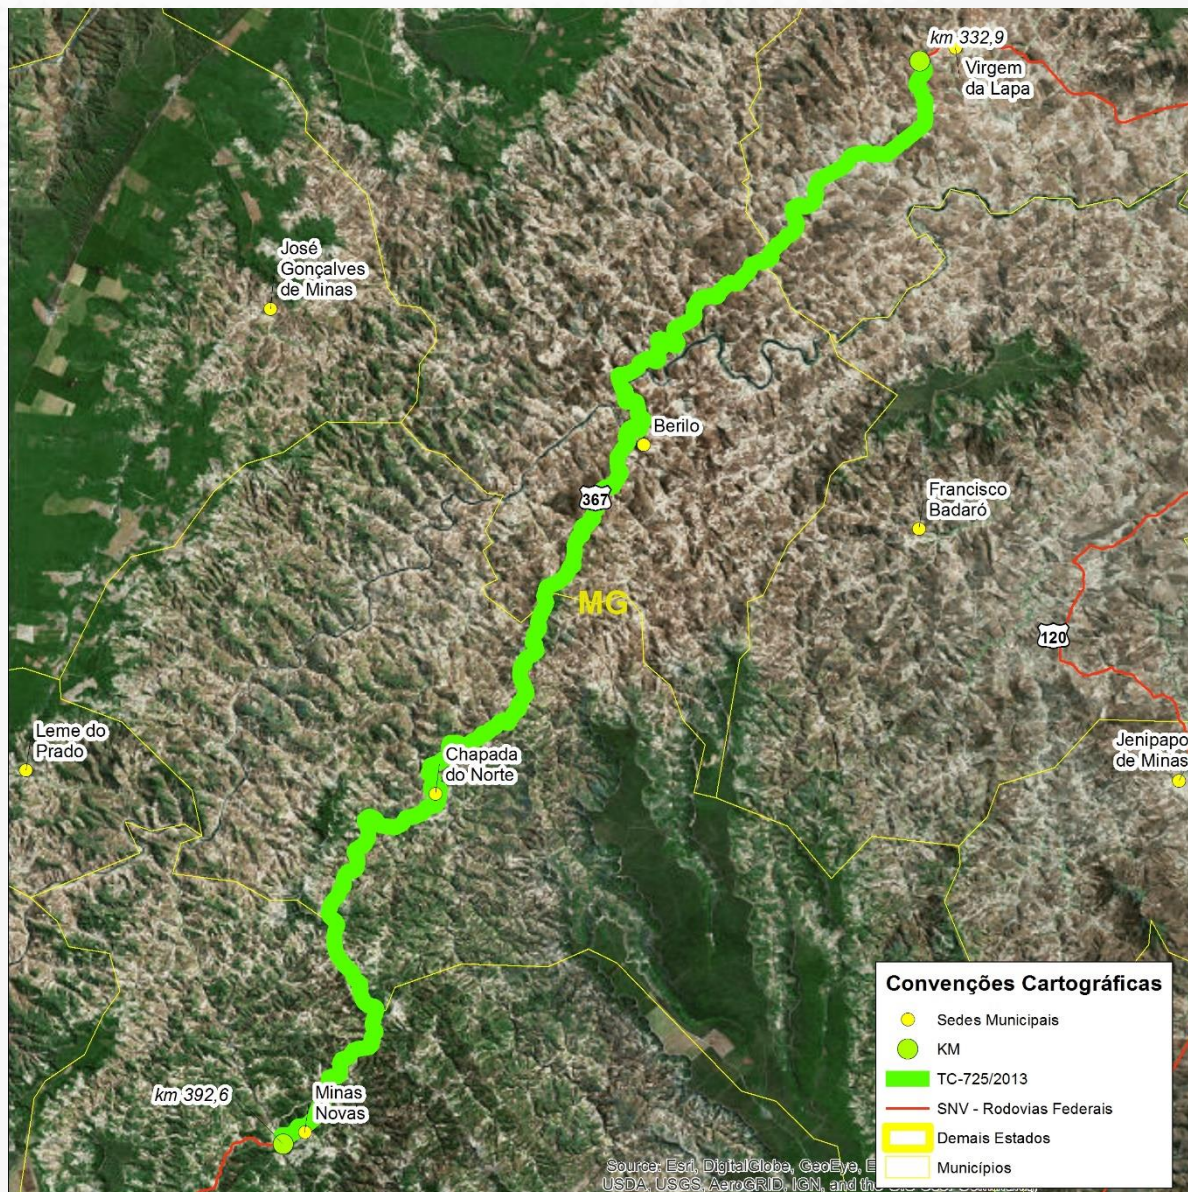

Segundo o SNV, o segmento entre o km 304 até o 336,7 está sob administração estadual

MANUTENÇÃO (Minas Novas – Virgem da Lapa) KM 332,9 ao KM 400,7

Convênio: 725/2013


Vigência: 12/11/2013 à 06/06/2018

M.EX. 11º BEC - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

- **Objeto do Contrato:** Serviços de Conservação da BR-367/MG (Trecho entre Minas Novas e Virgem da Lapa).
- **Orçamentário e Financeiro:**
 - Plan. Investimentos 2018: R\$ 10.200.000,00
 - Valor Contratado: R\$ 30.543.853,84
 - Total Executado: R\$ 11.519.356,80
 - Saldo de Recursos disponível: R\$ 19.024.497,04

O trecho possui aproximadamente 60 km em leito natural e todas as pontes, no total de 8, são de madeira, sendo que uma delas possui mais de 153 m de extensão.

Trecho Estadual

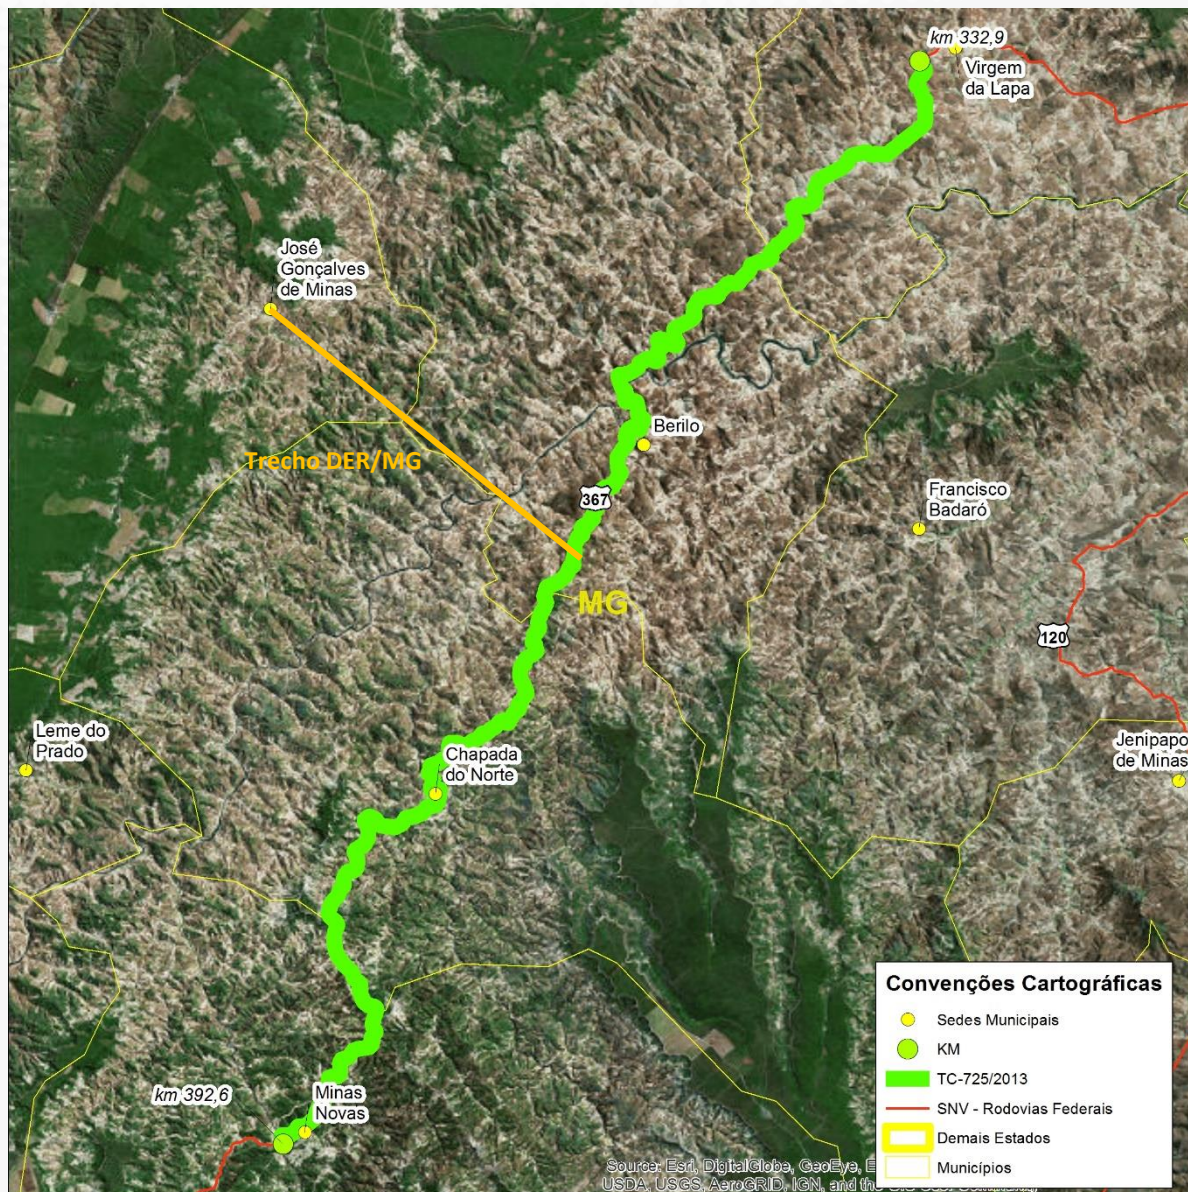

- Obs: O trecho entre Ijicatu (José Gonçalves de Minas) a Virgem da Lapa, é uma rodovia estadual de Minas Gerais.



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Luiz Antônio Ehret Garcia

Diretor de Infraestrutura Rodoviária

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

