

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Brasília, novembro de 2015

DNIT
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTE

Ministério dos
Transportes

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

BR - 319/AM

CARACTERÍSTICAS:

- A rodovia BR-319/AM/RO possui 877,40 km (859,5 km no AM e 17,90 km no RO). Coincide com a BR-174/AM;

SEGMENTOS LICENCIADOS PELO IBAMA:

- Para efeito de licenciamento ambiental, das obras de PAVIMENTAÇÃO, a rodovia na sua extensão foi dividida pelo IBAMA em três segmentos, denominados **Segmento A: do km 0 ao 177,8; Segmento B do km 655,7 ao 877,4; e Segmento C do km 177,8 ao 250,0;**


SEGMENTOS NÃO LICENCIADOS:

- Segmento (km 250,00 - km 655,70)** - Conhecido como “Trecho do Meio”, com extensão de 405,70 quilômetros de extensão;

SEGMENTOS SOB EMBARGO (6 CONTRATOS):

Contrato	km Inicial	km Final	Empresa	PI+R	Empenho	Medido	Situação
699/2013	177,80	260,00	Tescon Engenharia LTDA	R\$ 13.077.239,18	R\$ 17.500.000,00	R\$ 11.568.611,10	PARALISADO
788/2014	260,00	345,50	Tescon Engenharia LTDA	R\$ 16.957.507,85	R\$ 9.500.000,00	R\$ 10.328.659,90	PARALISADO
789/2014	345,50	432,40	Contrutora Meirelles Mascarenhas LTDA	R\$ 19.113.059,04	R\$ 6.500.000,00	R\$ 5.879.497,59	PARALISADO
790/2014	260,00	432,40	Tescon Engenharia LTDA	R\$ 13.415.352,37	R\$ 8.000.000,00	R\$ 4.620.250,72	PARALISADO
949/2014	432,40	513,10	Contrutora Meirelles Mascarenhas LTDA	R\$ 16.488.508,95	R\$ 7.035.000,00	R\$ 6.793.360,64	PARALISADO
94/2013	513,10	655,70	Tescon Engenharia LTDA	R\$ 30.316.839,23	R\$ 23.000.000,00	R\$ 22.997.581,97	PARALISADO
Total:				R\$ 96.291.267,44	R\$ 54.035.000,00	R\$ 50.619.350,82	

PAVIMENTAÇÃO DA BR - 319/AM

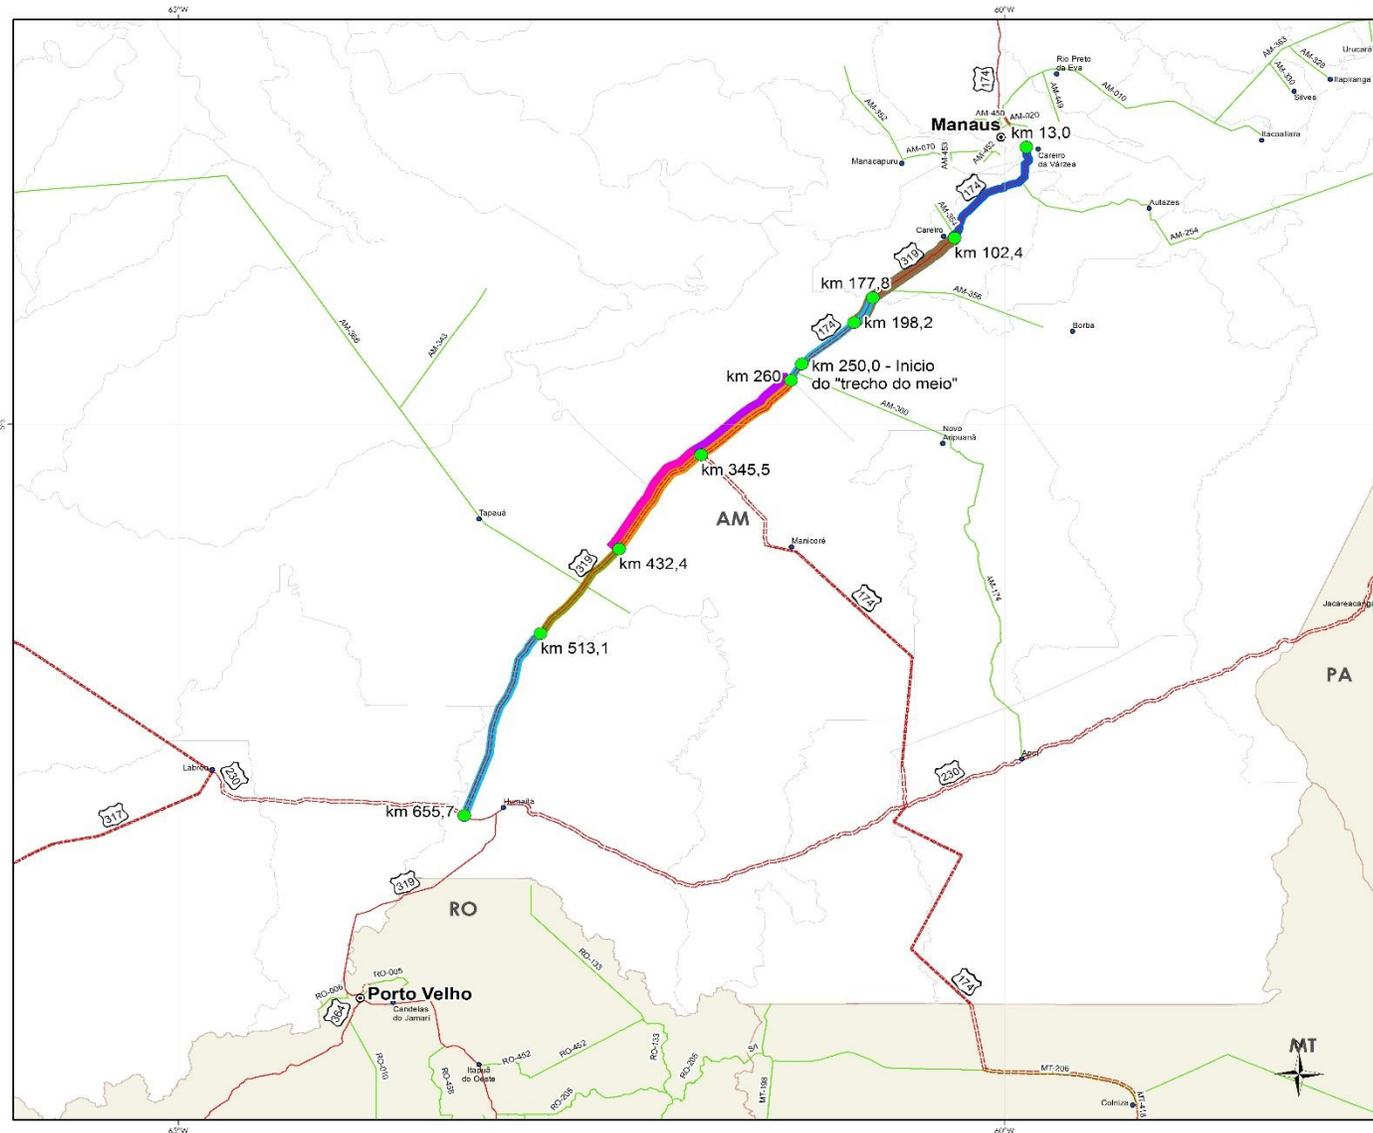

BR-319/AM Contratos Paralizados

Convenções Cartográficas

- km
- ⊙ Capitais
- PNMR
 - Federal - N_PAV
 - Federal - PAV
 - Federal - PLA

Contratos "trecho do meio"

- SR-788/2014 - PARALISADO
- SR-789/2014 - PARALISADO
- SR-94/2013 - PARALISADO
- SR-949/2014 - PARALISADO
- SR-790/2014 - PARALISADO

Segmentos A e C

- Contrato**
- 686/2014
 - 687/2014
 - 689/2013 - PARALISADO

superfície

- PAV
- PLA
- Rodovias Estaduais
- Municípios
- Demais Estados
- AMAZONAS

Atenção: Elaborado pelo Convênio de Gestão de Manutenção e Restauração Rodoviária - CGMR - Cálculos, sugestões e alterações sob responsabilidade do usuário. (Siga o link no e-mail para mais informações sobre o sistema de planejamento de obras.)
 Versão Atualizada SNV 2015 - MAIO/15
 1:2.000.000
 0 55 110 km
 Sistema de Coordenação Geográfica: GCS SIRGAS 2000
 Projeção: Transversa Mercator
 Datum: SIRGAS 2000



BR - 319/AM

SITUAÇÃO ATUAL:

1. Objetivando a execução dos Serviços de Manutenção no “Trecho do Meio”, a CGMAB/DNIT solicitou ao IBAMA o licenciamento para a execução dos referidos Serviços. O IBAMA informou por meio do ofício 100/2012-CGTMO/DILIC/IBAMA, de 12/09/2012, que o licenciamento ambiental poderia ser emitido pelo órgão estadual do Estado do Amazonas-**IPAAM**, em decorrência do baixo potencial do impacto ambiental das atividades. Esta licença do IPAAM **venceu em 15/08/15**;
2. **Termo de Embargo nº 3201-E – IBAMA em 13/10/2015** – km 250 ao km 655,7;
3. **13/10/2015** – SR/DNIT/AM emitiu ORDENS DE PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO;
4. **21/10/2015** – Ofício nº 1644/2015/DG/DNIT ao IBAMA: DNIT apresenta esclarecimentos técnicos sobre os serviços de manutenção realizados na BR-319/AM (km 250 ao km 655,7) **e solicita a suspensão do embargo**;
5. **05/11/2015** – Ofício nº 103/2015 – GABIN/PRESI/IBAMA ao DNIT: **informa que não há óbices por parte do IBAMA para a suspensão do embargo** imposto, desde que atendidas as condições expostas no DESPACHO 02001.0289362015-13 DILIC/IBAMA. **Contudo**, ressalta que os procedimentos administrativos para o desembargo encontram-se sobrestados, diante da tutela antecipada concedida pela 7ª Vara da Justiça Federal de Manaus (**Ação Civil Pública nº 0014031-38.2015.4.01.3200**), que determinou a suspensão imediata de quaisquer intervenções no “trecho do meio” da BR 319/AM (km 250 ao km 655,7).

Valter Casimiro Silveira
Diretor Geral
Diretoria.geral@dnit.gov.br
