



BR-319/AM

Câmara dos Deputados

Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia

Audiência Pública



23/Junho/2021



ORÇAMENTO 2021 (BR-319/AM)

Funcional	Empreendimento	LOA 2021 (Empenhado)	RAP (Inscrito)
219Z	MANUTENÇÃO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO	R\$ 67.044.592,18	R\$ 63.216.135,55*

Total disponível: R\$ 130,2 milhões

*R\$ 5,0 mi para reconstrução
necessidade de mais R\$ 25,0mi


EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIO



VÍDEO BR-319/AM




CARACTERIZAÇÃO – BR-319/AM

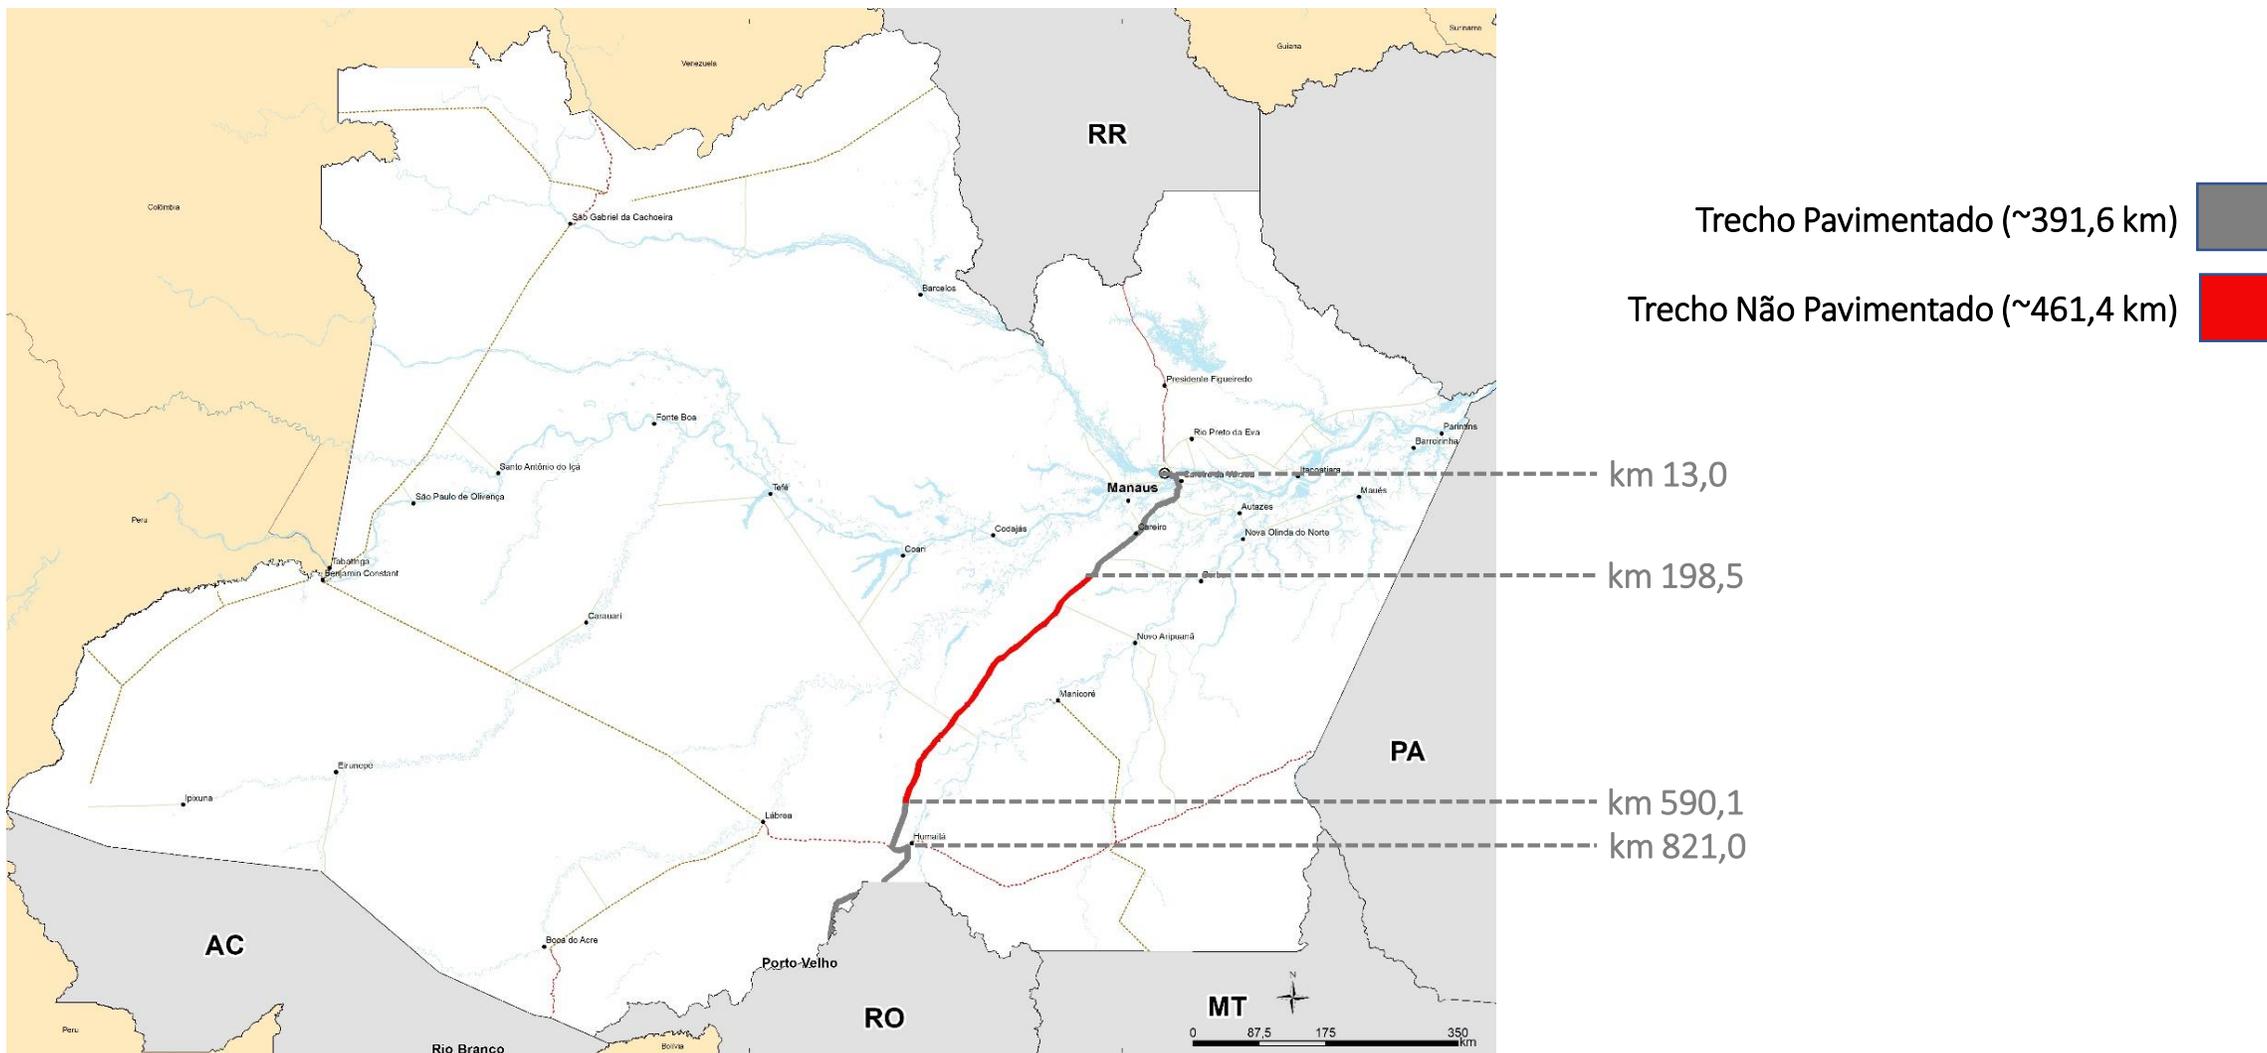



CARACTERIZAÇÃO – BR-319/AM

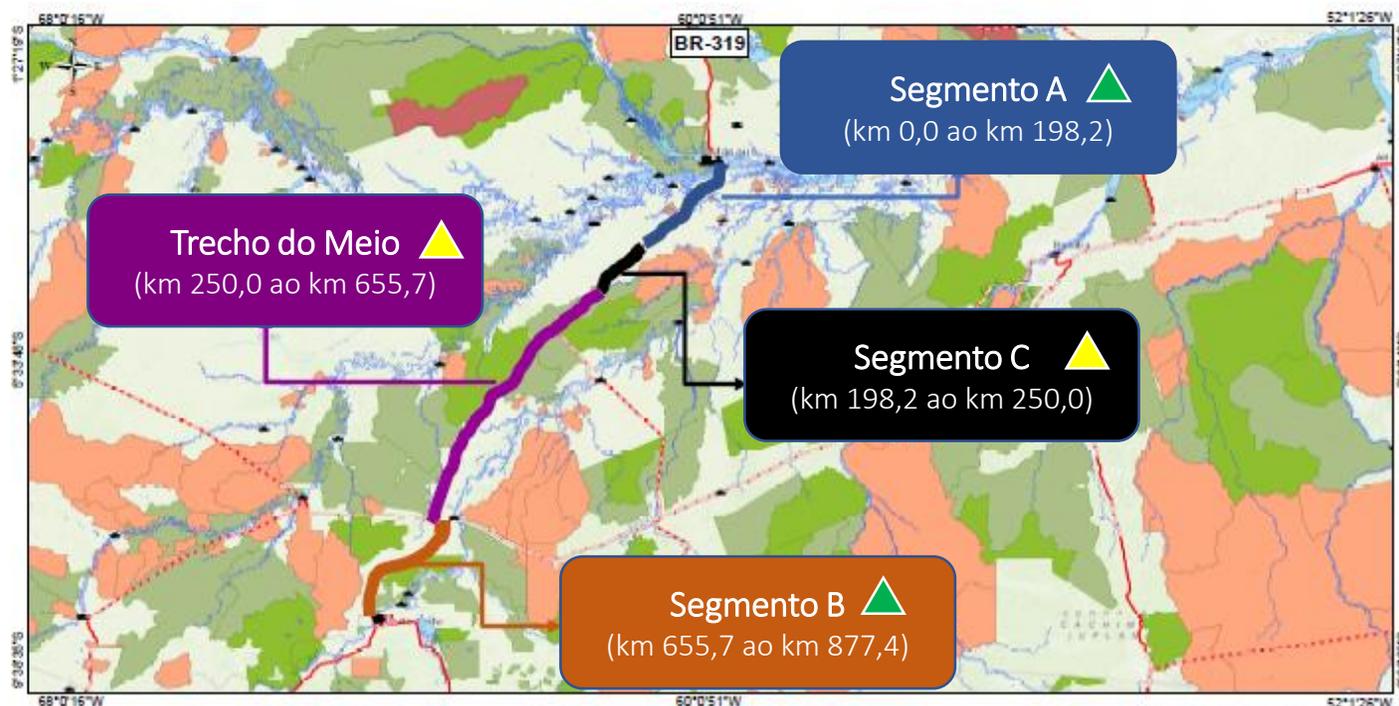

Segmentos A e B

- Execução de obras de manutenção, conservação e restauração;
- Recuperação de passivo ambiental.

Segmento C e Trecho do Meio

- Execução de obras de pavimentação / reconstrução;
- Instalação/substituição de obras de arte;
- Mitigação impactos ambientais;
- Recuperação de áreas degradadas;
- Controle e prevenção dos processos erosivos.



BR-319/AM – Reconstrução



Lote C: BR-319/AM
km 198,2 ao km 250,0

Legenda

- PAV
- N_PAV




BR-319/AM – Reconstrução do Lote C

- **DESCRIÇÃO:** Contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras para reconstrução do lote C da Rodovia BR-319/AM
- **LOA 2021:** R\$ - milhões (Veto: R\$ 20,2 milhões)
- **SALDO CONTRATUAL:** R\$ 165,8 milhões



SITUAÇÃO

- Contrato assinado em 17/12/2020 – Consórcio TECON/ARDO/RDC.
- Obras estendem do km 198,2 ao km 250,0 - totalizando 51,8 km.
- Reuniões quinzenais com a empresa e Diretoria do DNIT.
- Projetos para início dos trabalhos estão em fase final de avaliação e aprovação.
- Drenagem - início em julho.
- Terraplenagem - após as chuvas e expedição da ASV pelo IBAMA.

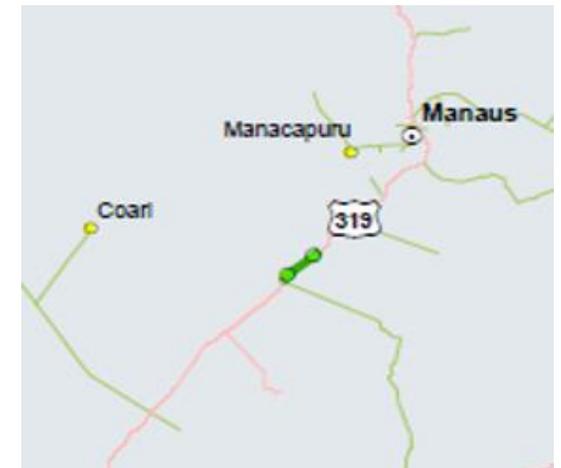



BR-319/AM – Projetos de Reconstrução do Meio

- **DESCRIÇÃO:** projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras para reconstrução do Meio da Rodovia BR-319/AM
- **SALDO CONTRATUAL:** R\$ 9,5 milhões (apenas projetos)

SITUAÇÃO

- 2 lotes de projeto: km 250 ao 433,1 e km 433,1 ao 656,4, totalizando 406,5 km.
- Previsão de conclusão de 1 lote em 2021 para início das obras em 2022.
- Envio dos ajustes para o IBAMA para licenciamento em 30/06/2021.





BR-319/AM – Manutenção



ANTES



DEPOIS

Estaca 415



Estaca 856



BR-319/AM – Manutenção



ANTES



DEPOIS

Estaca 950



Estaca 966



BR-319/AM – Manutenção



ANTES



DEPOIS

Estaca 1.093



Estaca 1.319



BR-319/AM – Manutenção



ANTES



DEPOIS

Estaca 2.348



Estaca 2.357



BR-319/AM – Manutenção



ANTES



DEPOIS

Estaca 2.384



Estaca 2.702



BR-319/AM – Manutenção



ANTES



DEPOIS

Estaca 2.821



Estaca 2.861



BR-319/AM – Manutenção



ANTES



DEPOIS

Estaca 3.089



Estaca 3.312

Obrigado!

